



**BOSNA I HERCEGOVINA**

**BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
KANTON SARAJEVO  
ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO**

a

## **IZVJEŠTAJ O RADU**

**ZAVODA ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU**

SARAJEVO, JANUAR 2024. GODINE



## I. Sadržaj

II.	UVODNI DIO .....	4
III.	PROGRAMSKI DIO .....	5
	UREĐENJE GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA .....	6
	1.1. Pripremanje gradskog građevinskog zemljišta .....	6
	1.2. Opremanje gradskog građevinskog zemljišta .....	7
	1.3. Usmjeravanje posebne naknade od legalizacije bespravno izgrađenih objekata .....	9
	NADZOR NAD IZGRADNJOM .....	10
	RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE .....	10
	VOĐENJE I AŽURIRANJE ANALOGNOG I DIGITALNOG KATASTRA .....	10
	UGOVARANJE I PRAĆENJE RALIZACIJE JAVNIH NABAVKI .....	11
IV.	NORMATIVNI DIO .....	11
V.	TEMATSKI DIO .....	11
	1 RJEŠAVANJE IMOVINSKO -PRAVNIH ODNOSA .....	11
	1.1 SAOBRAĆAJNICE .....	11
	1.1.2 LOKACIJA: JUŽNA LONGITUDINALA .....	12
	1.1.3 LOKACIJA: IX TRANSVERZALA .....	13
	1.1.5 LOKACIJA: NULTA TRANSVERZALA .....	13
	1.1.6 LOKACIJA: REKONSTRUKCIJA I PROŠIRENJE SAOBRAĆAJNICE U ULICI AHATOVIĆKA OD PROFILA P1 DO PROFILA P10 .....	14
	1.1.7 LOKACIJA: A TRANSVERZALA .....	14
	1.1.8 LOKACIJA LOT- 2C .....	14
	1.1.9 LOKACIJA XII TRANSVERZALA .....	14
IV.	REALIZACIJA PROJEKATA GRAĐENJA OD INTERESA ZA KANTON SARAJEVO - PRIPREMA DOKUMENTACIJE I NADZOR NAD IZGRADNJOM U SKLADU SA ZAKLJUČCIMA VLADE KS I SPORAZUMIMA SA MINISTARSTVIMA I OPĆINAMA .....	18
	SLUŽBA ZA PRIPREMU INVESTICIONO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I UGOVARANJE RADOVA .....	18
V.	VOĐENJE ANALOGNOG I DIGITALNOG KATASTRA KOMUNALNIH UREĐAJA .....	95
VI.	IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU .....	98
VII.	KAPITALNI PROJEKTI .....	104
	1.1 Realizacija kapitalnih investicija .....	104
	Tabela kapitalnih projekata .....	104
VIII.	OCJENA STANJA I POSTIGNUTI REZULTATI .....	126
IX.	PROGRAMSKA ORJENTACIJA .....	128
X.	IZVRŠENJE KONTINUIRANIH POSLOVA .....	128
XI.	REALIZOVANI POSTUPCI JAVNIH NABAVKI .....	130
XIII.	PREGLED UNUTRAŠNJE ORGANIZACIJE, KADROVSKE I MATERIJALNE OSPOSOBLJENOSTI ZAVODA ZA IZGRADNJU KS .....	144

**XII. NAČIN OSTVARIVANJA SARADNJE SA FEDERALNIM ORGANIMA, DRUGIM KANTONIMA, OPĆINAMA, GRADOM SARAJEVOM, OMBUDSMENIMA, NEVLADINIM SEKTOROM I DR. ....147**

# IZVJEŠTAJ O RADU ZAVODA ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.2023. DO 31.12. 2023. GODINE

## II. UVODNI DIO

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo (dalje u tekstu: „Zavod“) osnovan je Zakonom o samostalnim kantonalnim upravama iz 1997. godine (Službene novine Kantona Sarajevo br.14/97) kojim su preuzete prava i obaveze Zavoda za izgradnju Grada Sarajeva.

Zakonom o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” br.40//22) Zavod je osnovan kao samostalna upravna organizacija sa svojstvom pravnog lica sa ovlaštenjem da vrši stručne i druge poslove u ime i za račun Kantona Sarajevo te su ujedno definisane nadležnosti Zavoda.

U članu 24 navedenog Zakona se navodi da Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo vrši određene stručne i druge poslove, u ime i za račun Kantona, koji pretežno zahjevaju primjenu stručnih i naučnih metoda rada i sa njima povezane upravne poslovne, koji se odnose na:

- a) realizaciju projekata građenja od interesa za Kanton, počevši od podnošenja prijedloga za eksproprijaciju nekretnina i zahtjeva za preuzimanje i dodjelu potrebnog zemljišta, do dobijanja upotrebne dozvole;
- b) pripremanje i opremanje građevinskog zemljišta koje mu odlukom ili ugovorom povjere općine u Kantonu i Grad Sarajevo;
- c) opremanje građevinskog zemljišta za građenje prema uslovima iz urbanističke saglasnosti koju izdaje Ministarstvo komunalne privrede, infrastructure, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša;
- d) usluge stručnog nadzora za potrebe organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo, te drugih organa na nivou Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva ili općine na području Kantona, javnih ustanova i javnih preduzeća čiji su osnivači Kanton, Grad Sarajevo ili općine na području Kantona, te privrednih društava u kojima Kanton učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala, a koji se odnosi na: izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju, održavanje i uklanjanje objekata visokogradnje; izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju, održavanje i uklanjanje objekata niskogradnje; izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju, održavanje i uklanjanje objekata hidrogradnje, utvrđivanje postojanja, sanaciju, rekonstrukciju, održavanje i monitoring klizišta; izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju, održavanje elektroinstalacija; izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i održavanje mašinskih instalacija; izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i održavanje hortikulturnog uređenja;
- e) uspostavljanje, vođenje i ažuriranje analognog i digitalnog katastra komunalnih uređaja;
- f) upravljanje i raspolaganje imovinom Zavoda u skladu s namjenom utvrđenom zakonom;

- g) evidentiranje i naplata po osnovu rješenja za posebnu naknadu bespravno izgrađenih objekata koje ispostavljaju nadležni organi;
- h) zastupanje u upravnim i sudskim postupcima koji proizađu iz obavljanja poslova iz djelokruga Zavoda.
- i) vršenje drugih stručnih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima, odlukama Vlade Kantona i Skupštine Kantona.

U izvršavanju izvanprogramskih poslova i zaduženja, Zavod se rukovodio smjernicama iz odluka kojima su takvi poslovi povjereni ili smjernicama iz ugovornih uslova kada je izvršenje takvih poslova i zadataka ugovoreno sa investitorom.

Ostvarivanje programskih ciljeva i zadataka tokom izvještajne godine usklađivano je sa dinamikom priliva potrebnih sredstava za te svrhe.

Propisi kojima je uređeno poslovanje Zavoda uključuju kako slijedi:

- Zakon o budžetima u FBiH
- Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH
- Budžet Kantona Sarajevo
- Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo
- Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo;
- Zakon o eksproprijaciji FBiH
- Zakon o stvarnim pravima FBiH
- Zakon o građevinskom zemljištu FBiH
- Zakon o pravobranilaštvu KS
- Zakon o prostornom uređenju KS
- Zakon o trezoru FBiH
- Zakon o javnim nabavkama BiH
- Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo
- Zakon o namještenicima u organima državne službe u FBiH
- Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo
- Zakon o porezu na dohodak FBiH
- Zakon o doprinosima FBiH
- Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH
- Računovodstvene politike za budžetske korisnike i Trezor Kantona Sarajevo
- Podzakonski akti navedenih zakona i drugi primjenjivi propisi

### **III. PROGRAMSKI DIO**

Poslovi iz djelokruga Zavoda vrše se u okviru slijedećih osnovnih organizacionih jedinica:

- a) Sektor za imovinsko - pravne i kadrovske poslove
- b) Sektor za izgradnju objekata i opremanje gradskog građevinskog zemljišta;
- c) Sektor za računovodstvo, finansije i zajedničke poslove;
- d) Sektor za katastar komunalnih uređaja;
- e) Sektor za javne nabavke.

# UREĐENJE GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

## 1.1. Pripremanje gradskog građevinskog zemljišta

U skladu sa Programom rada i Programom uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2023.godinu i zaduženjima koja su Zavodu povjerena od strane Vlade tokom 2023 godine u skladu sa svojim nadležnostima i zaduženjima Zavod je u ime i za račun Kantona Sarajevo primarno provodio postupke rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koji se odnose na sljedeće lokalitete:

- 1) I transverzala,
- 2) Nulta transverzala,
- 3) A transverzala,
- 4) VI transverzala,
- 5) IX transverzala,
- 6) LOT 2 C,
- 7) Južna longitudinala,
- 8) IT park Šip,
- 9) Rekonstrukcija ulice Safeta Zajke na dionici od kružnog toka -spoj sa LOT 2C,
- 10) Groblje Vlakovo,
- 11) Deponija Smiljevići,
- 12) Meandar Otoka
- 13) Kvadrant C Marijin Dvor
- 14) Pruga Ilidža – Hrasnica
- 15) Opservatorij Trebević

Na svim lokacijama kontinuirano su provođene i nastavljene aktivnosti u skladu sa važećim propisima.

Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa podrazumjeva zastupanje Zavoda pred nadležnim organom uprave u postupcima eksproprijacije, podnošenja prijedloga, prikupljanja dokumentacije, uviđaja, rasprava, zaključenja sporazuma o naknadi, primopredaje objekata, dostavljanja dokumentacije na plaćanje u svrhu uklanjanja objekata i uknjižbe eksproprijisanih nekretnina.

Pored aktivnosti na nabrojanim lokacijama, Zavod je tokom 2023.godine provodio radnje prema zahtjevima fizičkih i pravnih lica za zamjenu nekretnina, prodaje radi oblikovanja građevinske parcele, zastupanje u procesima deeksproprijacije te provodio rješenja o eksproprijaciji i prijavljivao imovinu u postupcima harmonizacije zemljišne knjige radi uknjižbe nekretnina u vlasništvu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo kao samostalna upravna organizacija sa svojstvom pravnog lica, također, obavlja poslove i zadatke zastupanja u upravnim i sudskim postupcima koji proizađu iz obavljanja poslova iz djelokruga rada ovog Zavoda. Ovaj dio se pogotovo odnosi na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.

## 1.2. Opremanje gradskog građevinskog zemljišta

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo u 2023. godini je obavljao poslove na:

- 1) provođenju pripremni radova na obezbjeđenju investiciono-tehničke dokumentacije za izgradnju objekata niskogradnje (saobraćajnica za IT park Šip i dr.), za objekte visokogradnje: (zgrada na Grbavici, OŠ Pofalići, OŠ Rosulje, Hitna pomoć, i dr.) i za sanacije klizišta;
- 2) ishodovanje saglasnosti kantonalnih komunalnih preduzeća i urbanističko-građevinskih akata za izgradnju objekata i infrastrukture za potrebe Vlade Kantona Sarajevo i/ili općina iz Kantona Sarajevo i/ili Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i/ili drugih institucija iz Kantona Sarajevo;
- 3) provođenje i praćenje postupaka javnih nabavki za potrebe Zavoda;
- 4) kako većina kantonalnih institucija nema tehnički niti inženjerski kadar, Zavod pruža stručnu pomoć:
  - u provođenju postupaka javnih nabavki i izrada sporazuma o međusobnim pravima i obavezama;
  - u izradi projektnih zadataka za izradu idejnih i izvedbenih projekata,
  - u pregledu projektne dokumentacije prije raspisivanja tendera o odabiru izvođača radova,
  - u pripremi i izradi elaborata o obračunu troškova za uređenje gradskog građevinskog zemljišta.
- 5) vršenje stručno-tehničkog nadzora nad izgradnjom objekata i infrastrukture za potrebe Vlade Kantona Sarajevo i/ili općina iz Kantona Sarajevo i/ili Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo na sljedećim objektima:

### - objekti visokogradnje:

- obnova upravne zgrade u memorijalnom centru Srebrenica- Potočari
- rekonstrukcija i adaptacija prostorija u JU Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš";
- rekonstrukciju objekta kogeneracijsko postrojenje u centar za upravljanje medicinskim otpadom u KCUS;
- adaptacija kuće slobode u sklopu SK tunel D-B ( Dobrinjska strana);
- rekonstrukciji objekta - vrtić Ciciban
- eliminacija arhitektonskih barijera na javnim objektima;
- dogradnja JU OŠ "Zahid Baručija" Vogošća ;
- izgradnja prihvatilišta za napuštene pse Kantona Sarajevo I faza Prača;
- izgradnja zimovnika u RCS Pionirska dolina i ZOO vrt i dr.,

### - objekti niskogradnje – saobraćajnice:

- rehabilitacija regionalnog puta R442a Hadžići - Gornja Grkarica - granica entiteta;
- rekonstrukcija regionalne ceste R445 Semizovac - Ilijaš- Visoko

- rehabilitacija regionalnog puta R444;
- rekonstrukcija puta u ulici Ahatovička;
- izgradnja putnih komunikacija u obuhvatu iz "Luke";
- izgradnja kružne raskrsnice na spoju ulica Džemala Bijedića, Srđana Aleksića i Velikih drveta;
- izgradnja kružne raskrsnice u Otesu;
- rekonstrukcija A transverzale;
- rehabilitacija dijela ulice Ložionička;
- rehabilitacija dijela ulice Džemala Bijedića;
- rekonstrukcija igmanske ceste od Glavogodina do osmica na Igmanu
- rehabilitacija ulice Zenik;
- izgradnja puta u Miševićima i dr.

**- objekti za sportske aktivnosti:**

- izgradnja sportsko-rekreativnog centra Dobrinja;
- izgradnja višenamjenske sportske ploe kod JU OŠ "Hašim Spahić" Ilijaš i dr.

**- sanacija klizišta:**

- sanacija klizišta na lokalitetu Hum, K4 ;
- sanacija klizišta na lokalitetu Svrake IV Ugovor I ;
- sanacija klizišta u naselju Alića gaj ;
- sanacija klizišta na lokalitetu Krka 11 I dr.

**- regulacija vodotoka:**

- regulacije rijeke Zujevine ;
- trajna regulacija rijeke Vogošće - II faza
- regulacija vodotoka potoka Gnionica;
- čišćenje korita rijeke Miljacke od objekta FIS u Halilovićima do RTV doma
- uređenje korita rijeka u općini Trnovo;
- regulacija rijeke Ljubine i dr.

**- instalacija vodovoda i kanalizacije:**

- izgradnja vodovodnog sistema za gornji dio naselja Bare, općina Hadžići ;
- izgradnja separatne kanalizacione mreže u naselju Butmir, I faza ;
- izgradnja dijela fekalne i oborinske kanalizacione mreže u dijelu obuhvata RP Banovac ;
- izgradnja separatne kanalizacione mreže u obuhvatu ulica Hendekuša i Osik ;
- rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Kranjčevićeva II ;
- izgradnja kišne i fekalne kanalizacije u naselju Hotonj iv ;
- izgradnja vodovoda Pandurica – Proskok ;
- izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Petra Sinana Šaina i dr.



#### **- elektro instalacije:**

- rekonstrukcija javne rasvjete u Velikoj aleji
- rekonstrukcija javne rasvjete na području općine Vogošća
- izgradnja rasvjete u privrednoj zoni Hadžići
- održavanje semafora u kantonu sarajevo i dr.

#### **-proširenje groblja Vlakovo:**

#### **- uređenje infrastrukture za upravljanje otpadom:**

#### **- investicije KJP ZOI84"OCS na Bjelašnici:**

- projektovanje i nadogradnja postojeće šestosjedne žičare u vidu izgradnje automatske garaže
- izmještanje četverosjedne žičare
- izgradnja I prve faze ski lifta K1
- uređenje skijaških staza
- izgradnja sistema osnježavanja gravitacioni system
- izgradnja sistema osnježavanja sistem visokog pritiska
- izgradnja strelišta za 53 EFNS
- nadogradnja sistema rasvjete ski staza i dr.

#### **- uređenje pješačkih zona**

- uređenje i opremanje površine javne namjene, trg Sabita Hadžića i školski trg;
- sanacija platoa u ulici Braće Kršo na području općine Vogošća

#### **- uklanjanje građevina, hortikultura, primopredaja radova i objekata i dr.**

### **1.3. Usmjeravanje posebne naknade od legalizacije bespravno izgrađenih objekata**

Na osnovu Odluke o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 6/06, 18/07, 18/08, 35/12 i 51/15), Zavod je putem Programa utroška sredstava prikupljenih iz posebnih namjena od legalizacije građevina bez odobrenja I građevina privremenog karaktera za 2022 godinu provodio aktivnosti na sanaciji klizišta na području Kantona Sarajevo.

Predmetne aktivnosti su u skladu sa ugovorenim obavezama sa Općinama provedene tokom 2023.godine.

## **NADZOR NAD IZGRADNJOM**

Zavod vrši stručni nadzor za potrebe organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo, te drugih organa na nivou Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva ili općina na području Kantona, javnih ustanova i javnih preduzeća čiji su osnivači Kanton, Grad Sarajevo ili općine na području Kantona, te privrednih društava u kojima Kanton učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala.

U provođenju nadzora nad izvođenjem radova, nadzorni inženjeri, stručno i kvalitetno izvršavaju povjerene usluge u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju Kantona Sarajevo i drugim važećim propisima i pravilima struke, a koje se odnose na usluge stručnog nadzora nad izgradnjom građevina i vršenjem svih drugih zahvata u prostoru.

## **RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE**

Sve navedene aktivnosti Zavoda su praćene od strane Sektora za računovodstvo, finansije i zajedničke poslove, a koje se ogledaju u obavljanju knjigovodstva i poslovne evidencije, pripremi budžeta, plana javnih nabavki, finansijskog planiranja, pripreme završnih računa i izvještaja o finansijskom poslovanju, vođenju pomoćnih evidencija za sve projekte koji se finansiraju iz namjenskih sredstava, prijavi prihoda, poreza i doprinosa nadležnoj Poreznoj upravi na propisanim obrascima, izradi normativnih akata, fakturisanju zakupa poslovnih prostorija i zemljišta, orijentacionih troškova, prodaje stalnih sredstava, dostavljanju podataka radi prinudne naplate dospjelih neplaćenih potraživanja, kancelarijsko poslovanje i druge opće poslove.

## **VOĐENJE I AŽURIRANJE ANALOGNOG I DIGITALNOG KATASTRA**

Kada je u pitanju uspostavljanje, vođenje i ažuriranje analognog i digitalnog katastra komunalnih uređaja, djelovanja Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo je tokom 2023. godine, kontinuirano obavljao aktivnosti:

1) pregled elaborata geodetski snimljenih podzemnih instalacija te (za elaborate koji su provodljivi na planu KKKU\_a) izdavanje odgovarajućih saglasnosti za zatrpavanje.

2) izdavanje podataka o tačkama geodetske mreže isključivo u svrhu geodetskog snimanja podzemnih instalacija.

- provođenje elaborata snimanja u digitalnu bazu podataka uz kontrolu atributnih podataka i osnovne topologije.

- izdavanje kopija planova katastra komunalnih uređaja koji se u tu svrhu predhodno ažuriraju.

- postizanje dnevne ažurnosti.

- konverzija podataka katastra komunalnih uređaja za pilot područje – dvije katastarske općine na području Kantona Sarajevo, uz izradu izvještaja o detaljnom planu konverzije.

## **UGOVARANJE I PRAĆENJE RALIZACIJE JAVNIH NABAVKI**

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i podzakonskim aktima obavljali su se poslovi ugovaranja i praćenja realizacije javnih nabavki.

### **IV. NORMATIVNI DIO**

Zavod za izgradnju Kantona Šarajevo nije imao programiranih i neprogramiranih nacrti i prijedloga zakona i podzakonskih akata.

### **V. TEMATSKI DIO**

#### **1 RJEŠAVANJE IMOVINSKO -PRAVNIH ODNOSA**

U Sektoru za imovinsko pravne i kadrovske poslove u 2023. godini obavljani su sljedeći poslovi i zadaci:

##### **1.1 SAOBRAĆAJNICE**

###### ***1.1.1 LOKACIJA: I TRANSVERZALA***

Na svim dionicama saobraćajnice I transverzale gdje su prema zaključku Vlade Kantona Sarjavo pokrenuti postupci eksproprijacije (teritorija Općina Centar, Općina Novo Sarajevo i Općina Vogošća) obavljani su sljedeći poslovi i zadaci:

Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa: zaključenje ugovora o kupoprodaji u sporazumnoj fazi u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji, zastupanje Zavoda pred nadležnim organom uprave u postupcima eksproprijacije od podnošenja prijedloga, prikupljanja dokumentacije, uviđaja, rasprava, sklapanja sporazuma o naknadi, primopredaje objekata, dostavljanja dokumentacije na plaćanje u svrhu uknjižbe i uklanjanja objekata, itd.

U mjesecu martu Zavod je u ime i za račun Kantona Sarajevpodnio prijedlog za eksproprijaciju kod Općine Vogošća na dionici od Tunela Kobilja glava-Donji Hotonj, dok su riješeni imovinsko-pravni odnosi na ulaznom i izlaznom portalu Tunela Kobilja glava.

Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na dijelu navedene dionice od izlaznog portala Tunela Kobilja glava do kružnog toka u Hotonju privodi se kraju, za jedan predmet Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove poništila je Rješenje o eksproprijaciji Službe za imovinsko-pravne poslove I katastar nekretnina Općine Vogošća I predmet vratila prvostepenom organu na ponovni postupak, jedan predmet je proslijeđen Općinskom sudu radi utvrđivanja konačne naknade u vanparničnom postupku bez prethodno zaključenog Djelimičnog sporazuma a, sedam predmeta upućeno je Općinskom sudu na utvrđivanje konačne naknade s tim da je u upravnom postupku zaključen Djelimični sporazum, dakle osigurano je pravo posjeda. Na rješavanju pred Općinom Vogošća preostalo je još sedam predmeta nakon čega će imovinsko-pravni odnosi na saobraćajnici I Transverzala-poddionica Tunel Kobilja glava-Donji Hotonj biti riješeni.

U saglasnosti sa Direkcijom za puteve Kantona Sarajevo u pripremi je izrada Javnog oglasa radi priznavanja prava propisanih Odlukom o usvajanju okvira za otkup imovine I naknade radi realizacije projekata izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo zainteresovanim licima sa lokacije I Transverzala-poddionica Tunel Kobilja glava-Donji Hotonj.

Na svim ostalim dionicama I trasverzale gdje je pokrenut postupak eksproprijacije, ovlašteni predstavnici Zavoda prisustvovali su uviđajima na licu mjesta sa nadležnom komisijom Općine Centar I Novo Sarajevo I pred Općinskim sudom u Sarajevu. Na zahtjev Općinskog suda u Sarajevu zastupanje u predmetima koji se vode u vanpraničnom postupku radi određivanja naknade preuzelo je Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo kao zakonski zastupnik Kantona.

U skladu sa Odlukom Skupštine o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo broj: 01-04-19714/21 („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 18/21) na tunelu Kobilja glava vođene su aktivnosti radi omogućavanja vlasnicima na dionici tunela Kobilja glava da ostvare prava koja nisu priznata u ranije viđenim postupcima eksproprijacije, te su zaključeni ugovori za bespravno izgrađene privremene objekte, povrat poreza na promet I ostala prava propisana Odlukom.

Preostali postupci gdje rješenja nisu pravosnažna se odnose na predmete gdje postoje prethodna pitanja koja onemogućavaju donošenje rješenja o eksproprijaciji ili su u toku žalbeni postupci po pitanju prava na naknadu i utvrđivanja stvarnog vlasnika.

U predmetima gdje su rješenja o eksproprijaciji postala pravosnažna, a nije postignut sporazum sa strankama predmeti su proslijeđeni Općinskom sudu radi određivanja naknade u vanpraničnom postupku koji su u toku ili po žalbi pred Kantonalnim sudom u Sarajevu. Određeni broj predmeta je vraćen na upravni postupak radi preciziranja prava na naknadu za bespravno izgrađene objekte.

### **1.1.2 LOKACIJA: JUŽNA LONGITUDINALA**

#### **Saobraćajnica Južna logitudinala na području Općine Novo Sarajevo**

Nastavljene su aktivnosti na rješavanju imovinsko pravnih odnosa u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji na dijelu servisne kk saobraćajnice i saobraćajnice Južne logitudinala, te je po zahtjevu Direkcije za puteve kao korisnika eksproprijacije upućen zahtjev Vladi Federacije BiH za ulazak u posjed prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji. Federalna uprava za geodetske I imovinsko-pravne poslove koja priprema rješenje za Vladu FbiH kojim se dozvoljava ulazak u posjed je odbijen sa obrazloženjem da je uslov za primjenu ovog instituta izvršno rješenje o eksproprijaciji. Kako je u konkretnom slučaju rješenje o eksproprijaciji poništeno od strane Kantonalnog suda, Općina Novo Sarajevo je zaključkom prekinula postupak eksproprijacije.

Održano je više sastanaka na temu rušenja zgrade u Ulici Grbavička 62-68 sa predstavnicima Vlade Kantona Sarajevo, Ministarstva saobraćaja, Direkcije za puteve, Općine Novo Sarajevo i drugim institucijama uključenim u realizaciju projekta Južne logitudinala.

### **1.1.3 LOKACIJA: IX TRANSVERZALA**

Na lokalitetu IX transverzala od ulice Džemala Bijedića do ulice Safeta Zajke i Smaje Šikala sa izgradnjom kružne raskrsnice i spojem sa gradskim autoputem i izgradnjom servisnih saobraćajnica uz kružni tok vode se postupci pred Općinom Novi Grad Sarajevo u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji, dok se jedan predmet nalazi pred Općinskim sudom – vanparnični postupak koji je još uvijek u toku.

Vršena je priprema podnesaka (izvještaja, urgencija, prijedloga i sl) prema Općini, Vladi KS i drugim institucijama uključenim u realizaciju projekta izgradnje saobraćajnice IX transverzale.

U skladu sa Odlukom Skupštine o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo broj: 01-04-19714/21 („Službene novine Kantona Sarajevo,” br. 18/21) provedene su aktivnosti radi otkupa 20 privremenih poslovnih objekata, dva bespravno izgrađena objekta i tri predmeta procjene usjeva i nasada na tuđem zemljištu koji su a koncu porušeni. Vršeni su obilasci terena sa vještacima radi procjena nekretnina, i pripremani podnesci (materijali za Vladu i Skupštinu KS, izvještaji, urgencije, prijedlozi i sl) prema Općini, Vladi KS i drugim institucijama uključenim u realizaciju projekta IX transverzale.

### **1.1.4. LOKACIJA – REKONSTRUKCIJA ULICE SAFETA ZAJKE NA DIONICI OD KRUŽNOG TOKA SPOJ SA LOT 2C DO PLANIRANOG KRUŽNOG TOJA SPOJ SA IX TRANSVERZALA**

Na lokalitetu - rekonstrukcija ulice Safeta Zajke na dionici od kružnog toka spoj sa LOT 2C do planiranog kružnog toka spoj sa IX transverzala postupci rješavanja imovinsko-pravnih odnosa su vođeni pred Općinom Novi Grad Sarajevo u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji. Predmeti u kojima se nije uspio postići sporazum proslijeđeni su na nadležno postupanje Općinskom sudu radi određivanja naknade.

### **1.1.5 LOKACIJA: NULTA TRANSVERZALA**

Prikupljanje dokumentacije, zk izvadaka, kopija katastra o nekretninama na trasi „0“ transverzale. Podnesen je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole od strane Direkcije za puteve Kantona Sarajevo

Održano je više sastanaka na temu rješavanja imovinsko – pravnih odnosa između Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, Općine Centar i drugih institucija uključenih u realizaciju izgradnje Nulte transverzale.

### **1.1.6 LOKACIJA: REKONSTRUKCIJA I PROŠIRENJE SAOBRAĆAJNICE U ULICI AHATOVIĆKA OD PROFILA P1 DO PROFILA P10**

Nastavljeno je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, obilasci terena sa vještacima radi procjena nekretnina, prisustvovanje uviđajima, raspravama i redovnim sastancima prema pozivima Općine Novi Grad Sarajevo, zaključivani sporazumi o naknadi, te pripremani podnesci (izvještaji, urgencije, prijedlozi i sl) prema Općini, Vladi KS i drugim institucijama uključenim u realizaciju projekta Ahatovička. Preostali postupci rješavanja imovinsko-pravnih odnosa su u toku.

### **1.1.7 LOKACIJA: A TRANSVERZALA**

U toku uknjižba preostalih parcela na trasi A transverzale i rješavanje preostalih imovinsko-pravnih odnosa. Za predmet koji se vodi pred Općinskim sudom – u toku je vanparnični postupak određivanja naknade.

### **1.1.8 LOKACIJA LOT- 2C**

Na lokalitetu Sarajevska zaobilaznica- LOT-2C, u predmetu određivanja naknade za eksproprisane nekretnine uvažena je žalba ranijih vlasnika i predmet vraćen Općinskom sudu na ponovni postupak. Završeni su postupci pred Sudom radi određivanja stvarnih vlasnika čime su se stekli uslovi za zaključivanje sporazuma pred općinom.

### **1.1.9 LOKACIJA XII TRANSVERZALA**

Na lokalitetu XII transverzala okončan je prvostepeni vanparnični postupak za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine ranijeg vlasnika, a preostali vanparnični postupak za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine je prekinut do okončanja upravnog postupka, pokrenutog radi ispravke I dopune rješenja o eksproprijaciji. U toku uknjižba preostalih nekretnina eksproprisanih radi izgradnje XII transverzale-Stupske petlje prema odredbama Zakona o eksproprijaciji FBiH.

### **1.1.10. LOKACIJA HRASNIČKA PRUGA**

U toku je izrada nacрта Odluke o usvajanju Plana preseljenja Projekta GrCf2 W2-Tramvajska pruga Sarajevo, Ilidža-Hrasnica, odnosno izgradnje i rekonstrukcije tramvajske pruge koja se finansiraju iz kreditnih sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj kojom će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo biti zadužen za provođenje aktivnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za građevine izgrađene bez odobrenja za građenje, za privremene poslovne objekte i za bespravne korisnike građevinskog i poljoprivrednog zemljišta.

- **Osim navedenih poslova i zadataka na saobraćajnicama i u sudskim postupcima u sektoru imovinsko pravne i kadrovske poslove obavljani su i slijedeći poslovi i zadaci:**

**Lokacija IT park-Šip** – radi izvršavanja i stvaranja preduslova za izgradnju saobraćajnice Zavod za izgradnju KS realizuje aktivnosti na uređenju zemljišta u obuhvatu II faze RP-a Poslovna zona “ ŠIP” (pripemanje i opremanje gradskog građevinskog zemljišta) radi izgradnje kolske saobraćajnice J-K-L do 1/2M i izgradnja pješačke saobraćajnice na osnovu Odluke o povjeravanju uređenja gradskog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana Poslovna zona „ŠIP“ koju je donijelo Općinsko vijeće Centar. Zavod je putem nadležnih Općina Centar i Vogošća utvrdio prava služnosti u korist JP Elektroprivreda I KJKP Vodovod I kanalizacija, BH telekom koji su okončani uz pristanak vlasnika bez naknade.

Obzirom da nije zaključen sporazum između Općine Centar i Zavoda vezano za realizaciju Odluke o povjeravanju uređenja ggz jer postoji prethodno pitanje vezano za implementaciju važećeg Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta kojim se priznaje pravo na naknadu za zemljište koja pripada Zavodu kao vlasniku, aktivnosti tokom 2023 godine su znatno reducirane. Više puta tokom godine su održavani sastanci na ovu temu, međutim zbog navedenih dijametralno suprotnih stavova po pitanju naknade za zemljište, Zavod je predložio da se sporazum između Općine I Zavod potpiše bez uslovljavanja pitanja za zemljište kako bi se nastavile aktivnosti na realizaciji projekta jer ističu izdate saglasnosti I dozvole za radove na izgradnji saobraćajnice J-K-L-M do ½ M. Predmetni sporazum još uvijek nije potpisan I upitna je dalja realizacija projekta na izgradnji saobraćajne I druge infrastrukture.

Zavod je u Programu uređenja gradskog građevinskog zemljišta predvidio sredstva za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa radi oblikovanja građevinske parcele IT parka, te su u toku aktivnosti na angažovanju vještaka i pokretanje odgovarajućeg postupka.

### **Lokacija gradsko groblje Vlakovo**

U toku je pripremanje dokumentacije radi zaključivanja ugovora o prenosu prava vlasništva bez naknade na KJKP „Pokop” po osnovu prijeratnih eksproprijacija koje su vođene radi proširenja groblja – uknjižba ranije eksproprijisanog i otkupljenog zemljišta.

**Fakultet zdravstvenih studija** – nastavak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa radi osiguranja prilaza objektima Paviljon VIII I Paviljon IX, dobijena saglasnost Skupštine Kantona Sarajevo na nacrt ugovora.

**Izgradnja parkinga u Otesu** - zastupanje Zavoda u postupcima eksproprijacije nekretnina u vlasništvu Zavoda radi izgradnje parkinga. Postupak po žalbi na rješenja o eksproprijaciji u toku.

**Spomen obilježje “Dobrinjska barikada”** – dogovoreno zaključivanje sporazuma radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu u vlasništvu Zavoda na lokalitetu Općine Novi Grad Sarajevo radi izgradnje spomenika.

**Fudbalsko igralište na Dobrinji** – dogovoreno zaključivanje sporazuma radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu u vlasništvu Zavoda na lokalitetu Općine Novi Grad Sarajevo radi izgradnje igrališta.

**Deponija Smiljevići-** u skladu sa zaključkom Vlade Kantona Sarajevo br: 02-04-30764-31/22 od 11.08.202. godine Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Zavod za izgradnju Kantona su u skladu sa zaduženjem realizacije otkupa zemljišta označenog kao k.č 1458/1, k.č 1459, k.č 1460 i k.č 1462, sve k.o Dolac proveli aktivnosti I dobili saglasnost Skupštine KS za zaključenje ugovora o kupoprodaji označenog zemljišta. Predmeni ugovor je zaključen i realizovan, u toku je uknjižba zemljišta na Kanton Sarajevo.

**Opservatorij na Trebeviću** - na osnovu zahtjeva Grada Sarajeva i Zaključka Vlade Kantona Sarajevo pripremljena je dokumentacija, sačinjen nacrt ugovora o uspostavljanju prava građenja u korist Grada Sarajeva; nacrt stavljen u proceduru u skladu sa Zakonom o pravobranilaštvu KS.

**Lokacija Skenderija-Ledena dvorana** - Zavod je postupajući po zahtjevu KJKP Skenderija i KJKP ZOI 84 u više navrata obavještavao Ministarstvo privrede o statusu objekta Ledene dvorane sa vlasničko-pravnog aspekta i na kraju je kompletna dokumentacija dostavljena nadležnom Ministarstvu radi pripreme materijala za Skupštinu u cilju konačnog određenja po pitanju prenosa prava vlasništva na jedno od navedenih komunalnih preduzeća.

**Vatrogasna ispostava Stup** - na osnovu zahtjeva Grada Sarajeva i Zaključka Vlade Kantona Sarajevo pripremljena je dokumentacija, sačinjen nacrt ugovora o prenosu prava vlasništva bez naknade na Kanton Sarajevo u cilju okončanja uknjižbe nekretnine vatrogasne ispostave Stup; nacrt stavljen u proceduru u skladu sa Zakonom o pravobranilaštvu KS.

**Spomenički kompleks "DB tunel"** – poduzete aktivnosti na proširenju spomeničkog kompleksa; uknjižba nekretnina, te prikupljanje dokumentacije potrebne za nastavak postupka eksproprijacije.

**Lokacija "Meandar-Otoka"** – dana 07.12.2023. godine od strane Vlade Kantona Sarajevo donesen je Zaključak broj: 02-04-50995-41/23 kojim se zadužuje Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo da, u ime i za račun Kantona Sarajevo pokrene postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na lokalitetu "Meandar-Otoka" radi izgradnje parkinga ispred Olimpijskog bazena Otoka. Općini Novi Grad Sarajevo podnijet je prijedlog za eksproprijaciju koji postupak je u toku.

Tokom 2023 godine rješavani su zahtjevi fizičkih i pravnih lica za kupovinu zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske čestice kom prilikom su cijenjeni uslovi propisani Zakonom o stvarnim pravima FBiH. U slučajevima gdje zahtjevi ispunjavanju zakonske uslove, provedena je procedura u skladu sa Zakonom o pravobranilaštvu KS i zaključeni su kupoprodajni ugovori radi oblikovanja građevinske parcele, ili su u postupku rješavanja, u skladu sa Zakonom o pravobranilaštvu Kantona Sarajevo.

Postupano je po zahtjevima pravnih i fizičkih lica za privremeno korištenje zemljišta u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 22/22) u svrhu izdavanja saglasnosti za privremeno korištenje zemljišta kao i zaključenja ugovora o zakupu. Zaključena su dva ugovora o zakupu radi uređenja prostora za parkiranje, te priprema dva ugovora u istu svrhu, uz okončane aktivnosti za zaključenje tri ugovora o zakupu radi postavljanja reklamnih panoa.



Obrađivani su zahtjevi za izradu anexa ranije zaključenih ugovora o kupoprodaji stanova po zahtjevu stranaka u svrhu ostvarivanja pretpostavki za uknjižbu u zemljišnim knjigama, odnosno pokretanje upravnih postupaka u cilju ispravki ranije donijetih rješenja, postupaka radi izdavanja prepisa rješenja, sporazuma o naknadi i sl.

Predstavnici Zavoda su pripremali i davali izjašnjenja u postupcima promjena u katastarskom operatu, kao i podnosili žalbe na rješenja z.k. ureda i općinskih rješenja prilikom provođenja promjena u zemljišnoj knjizi i katastarskom operatu.

Vršene su kontrole urbanističkih saglasnosti i odobrenja za gradjenje i ostalih rješenja koje se po službenoj dužnosti dostavljaju Zavodu za izgradnju KS, (cca 1500 općinskih i sudskih rješenja), praćeni su postupci i aktivno se sudjelovalo prilikom harmonizacija zemljišta kod Općinskog suda u Sarajevu za k.o Sarajevo VI i ostale katastarske općine prema javnim pozivima Suda koji su objavljeni u prethodnoj godini.

Uz aktivnu saradnju sa ovlaštenim pravnim licima ("GEODET" d.o.o. i "BN PRO" d.o.o), pored zemljišta, izvršene su I uknjižbe kod Općinskog suda u Sarajevu - Ured za harmonizaciju, cca 50 stanova koji se nalaze u katastarskim općinama koje su harmonizovane od strane navedenih pravnih lica. Uknjiženi stanovi nalaze se u općinama Stari grad, Centar, Novo Sarajevo i Vogošća. Također, izvršena je uknjižba jednog poslovnog prostora koji se nalazi u ul. Hasana Sušića br.27, u Općini Centar Sarajevo.

Aktivno je rađeno na uknjižbi ranije eksproprisanih nekretnina, odnosno preuzetog zemljišta u korist Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, što podrazumjeva podnošenje prijedloga općinama radi izmjene pravosnažnih rješenja kako bi ista bila provodiva u zemljišnoj knjizi i postupak uknjižbe parcela izuzetih i eksproprisanih prije rata na lokacijama XI transverzale, Osnovne škole Aleksa Šantić i Osnovne škole Hotonj I drugim.

Pred Općinskim sudom u Sarajevu održano je 137 ročišta koja se odnose na postupke utvrđivanja naknade za eksproprisanu nekretnine, kao i na postupke iz oblasti stambenih, ugovornih odnosa, te postupaka za naknadu štete.

U oblasti kadrovskih poslova u okviru Sektora za imovinsko-pravne i kadrovske poslove, putem e-djelovodnika preuzeto je 1200 predmetnih brojeva koji se odnose na upravno rješavanje iz oblasti kadrovskih poslova:

- usklađivanje propisa i općih akata Zavoda,
- izrada rješenja i drugih pojedinačnih akata iz oblasti radnih odnosa,
- izrada dopisa,
- ažuriranje podataka iz personalne evidencije zaposlenih,
- izrada stručnih materijala iz oblasti personalnih poslova za koje se traži saglasnost Vlade Kantona Sarajevo,
- koordinacija sa Agencijom za državnu službu FBiH, a u vezi sa postupcima raspisivanja Javnih konkursa, postupci raspisivanja internih i javnih oglasa za prijem namještenika u radni odnos.

Od 01.12.2023. godine, u Sektor za imovinsko-pravne i kadrovske poslove je prebačena nadležnost izrade Sporazuma o vršenju usluga stručnog nad izvođenjem radova i usluga pregleda projektne dokumentacije, kao i Rješenja o imenovanju nadzornih inženjera nad izvođenjem radova i pregledom projektne dokumentacije.

Shodno navedenim nadležnostima u periodu 01. – 31.12.2023. godine izrađena su 22 Sporazuma o vršenju usluga stručnog nadzora sa institucijama Kantona Sarajevo i 25 Rješenja o imenovanju stručnog nadzora nad izvođenjem radova i pregledom projektne dokumentacije.

Takođe su kontinuirano obavljani slijedeći zadaci vezani za arhivsko poslovanje Zavoda: Izvršeno je tehničko sređivanje predmeta koji su vraćeni u arhivski depo na lokalitetu Breka, U skladu sa važećim propisima iz oblasti arhivske građe uređena je dokumentacija na lokalitetu Nedžarići c4 i c5. Svakodnevno je vršena pretraga, kopiranje i izdavanje imovinsko-pravne, finansijske i tehničke dokumentacije po zahtjevima fizičkih i pravnih lica i zahtjevima uposlenika Zavoda. Izvršena je dorada OWIS sistema kako bi isti pogodio potrebama skeniranja i indeksiranja arhivske građe Zavoda, time je omogućen početak skeniranja i indeksiranja imovinsko-pravnih predmeta Zavoda.

#### **IV. REALIZACIJA PROJEKATA GRAĐENJA OD INTERESA ZA KANTON SARAJEVO - PRIPREMA DOKUMENTACIJE I NADZOR NAD IZGRADNjom U SKLADU SA ZAKLJUČCIMA VLADE KS I SPORAZUMIMA SA MINISTARSTVIMA I OPĆINAMA**

##### **SLUŽBA ZA PRIPREMU INVESTICIONO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I UGOVARANJE RADOVA**

<b>R.B.</b>	<b>LOKACIJA-OPIS POSLA/ZADATKA-INVESTITTOR</b>	<b>IZVRŠENJE</b>
<b>1.</b>	<b>IZGRADNJA KOLSKE SAOBRAĆAJNICE I OTVORENOG PARKING PROSTORA SA KOMPLETNOM INFRASTRUKTUROM U NASELJU ŠIP PREMA IT PARKU U SARAJEVU</b>  LOKACIJA OPĆINA CENTAR I OPĆINA VOGOŠĆA	<b>REFERENSE</b> - Odluka Općinskog vijeća Općine Centar Sarajevo o povjeravanju uređenja gradskog građevinskog zemljišta u obuhvatu RP Poslovna zona Šip br. 01-19-470/23 od 26.01.2023.g. Sporazum o sufinansiranju projekta infrastrukturnog uređenja u poslovnoj zoni br. 03-4-11279/21 od 14.11.2021.g. - Aneks 1 Sporazuma o sufinansiranju projekta infrastrukturnog uređenja u poslovnoj zoni br. 03-45-2382-2/22 od 16.03.2022.g. - Aneks 2 Sporazuma o sufinansiranju projekta infrastrukturnog uređenja u poslovnoj zoni br. 03-4-11428/22 od 02.12.2022.g. <b>REALIZACIJA PROJEKTA:</b> Kao i u prethodnom periodu ovaj Zavod je nastavio implementirati sve aktivnosti na pripremanju i opremanju gradskog građevinskog zemljišta što uključuje: - rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, - obezbjeđenje neophodne projektne dokumentacije, - obezbjeđenje svih saglasnosti i dozvola, - provođenje postupaka javnih nabavki za izbor projektanata, konsultanata i izvođača

	<p>INVESTITOR OPĆINA CENTAR</p>	<p>radova, - izgradnja kompletne nedostajuće komunalne i saobraćajne infrastrukture, - nadzor na izvođenju radova. Sve gore navedene aktivnosti su se do donošenja nove Odluke Općinskog vijeća Općine Centar Sarajevo odnosile samo na prvih cca 400 m saobraćajnice sa pratećom komunalnom infrastrukturom (vik, gas, elektroinstalacije i TK mreža) na potezu, prema RP Poslovna zona Šip J-K-L do 1/2M. S obzirom da je, iz tehničkih razloga; poteškoća u projektovanju te nemogućnosti djelomičnog izvođenja instalacija vodovoda i separatne kanalizacione mreže kao i djelomičnog izmještanja elektroenergetskih objekata, Zavod pribavio projektnu dokumentaciju, sve saglasnosti i odobrenja za izvođenje radova za prošireni potez komunalne infrastrukture, u dužini cca 850 m (potez J-K-L-M-N I Z-N-N1-N2) odučeno je da će nova Odluka formalizirati sve, do tada, provedene aktivnosti izvan, prethodom Odlukom, tretiranog obuhvata. Nova Odluka je donesena početkom 2023.g. Krajem 2022.g. Općine Centar je, putem Ministarstva komunalne privrede KS, obezbjedila kreditna srestava u iznosu od 1.270.000,00 KM za izvođenje infrastrukturnih radova (podzemne instalacije) na proširnom potezu, u dužini cca 850 m. Realizacija projekta koja je započeta 2019.g., tokom 2023.g. obuhvatala je:</p> <p>1. Pribavljanje nedostajućih odobrenja za građenje Provođene su aktivnosti na pribavljanju: - Odobrenja za izgradnju preostalog dijela saobraćajnice u dužini cca 450 m (potez ½ M-N I Z-N-N1-N2) što nije moguće realizirati prije rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, putem eksproprijacije, - Odobrenja za izgranju dodatnog kraka saobraćajnice u dužini cca 50 m (na raskrsnici N1) što je bio uslov Općine Vogošća za izdavanje svih prethodnih odobrenja i rješnja kojim se utvrđuje parvo služnosti. U sklopu kraka od cca 50 m planiran je i krak vodovodne i separatne kanalizacione mreže. U vlastitom aranžmanu, Općina Centar Sarajevo je pribavila projektnu dokumentaciju za ovaj krak saobraćajnice sa pratećim instalacijama. Radna verzija projekta (projektant je firma TZI d.o.o. Sarajevo) dostavljena je KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. na saglasnost, a izdate saglasnosti su dostavljene predstavnicima Općine Centar Sarajevo u junu 2023.g. Ipak, tokom 2023.g. nismo dobili okončan projekat za potrebe ishodovanja odobrenja za građenje. Zavod je i pored ove činjenice, tokom 2023.g. pribavio sve saglasnosti na trasu 450 m i dodatnog kraka od 50 m saobraćajnice (ukupno 10 saglasnosti). Po okončanju projekta vodovodne i separatne kanalizacione mreže u dužini cca 50 m (dodatni krak na raskrsnici N1), moguće je izvršiti izmjenu postojećih odobrenja za građenje ukoliko se donese novo Rješenje kojim se utvrđuje parvo služnosti (ranije doneseno za prethodnih cca 40 m saobraćajnice na teritoriji Općine Centar i Općine Vogošća). Odobrenje za izgradnju saobraćajnice u dužini cca 450 m + dodatni krak od 50 nije moguće ishodovati prije rješavanja imovinsko-pravnih odnosa putem eksproprijacije za što su neophodna finansijska sredstva u iznosu od cca 2 miliona KM. Zemljište, u privatnom vlasništvu, najzastupljenije je na teritoriji Općine Vogošća i Općina Centar nije u mogućnosti finansirati ove aktivnosti.</p> <p>2. Produženje postojećih odobrenja i saglasnosti S obzirom da su pojedine Urbanističke saglasnosti i Odobrenja za izvođenje radova</p>
--	-------------------------------------	---

	<p>pribavljenja tokom 2022.g., u 2023.g. vodilo se računa o njihovoj validnosti i njihova pravosnažnost je produžena za godinu dana. Za saglasnosti i odobrenja izdata tokom 2020. i 2021.g. izvršena je obnova postupka.</p> <p>3. Usaglašavanje projektne dokumentacije Nakon što su, početkom 2023.g., predstavnici svih javnih komunalnih preduzeća, u koordinaciji sa Zavodom, izvršili usaglašavanje projektne dokumentacije (trase) svih instalacija planiranih u sklopu buduće kolske saobraćajnice (najviše vremena trajalo je usaglašavanje projekata vodovoda i kanalizacije), razmatrane su i mogućnosti usaglašavanja postojeće projektne dokumentacije sa promjenama na lokalitetu koj su se dogodile od perioda okončanja izrade Glavnog projekta dijela saobraćajnice u dužini cca 450 m (potez ½M-N I Z-N-N1-N2) izrađenog od strane firme Geoput d.o.o. Banja Luka. Naime, tokom 2023.g. okončana je izgradnja poslovnog objekta firme “Successo” d.o.o. Sarajevo, a niveleta pristupne saobraćajnice, za ovaj objekat, izvedena je u skladu sa niveletom postojeće saobraćajnice koja nije usklađena s planskom dokumentacijom. S obzirom da planski dokument i njime definirana niveleta saobraćajnice predstavlja zakonski osnov za izradu projektne dokumentacije, tokom 2023.g. Zavod je vodio intenzivnu komunikaciju sa predstavnicima Općine Centar Sarajevo koji su, u ovom slučaju, odgovorni za provođenje odredbi planskog dokumenta. Nakon što nismo dobili, precizan i jasan pismeni nalog da se kroz projektnu dokumentaciju ispoštuje postojeće stanje, održali smo nekoliko sastanaka sa predstavnicima projektanta (TZI d.o.o. Sarajevo) koji bi trebali izvršiti usaglašavanje projektne dokumentacije s postojećim stanjem. Konačna izrada projektne dokumentacije prolongirana je zbog nedostatka formalno-pravnog osnova za provođenje ovih aktivnosti (sporazum).</p> <p>4. Pregovori o uslovima iz novog Sporazuma Već početkom godine, nakon donošenja nove Odluke Općinskog vijeća Općine Centar Sarajevo inicirano je pitanje donošenja novog Sporazuma kojim bi se formalizirao odnos Zavoda za i Općine Centar Sarajevo, odnosno, uslovi pod kojim se vrše aktivnosti za potrebe Općine Centar Sarajevo. Neki od preduslova su usaglašeni, ali ne i pitanje eksproprijacije zemljišta na parcelama u vlasništvu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo. Ovo je ključno pitanje za nastavak realizacije projekta.</p> <p><b>ZAKLJUČAK: Za nastavak realizacije projekta neophodno je riješiti slijedeće probleme:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. zaključiti novi sporazum I utvrditi način eksproprijacije zemljišta u vlasništvu Zavoda za izgradnju KS,</b></li> <li><b>2. obezbjediti nedostajuća sredstava za finansiranje eksproprijacije zemljišta u privatnom vlasništvu.</b></li> <li><b>3. izvršiti usaglašavanje projektne dokumentacije i okončati izradu nedostajuće projektne dokumentacije,</b></li> <li><b>4. ishodovati nedostajuća odobrenja za građenje</b></li> <li><b>5. obezbjediti financijska sredstava za izvođenje radova</b></li> </ol> <p><b>NAPOMENA: Ranije ishodovana odobrenja za izvođenje radova, validna su još samo nekoliko mjeseci. Prethodno navedeni problemi prijete da sva, do sada pribavljena dokumentacija postane nevažeća, odnosno da se sve procedure vrata na početak. Brojni</b></p>
--	---

		<b>upravni postupci su već jednom obnavljani što predstavlja gubitak novca i resursa.</b>
2.	<p><b>OSNOVNA ŠKOLA "POFALIĆI" "PROJEKAT IZGRADNJE NOVOG OBJEKTA SA VANJSKIM UREĐENJEM"</b></p> <p>LOKACIJA OPĆINA NOVO SARAJEVO</p> <p>INVESTITOR MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO</p>	<p>REFERENSE</p> <p>- Sporazum o definiranju međusobnih prava i obaveza u vezi realizacije Projekta izgradnje objekta Javne ustanove Osnovna škola "Pofalići" sa vanjskim uređenjem- Investitor za izradu Investiciono tehničke dokumentacije za izgradnju JU OŠ. Pofalići je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.</p> <p>REALIZACIJA PROJEKTA:</p> <p>U 2021. godini proveden je postupak izdavanja urbanističke saglasnosti na osnovu urađenog idejnog projekta odvojeno za objekat škole i odvojeno za pristupnu saobraćajnicu i parking. Na urbanističku saglasnost za pristupnu saobraćajnicu i parking podnesena je žalba. Zavod je podnio zahtjeve za pribavljanje saglasnosti na lokaciju prema urbanističkim saglasnostima. Nakon što Općina dostavi saglasnost na gore navedeni zahtjev za dodatna sredstva, u skladu sa Urbanističkom saglasnosti nastaviti će se izrada projektne dokumentacije potrebne za pribavljanje odobrenja za građenje.</p> <p>U 2022. godini nastavljene su aktivnosti.</p> <p>U skladu sa informacijom od Općine Novo Sarajevo o nemogućnosti rješavanja imovinsko pravnih odnosa na parcelama na kojima je po RP-u predviđena izgradnja kolske i pješačke saobraćajnice i nepovoljnih nagiba u ulici Zahira Panjete, Zavod je inicirao izmjenu rješenja u skladu sa situacijom na terenu, te je dogovorena izrada alternativnog projektnog rješenja sa saobraćajnim I pješačkim priključkom na Pofalićku ulicu na dijelu najpovoljnijeg nagiba.</p> <p>Predloženo rješenje projektanta je prihvaćeno na sastanku 12.04.2022. godine.</p> <p>Na osnovu novog rješenja pristupa I parkinga upućen zahtjev za izmjenu postojeće urbanističke saglasnosti.</p> <p>Opština je dala saglasnost na utrošak dodatnih finansijskih sredstava broj 09-14-1430/19 od 21.02.2022. godine za potrebe izrade projektne dokumentacije u skladu sa dostavljenom ponudom od IPSA Instituta uz detaljno obrazloženje za ugovaranje dodatnih usluga projektovanja I proveden je postupak javne nabavke.</p> <p>04.04.2022.godine upućen je zahtjev za saglasnost za izvođenje dodatnih istražnih radova neophodnih za dobijanje preciznijih podataka o nosivosti tla u skladu sa ponudom firme "Winner Project". Saglasnost je dobijena 15.04.2022.godine, te je pokrenuta procedura javne nabavke ugovaranja dodatnih istražnih radova.</p> <p>Prvi dopunski ugovor za izradu projektne dokumentacije br. 03-45-6409/22 potpisan je 07.07.2022.godine I projektant nastavlja sa projektovanjem. Rok za projektovanje izvedbenog projekta po ugovoru je 90 dana.</p> <p>Izvedene su dvije dodatne bušotine I dopunjen elaborat o geološkim i geomehaničkim istraživanjima I poslan revidentu.</p> <p>Nakon revizije elaborat je 09.09.2022.godine dostavljen projektantu.</p> <p>31.10.2022. Projektant je uputio email sa molbom za produženje roka za izradu projekta do 18.11.2022. godine uz objašnjenje da se faze još usaglašavaju. Uz dogovor sa općinom odobreno im je traženo produženje.</p>

		<p>Zahtjev za izdavanje prethodne EES neophodno je bilo dopuniti sa podacima o projektovanoj snazi nakon završetka projekta elektro faze. Upućen zahtjev za izdavanje ažurnog katastra komunalnih uređaja. Kompletirani izvedbeni projekat dostavljen je revidentu na pregled 29.11.2022. godine. Revidentski izvještaji dostavljani su sukcesivno i projektant je tako korigovao dokumentaciju. Urađen je projekat građevinske jame i dostavljen revidentu. Nakon detaljnije razrade projekta ustanovljeno je da će biti smanjen broj parking mjesta, kako ne bismo izašli iz obuhvata parcela u vlasništvu općine. Sa novim situativnim rješenjem upućeni su zahtjevi za izmjenu urbanističke za parking i za školu, kao i produžavanje istih. Korigovana dokumentacija dostavljena je revidentu na ponovni pregled. U 2023. godini nastavljene su aktivnosti na korekciji projekta prema primjedbama revidenta.</p>
3.	<p><b>REKONSTRUKCIJA I SANACIJA CENTRALNOG OBJEKTA JU "ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO"</b></p> <p>LOKACIJA: OPĆINA NOVO SARAJEVO</p> <p>INVESTITOR: MINISTARSTVO ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO</p>	<p>REFERENSA: - Ugovor za "Izradu investiciono-tehničke dokumentacije Idejnog arhitektonskog rješenja i Izvedbenih projekata rekonstrukcije i sanacije centralnog objekta JU "Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo u Kolodvorskoj ulici u Sarajevu" potpisan između - Sporazum o međusobnim pravima i obavezama pri realizaciji projekta rekonstrukcije i sanacije centralnog objekta JU "Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo", Općina Novo Sarajevo (broj: 03-033-2143/19 od 29.07.2019. god) potpisan između Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, JU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo -Odluka o usvajanju Projekta rekonstrukcije i sanacije objekta "JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo", broj 02-04-7957-8/21, od 11.03.2021.godine -Sporazum o međusobnim pravima i obavezama pri realizaciji projekta rekonstrukcije i sanacije centralnog objekta JU "Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo" (broj: 06-45-10767/23 od 31.1.2023. god.) potpisan između JU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo REALIZACIJA PROJEKTA: Nakon izvršenih usaglašavanja i dopuna projektne dokumentacije, tokom 2023.g. pribavljeno je Odobrenje za izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji centralnog objekta JU "Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo. S obzirom da, prema važećem Sporazumu, obaveze Zavoda završavaju sa pribavljanjem odobrenja za građenje, sva pribavljena dokumentacija dostavljena je investitoru, odnosno krajnjem korisniku za njihove potrebe. Nakon što je potpisan novi Sporazum kojim ovaj Zavod nastavlja učestvovati u projektu u ulozi stručnog nadzora na izvođenju radova, kao stručna podrška prilikom provođenja tenderske procedure za odabir izvođača radova, te kao stručni organ za pregled projektne dokumentacije prije raspisivanja tendera. Aktivnosti planirane sporazumom su blokirane zbog nedostatak finansijskih sredstava za izvođenje svih radova planiranih projektnom dokumentacijom (orjentaciona procjena je da je neophodno cca 8 miliona KM za realizaciju radova. Tokom 2023.g. razmatrane su i mogućnosti faznog izvođenja radova, kao pojedinačne nabavke ili kao okvirni sporazum.</p>

<p>4.</p>	<p><b>PRIBAVLJANJE KORIGOVANOG I DOPUNJENOG GLAVNOG PROJEKTA SVIH FAZA VRTIĆA „LUŽANI“</b></p> <p>LOKACIJA OPĆINA ILIDŽA</p> <p>INVESTITOR MINISTARSTVO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO</p>	<p><b>REFERENSE:</b> Sporazum o realizaciji projekta rekonstrukcije vrtića Lužani na području općine Ilidža, naš broj: 03-033-926/18 od 20.03.2018. godine, između Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Općine Ilidža, JU „Djeca Sarajeva“ i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Aneks broj: 03-45-3002/23 od 22.03.2023. godine Sporazuma o realizaciji projekta rekonstrukcije vrtića Lužani na području općine Ilidža, naš broj: 03-033-926/18 od 20.03.2018. godine, između Ministarstva za odgoj i obrazovanje, Kantona Sarajevo, Općine Ilidža, JU „Djeca Sarajeva“ i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo</p> <p><b>REALIZACIJA PROJEKTA:</b> Dana 20.01.2021. godine izvođač radova- firma „Unigradnja“ d.o.o. Sarajevo je uvedena u posao sanacije i rekonstrukcije vrtića Lužani. U toku izvođenja radova na sanaciji i rekonstrukciji vrtića Lužani od strane nadzornih organa i izvođača radova konstatovani su mnogobrojni nedostaci u Glavnom projektu svih faza sanacije i rekonstrukcije vrtića Lužani, iako je Glavni projekat radila ovlaštena firma Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka i iako je Zavod u svemu postupio prema važećem Zakonu o prostornom uređenju Kantona Sarajevo, te je Glavni projekat revidovan i ovjeren od strane ovlaštene firme „RADIS“ d.o.o. Istočno Sarajevo. Nakon zaprimanja dopisa izvođača radova na sanaciji i rekonstrukciji vrtića, firme „UNIGRADNJA“ d.o.o. Sarajevo, od 05.02.2021. godine, u kome smo obaviješteni o nedostacima u projektnoj dokumentaciji, Zavod je pokrenuo niz aktivnosti u cilju dopuna i korekcija Glavnog projekta: u najkraćem roku je kontaktiran projektant Glavnog projekta sanacije i rekonstrukcije vrtića Lužani, te su projektantu kontinuirano dostavljani zahtjevi i urgencije Zavoda da za što brže uradi dopune i korekcije Glavnog projekta po uputama nadzora i izvođača radova. Također, održan je niz sastanaka sa projektantom, izvođačem i investitorom te je projektant nekoliko puta izlazio na gradilište u cilju izrade što kvalitetnijih dopuna Glavnog projekta. Nakon što je projektantska firma Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka dostavila Zavodu dopunu Glavnog projekta svih faza, Zavod se obratio 25.08.2021. godine Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo za njihovo odobravanje dodatnih sredstava za angažovanje drugog revidenta dopune Glavnog projekta i pribavljanje Elaborata o ispitivanju statičke stabilnosti konstrukcije kompletnog objekta. Nakon što je Ministarstvo odobrilo dodatna sredstva 01.09.2021. godine, Zavod je 01.11.2021. godine angažovao nakon provedenog postupka Javne nabavke, drugu revidentsku firmu „HS INŽINJERING“ d.o.o. Sarajevo, koja trenutno reviduje dopunu Glavnog projekta svih faza sanacije i rekonstrukcije vrtića. Također, nakon provedenog postupka po Zakonu o javnim nabavkama, Zavod je angažovao 05.10.2021. godine Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu - Institut za materijale i konstrukcije „IMK“, koji je izvršio ispitivanje statičke stabilnosti kompletne konstrukcije vrtića Lužani i sačinio Elaborat o ispitivanju konstrukcije objekta i isti dostavio Zavodu 29.10.2021. godine. Na inicijativu novog revidenta, potrebno je još uraditi i ispitivanje međuspratne horizontalne konstrukcije vrtića na maksimalno dozvoljene ugibe, kako bi bili</p>
-----------	---	--

	<p>potpuno sigurni u stabilnost konstrukcije. Ministarstvu za odgoj i obrazovanje je dostavljen zahtjev Zavoda broj: 03-4-11277/21 od 23.11.2021. godine, za odobravanje dodatnih sredstava za Ispitivanje međuspratne konstrukcije vrtića. Do današnjeg dana saglasnost Ministarstva za dodatna sredstva nije stigla, te nismo u mogućnosti ugovoriti predmetno ispitivanje, niti revident može završiti reviziju Glavnog projekta, jer čeka rezultate ispitivanja međuspratne konstrukcije na maksimalno dozvoljene ugibe.</p> <p><b>U 2022. Godini nastavljene su aktivnosti</b></p> <p>U toku 2022. Godine, nakon odobrenja potrebnih sredstava od strane Ministarstva za odgoj i obrazovanje, ugovoreno je ispitivanje i pribavljen je Elaborat o ispitivanju međuspratne horizontalne konstrukcije vrtića na maksimalno dozvoljene ugibe, od strane ovlaštene firme Institut za materijale i konstrukcije "IMK" Sarajevo. Na osnovu navedenog Elaborata, projektant je uradio novo rješenje konstruktivnog ojačanja međuspratne konstrukcije vrtića, prema uputama revidentske firme "HS INŽINJERING" d.o.o. Sarajevo. Također tokom 2022. Godine Zavod je vršio intenzivne aktivnosti u saradnji sa Općinom Ilidža, novoizbranim revidentom, kao i Ministarstvom za odgoj i obrazovanje, i JU djeca Sarajeva, kao krajnjim korisnikom vrtića, kako bi projektant korigovao i ispravio mnogobrojne greške u Glavnom projektu svih faza sanacije i rekonstrukcije vrtića Lužani, u cilju nastavka izvođenja radova na predmetnom objektu. Do 31.12.2022. godine, projektant je u velikoj mjeri korigovao i dopunio Glavni projekat. Korigovan je i od strane revidenta prihvaćen Konstruktivni dio Glavnog projekta, te je projektant uradio novo idejno rješenje termo bloka u centralnoj kuhinji vrtića, na koje je Zavod pribavio odobrenje JU Djeca Sarajeva, kao krajnjeg korisnika vrtića (na čiju inicijativu je i izvršena izmjena termo bloka). Zavod je dostavio projektantu i informacije o mogućnosti priključenja instalacija vodovoda i kanalizacije na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu (što je bila obaveza projektanta, ali revident "RADIS" do.o. Sarajevo nije uočio ovaj nedostatak u Glavnom projektu). Na osnovu ovih informacija projektant će izraditi Glavni projekat priključenja instalacija ViK-a na gradsku mrežu.</p> <p>U 2023. godini nastavljene su aktivnosti:</p> <p>Zavod je pribavio izmjenu revidovanog Glavnog projekta svih faza sanacije i rekonstrukcije vrtića "Lužani" urađenog od strane firme Institut za građevinarstvo "IG" d.o.o. Banja Luka i isti je dostavljen Općini Ilidža, radi njihovog provođenja procedure javne nabavke za pribavljanje Izvedbenog projekta svih faza. U skladu sa aneksom broj: 03-45-3002/23 od 22.03.2023. godine, Sporazuma broj: 03-033-926/18 od 20.03.2018. godine, Zavod i Općina Ilidža zajednički su uradili projektni zadatak za izradu Izvedbenog projekta i Općina Ilidža je u skladu sa navedenim aneksom Sporazuma provela javnu nabavku za izbor Projektanta, te je za izradu Izvedbenog projekta odabrana firma "ROUTING" d.o.o. Banja Luka. Za revidenta je u postupku javne nabavke koji je provodila Općina Ilidža, odabrana firma "HS INŽINJERING" d.o.o. Sarajevo. Općina Ilidža i Zavod zajednički prate izradu Izvedbenog projekta. Rok za predaju Izvedbenog projekta je 26.01.2024. godine.</p>
--	--



		Nakon pribavljanja Izvedbenog projekta svih faza sanacije i rekonstrukcije vrtića Lužani, Općina Ilidža će provesti javnu nabavku za izbor izvođača radova a nakon toga, Zavod će vršiti nadzor nad izvođenjem radova.
5.	<p>ZAMJENSKI STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT U ULICI GRBAVIČKA LOKACIJA: OPĆINA NOVO SARAJEVO INVESTITOR: MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO IMPLEMENTATOR: ZAVOD ZA IZGRADNJU KS</p> <p><b>PREDMET: 1. IZRADA IZVEDBENIH PROJEKATA ZAMJENSKOG STAMBENO- POSLOVNOG OBJEKTA U ULICI GRBAVIČKA PREMA UP "GRBAVIČKA", VANJSKOG UREĐENJA I PRIKLJUČAKA SVIH FAZA</b></p>	<p>REFERENSE - Ugovor za izradu izvedbene projektne dokumentacije zamjenskog stambeno-poslovnog objekta spratnosti 3S+P+8 (72 stambene jedinice, cca BGP 11391 m2 stambeno poslovnog i garažnog prostora), vanjskog uređenja, priključaka svih faza, prema UP "Grbavička" potpisan između Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i "AKSA" d.o.o. Zenica (broj: 20-04/17 od 23. 05. 2017. godine) -Prvi dopunski ugovor za Izradu izvedbene projektne dokumentacije zamjenskog stambeno-poslovnog objekta spratnosti 3S+P+8 (72 stambene jedinice, cca BGP 11391 m2 stambeno poslovnog i garažnog prostora), vanjskog uređenja, priključaka svih faza, prema UP "Grbavička" potpisan između Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i "AKSA" d.o.o. Zenica (broj: 03-033-1534/19 od 30. 05. 2019. godine) - Sporazum o definiranju međusobnih prava i obaveza u vezi realizacije Projekta izgradnje stambeno-poslovnog objekta u Ul. Grbavička br. 62-68 između Kanton Sarajevo - Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo (broj: 03-033-3776/2019.godine od 20.05.2019.godine) - Investitor za izradu Idejnog i izvedbenih projekata svih faza zamjenskog stambeno-poslovnog objekta u Ulici Grbavička je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo (finansirano iz Programa utroška namjenskih sredstava Zavoda za izgradnju KS) REALIZACIJA PROJEKTA: U skladu sa Ugovorom broj: 20-04/17 od 23. 05. 2017. godine, te Prvim dopunskim ugovorom broj: 03-033-1534/19 od 30. 05. 2019. godine urađen je Idejni projekat zamjenskog stambeno-poslovnog objekta u Ulici Grbavička, na osnovu kojeg je podnešen zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti 24.04.2017.godine, te Izvedbeni projekat svih faza projektne dokumentacije zamjenskog stambeno-poslovnog objekta spratnosti 3S+P+8 (72 stambene jedinice, cca BGP 11391 m2 stambeno poslovnog i garažnog prostora), vanjskog uređenja, priključaka svih faza, prema UP "Grbavička", na osnovu kojih je podnešen zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje zamjenskog stambeno-poslovnog objekta u ulici Grbavička  Obrazloženje: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo (Implementator) je dostavio Vladi Kantona Sarajevo, kao i Ministarstvu saobraćaja (Investitor) dopis broj: 03-4-5009 od 27. 05. 2022. godine kao Informaciju vezanu za Uklanjanje objekta kolektivnog stanovanja u ulici Grbavička 62-68 i izgradnja novog zamjensko-poslovnog objekta u Ulici Grbavička, u kojoj je iznesena problematika rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i izgradnje zamjenskog stambeno-poslovnog objekta. Zaključkom Vlade KS broj: 02-04-24215-28/22 od 16. 06. 2022. godine prihvata se informacija Zavoda za izgradnju KS, te se zadužuju svi relevantni subjekti da se revidira Sporazum o definiranju međusobnih prava i obaveza u vezi realizacije Projekta izgradnje stambeno-poslovnog objekta u Ul.Grbavička br. 62-68 između Kanton Sarajevo - Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo (broj: 03-033-3776/2019.godine od 20.05.2019.godine), te da se</p>

		razmotri mogućnost da nastavak izgradnje saobraćajnice "Južna longitudinala" ne uključuje uklanjanje objekta kolektivnog stanovanja u ulici Grbavička 62-68 I izgradnju zamjenskog stambeno-poslovnog objekta u ulici Grbavička. U toku je održavanje sastanaka svih relevantnih subjekata, po pitanju rješavanja zaduženja prema navedenom Zaključku
6.	<p>ZAMJENSKI STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT U ULICI GRBAVIČKA LOKACIJA:OPĆINA NOVO SARAJEVO INVESTITOR: MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO IMPLEMENTATOR: ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO</p> <p>PREDMET: 3. <b>IZGRADNJA PRILAZNE SAOBRAĆAJNICE U ULICI GRBAVIČKA</b></p>	<p>REFERENSE - Ugovor za izradu izvedbene projektne dokumentacije zamjenskog stambeno-poslovnog objekta spratnosti 3S+P+8 (72 stambene jedinice, cca BGP 11391 m2 stambeno poslovnog i garažnog prostora), vanjskog uređenja, priključaka svih faza, prema UP "Grbavička" potpisan između Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i "AKSA" d.o.o. Zenica (broj: 20-04/17 od 23. 05. 2017. godine) -Prvi dopunski ugovor za Izradu izvedbene projektne dokumentacije zamjenskog stambeno-poslovnog objekta spratnosti 3S+P+8 (72 stambene jedinice, cca BGP 11391 m2 stambeno poslovnog i garažnog prostora), vanjskog uređenja, priključaka svih faza, prema UP "Grbavička" potpisan između Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i "AKSA" d.o.o. Zenica (broj: 03-033-1534/19 od 30. 05. 2019. godine) - Sporazum o definiranju međusobnih prava i obaveza u vezi realizacije Projekta izgradnje stambeno-poslovnog objekta u Ul. Grbavička br. 62-68 između Kanton Sarajevo - Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo (broj: 03-033-3776/2019.godine od 20.05.2019.godine) - Investitor za izradu Idejnog i izvedbenih projekata svih faza zamjenskog stambeno-poslovnog objekta u Ulici Grbavička je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo (finansirano iz Programa utroška namjenskih sredstava Zavoda za izgradnju KS)</p> <p>REALIZACIJA PROJEKTA: - Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo podnio je zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju pristupne saobraćajnice za objekat Grbavička (naš dopis broj: 03-4-902/21 od 27. 01. 2021. godine) - U skladu sa dopunom zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti izdatom od strane Općine Novo Sarajevo za pristupnu saobraćajnicu potrebno je odrediti ko je investitor (titular) predmetne saobraćajnice tj. na koga će glasiti urbanistička saglasnost. S tim u vezi Zavod je Ministarstvu saobraćaja uputio zahtjev za izradu Sporazuma između Ministarstva saobraćaja i Općine Novo Sarajevo (naš dopis broj: 03-4-2736/21 od 23.03. 2021. godine i ponovna urgencija 28.04.2021.god). Od strane Općine Novo Sarajevo potrebno je riješiti imovinsko-pravne odnose za dvije čestice koje se nalaze na trasi pristupne saobraćajnice sa privatnim licima - na osnovu zahtjeva Zavoda za izgradnju KS od strane Općine Novo Sarajevo izdato je Rješenje-Urbanistička saglasnost Ministarstvu saobraćaja KS za izgradnju prilazne saobraćajnice u ulici Grbavička u Sarajevu (broj: 08-19-847/21 od 15. 10. 2021.godine) -od strane Zavoda je podnešen je zahtjev za klauzulu pravosnažnosti na izdato Rješenje Obrazloženje: Čeka se klauzula pravosnažnosti na Rješenje - Urbanističku saglasnost za pristupnu saobraćajnicu za objekat Grbavička. Od strane Općine Novo Sarajevo nije dostavljeno pravosnažno Rješenje - Urbanistička saglasnost za izgradnju pristupne saobraćajnice za objekat Grbavička,</p>

		obzirom da je u toku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na predmetnom objektu.
7.	<p>PRIHVATILIŠTE ZA PROSJAKE I SKITNICE PRI KJP "GERONTOLOŠKI CENTAR" U NEDŽARIĆIMA, SARAJEVO LOKACIJA: OPĆINA NOVI GRAD INVESTITOR: MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KS PREDMET: <b>DEMONTAŽA POSTOJEĆEG, PROJEKTOVANJE, IZGRADNJA I OPREMANJE NOVOG POSLOVNOG MONTAŽNOG OBJEKTA PRIHVATILIŠTA ZA PROSJAKE I SKITNICE PRI KANTONALNOJ JAVNOJ USTANOVI "GERONTOLOŠKI CENTAR" U ULICI ALEJA BOSNE SREBRENE BR.7 U SARAJEVU</b></p>	<p>REFERENSE: - Inicijativa za pokretanje procedure na izgradnji prihvatilišta za prosjake i skitnice od strane Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice (dopis broj: 13-04/1-11-3787-1/21 od 23. 09. 2021. godine - Investitor za realizaciju projekta je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS - Sporazum o poslovnoj saradnji i namjenskom korištenju sredstava za "Demontažu postojećeg, izgradnju i opremanje novog poslovnog montažnog objekta "Prihvatilište za prosjake i skitnice" pri KJU "Gerontološki centar" u ul. Aleja Bosne Srebrene br.7 u Sarajevu (broj: 01-4-6944/22 od 26. 07. 2022. Godine) REALIZACIJA PROJEKTA: - U skladu sa Inicijativom za pokretanje procedure na izgradnji prihvatilišta za prosjake i skitnice kojim su od strane Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice obezbijedena sredstva u iznosu od 400.000,00 KM. Obrazloženje: U skladu sa Sporazumom o poslovnoj saradnji i namjenskom korištenju sredstava za "Demontažu postojećeg, izgradnju i opremanje novog poslovnog montažnog objekta "Prihvatilište za prosjake i skitnice" pri KJU "Gerontološki centar" u ul. Aleja Bosne Srebrene br.7 u Sarajevu (broj: 01-4-6944/22 od 26. 07. 2022. godine) Zavod za izgradnju KS je pružio stručno - tehničku pomoć u vidu izrade Projektnog zadatka za izradu Idejnog i Izvedbenog projekta predmetnog objekta. Od strane Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice pokrenuta je procedura provođenja javne nabavke za odabir projektanta i izvođača radova po sistemu "ključ u ruke". Zavod je pružio stručno-tehničku pomoć u izradi tenderske dokumentacije za provođenje postupka JN. U skladu sa Sporazumom pružena je stručno-tehnička pomoć u pribavljanju urbanističke saglasnosti, kao i odobrenja za uklanjanje postojećeg objekta. Ishodovano je odobrenje za uklanjanje objekta (broj: 02 I 0 4-19 -1 581 0 I 22 H.V Sarajevo od 01.02.2023. godine), kao i Urbanistička saglasnost. U toku je pribavljanje potrebnih saglasnosti za izdavanje odobrenja za izgradnju predmetnog objekta. Saglasnosti se prikupljaju od strane KJP "Gerontološki centar" u Sarajevu kao krajnjeg korisnika.</p>
8.	<p>OSNOVNA ŠKOLA "ROSULJE" U VOGOŠĆI LOKACIJA: OPĆINA VOGOŠĆA INVESTITOR: MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KS I OPĆINA VOGOŠĆA SUFINANSIJER: OPĆINA VOGOŠĆA PREDMET: <b>IZRADA IDEJNOG PROJEKTA ARHITEKTURE I</b></p>	<p>REFERENSE: - Sporazum o namjenskom doznačavanju sredstava Općini Vogošća za realizaciju izrade Glavnog projekta za izgradnju Osnovne škole „Rosulje“ potpisan između Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Općine Vogošća (broj: 11-01-14-40540 od 25.12.2018. godine) - Sporazum o regulisanju međusobnih odnosa na realizaciji projekta izgradnje objekta JU OŠ "Rosulje" u Vogošći zaključen između Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Općine Vogošća i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo( broj: 03-033-3530/2019. od 21.11.2019. godine) - Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti za osnivanje JU Osnovne škole „Rosulje“, koji potpisuje Sretko Žmukić, stručni saradnik iz oblasti obrazovanja, oktobra 2019. godine. REALIZACIJA PROJEKTA: Zavod je pripremio tendersku dokumentaciju, proveo u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH</p>

	<p><b>IZVEDBENIH PROJEKATA SVIH FAZA OBJEKTA JU OŠ "ROSULJE" U VOGOŠĆI</b></p>	<p>postupke javne nabavke za usluge, te sklopio Ugovore kako slijedi: - Ugovor o izradi ažurne geodetske podloge parcele 10.000 m2 za potrebe projektovanja JU O.Š. „Rosulje“ u Vogošći zaključen između Općine Vogošća i Zavoda za izgradnju KS sa „Geobiro“ d.o.o. Konjic na iznos od 1.111,50 KM - Ugovor o izradi Idejnog projekta arhitekture i Izvedbenih projekata svih faza objekta JU OŠ Rosulje u Vogošći zaključen između Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, Općine Vogošća i Zavoda za izgradnju KS sa „IPSA INSTITUT“ d.o.o. Sarajevo na iznos od 75.491,33 KM - Ugovor o izradi usluge Izrada Elaborata (Izvještaj o inženjersko - geološkim i geotehničkim karakteristikama tla i uslovima fundiranja za objekat JU O.Š. "Rosulje" u Vogošći) zaključen između Općine Vogošća i Zavoda za izgradnju KS sa „Design &amp; QC“ d.o.o. Sarajevo na iznos od 10.530,00 KM</p> <p>- Ugovor za uslugu izrade revizije investiciono - tehničke projektne dokumentacije, svih faza objekta JU OŠ ROSULJE u Vogošći, sa priključcima na gradsku mrežu, zaključen između Općine Vogošća i Zavoda za izgradnju KS sa „Urbis Centar“ d.o.o. Banja Luka na iznos od 4.563,00 KM</p> <p>Obrazloženje: Obzirom da je došlo do isteka Rješenja za dobijanje urbanističke saglasnosti broj: 05-19-3643/20 od 24. 11. 2021. godine, te Izmjene Rješenja broj: 05-19-3643/20 od 24. 11. 2021. godine, podnešen je novi zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti. Ishodovana je nova urbanistička saglasnost broj: 05-19-4897/23 od 09. 11. 2023. godine. U toku je prikupljanje svih potrebnih saglasnosti KJKP-a u skladu sa urbanističkom saglasnošću, a u cilju dobivanja odobrenja za izgradnju predmetnog objekta. Obzirom da je došlo do povećanja površine u odnosu na ugovorene površine (cca 30%), Zavod za izgradnju KS je Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade uputio zahtjev za odobrenje dodatnih sredstava u iznosu od 17.990,00 KM, za dodatne usluge projektovanja. S tim u vezi proveden je pregovarački postupak za Dodatne usluge za izradu Idejnog projekta arhitekture, te izvedbenih projekata svih faza objekta JU OŠ “Rosulje” u Vogošći sa priključcima na gradsku mrežu”. Sklopljen je ugovor sa “IPSA INSTITUT” d.o.o. Sarajevo. Ukupna vrijednost Osnovnog i Prvog dopunskog ugovora je 96.539,63 KM. Projektna dokumentacija prema navedenom Ugovoru je završena, kao i revizija projektne dokumentacije, koja je urađena od strane “URBIS CENTAR” d.o.o. Banja Luka (prema ugovoru broj:03-2-9374/20 od 23. 12. 2020. godine), o čemu postoji Završni izvještaj revizije. Po dobijanju potrebnih saglasnosti KJKP-a podnijet će se zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje.</p>
9.	<p>UPRAVNA/CENTRALNA ZGRADA KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA “VODOVOD I KANALIZACIJA” INVESTITOR: KJKP “VODOVOD I</p>	<p>Na osnovu zahtjeva KJKP “Vodovod i kanalizacija” i Odluke o imenovanju Komisije za izradu projektnog zadatka za izradu projektne dokumentacije Upravne zgrade KJKP “Vodovod i kanalizacija” formirana je Radna grupa za izradu Projektnog zadatka. Zavod je imenovao člana u radnu grupu za realizaciju izrade Projektnog zadatka za izgradnju centralne zgrade KJKP “Vodood i kanalizacija”.</p> <p><b>REALIZACIJA PROJEKTA</b> : Projektni zadatak je završen. Nakon iznalaženja tačne lokacije za izgradnju objekta, Radna grupa imenovana gore navedenom Odlukom nastaviće sa dopunom Projektnog zadatka, a u skladu sa uslovima iz</p>

	<p>KANALIZACIJA”  <b>PREDMET:</b>  <b>IZRADA</b>  <b>PROJEKTOG</b>  <b>ZADATKA ZA IZRADU</b>  <b>IDEJNOG RJEŠENJA</b>  <b>IZGRADNJE</b>  <b>CENTRALNOG</b>  <b>OBJEKTA KJKP</b>  <b>“VODOVOD I</b>  <b>KANALIZACIJA”</b></p>	<p>provedbene planske dokumentacije, za lokalitet na kojem će se graditi objekat.</p>
10.	<p><b>IZMJESTANJE</b>  <b>RADIONICA</b>  <b>SAOBRAČAJNE</b>  <b>POLICIJE MUP-A KS</b>  <b>LOKACIJA: IZMJESTAJE</b>  <b>SA LOKACIJE NA</b>  <b>ADRESI ZMAJA OD</b>  <b>BOSNE 9 NA NOVU</b>  <b>LOKACIJU NA ADRESI</b>  <b>VITOMIRA LUKIĆA NA</b>  <b>STUPU</b>  <b>INVESTITOR:</b>  <b>MINISTARSTVO</b>  <b>UNUTRAŠNJIH</b>  <b>POSLOVA KANTONA</b>  <b>SARAJEVO</b></p>	<p><b>REALIZACIJA PROJEKTA</b>  Jedinica za saobraćaj Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo koja se nalazi na adresi Zmaja od Bosne broj 9 posjeduje privremene objekte: hangare locirane iza navedenog objekta, između objekta Raiffesien banke i Importanne centra, u kojima se nalaze radionice sa stubnim dizalicama za servisiranje vozila, radionica za vulkanizerske radove, magacinski prostori za autodijelove, autogume, kancelarijom skladištara, magacinski prostor za kancelarijski materijal sa kancelarijom skladištara.  Prostor gdje su smješteni gore navedeni sadržaji je neadekvatnih dimenzija za smještaj svih prostorija potrebnih MUP-u KS, te je na osnovu zahtjeva MUP-a KS, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo je predvidio ustupanje zemljišta u svom vlasništvu koje je odgovarajućih dimenzija za privremeni smještaj gore navedenih sadržaja MUP- a KS.Lokacija predviđena za izgradnju novih montažno - demontažnih hangara MUP-a KS se nalazi na Stupu</p>
11.	<p><b>FORMIRANJE DEPOA</b>  <b>SAOBRAČAJNE</b>  <b>POLICIJE</b>  <b>MINISTARSTVA</b>  <b>UNUTRAŠNJIH</b>  <b>POSLOVA KANTONA</b>  <b>SARAJEVO ZA</b>  <b>PRIVREMENO</b>  <b>ODUZETA VOZILA</b></p> <p>LOKACIJA: OPĆINA  NOVI GRAD SARAJEVO</p> <p>INVESTITOR:  MINISTARSTVO  UNUTRAŠNJIH  POSLOVA KANTONA  SARAJEVO</p>	<p><b>REALIZACIJA PROJEKTA</b>  Saobraćajna policija MUP-KS trenutno ima na raspolaganju depo za oduzeta vozila koji je nedovoljnog smještajnog kapaciteta za njihove potrebe. Imajući u vidu navedeno, MUP-KS se obratio Zavodu u cilju eventualne mogućnosti ustupanja zemljišta u vlasništvu Zavoda za formiranje novog depoa. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo i Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, potpisali su Sporazum o regulisanju međusobnih odnosa radi ustupanja zemljišta u svrhu formiranja depoa za smještaj privremeno oduzetih vozila, broj: 01-27-13030/23 od 22.12.2023. godine.  U skladu sa gore navedenim Sporazumom, Zavod ustupa zemljište u svom vlasništvu na teritoriji Općine Novi Grad Sarajevo, na dio k.č. 4099/3, 4082/3 i 4082/1 K.O. NOVO SARAJEVO IV, na privremeno korištenje, Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, radi formiranja depoa za privremeno oduzeta vozila. U cilju realizacije formiranja predmetnog depoa, MUP KS je formirao radnu grupu, u koju su imenovani članovi MUP-a KS i Zavoda za izgradnju KS, koja je izvršila obilazak terena i izradila prijedlog prostorne organizacije novog depoa za oduzeta vozila, na ažurnoj geodetskoj podlozi, koju je uradila firma "GEODET" d.o.o. Sarajevo. Budući da na lokaciji već</p>

		<p>postoji bespravni parking, radovi u svrhu formiranja depoa bi uključivali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sječu samoniklog šiblja, grmova i drveća na parceli u vlasništvu Zavoda;</li> <li>2. Iscrtavanje parking mjesta;</li> <li>3. Postavljanje ograde do 2m visine oko granica depoa;</li> <li>4. Otvaranje ulaza/izlaza na depo za automobile u ulici Džemala Bijedića;</li> <li>5. Postavljanje klizne rampe;</li> <li>6. Postavljanje kontejnera dimenzija cca 2,5m x 6,5m za čuvara;</li> <li>7. Postavljanje videonadzora;</li> </ol> <p>Zahtjev za definisanje potrebnih saglasnosti za formiranje predmetnog depoa u skladu sa Zakonskom regulativom je dostavljen Općini Novi Grad dana 29.12.2023. godine. Nakon pribavljanja potrebnih saglasnosti od Općine Novi grad Sarajevo, Mup KS će u saradnji sa Zavodom poduzeti daljnje radnje u cilju formiranja predmetnog depoa.</p>
12.	<p><b>IZGRADNJA OBJEKTA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO I UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO NA PODRUČJU OPĆINE ILIDŽA</b> LOKACIJA: BUTMIRSKA CESTA, OPĆINA ILIDŽA INVESTITOR: MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO</p>	<p>REALIZACIJA PROJEKTA Na osnovu zahtjeva Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo pruža stručnu pomoć navedenom Ministarstvu u projektu izgradnje objekta MUP-a KS I Uprave policije MUP-a KS na području Općine Ilidža. Lokacija predviđena za izgradnju objekta MUP-a KS I Uprave policije MUP-a KS na području Općine Ilidža nalazi se u Općini Ilidža, na k.č. 4160/1; 4160/10; 4257/2; 4258/2; 4224/1 K.O. Novo Sarajevo I (novi premjer). Parcela je definisana Regulacionim planom "Butmir", označena oznakom I P3, max. tlocrtne površine P= 6.100 m2 i max. BGP = 24.400 m2. Podrška Zavoda se odnosi na pripremne radnje na izgradnji predmetnog objekta, imovinsko-pravne poslove, izradu projektnih zadataka za pribavljanje razne projektne dokumentacije, te pomoć u pribavljanju saglasnosti nadležnih organa. Zavod je imenovao člana u radnu grupu za realizaciju projekta izgradnje objekta MUP-a KS I Uprave policije MUP-a KS na području Općine Ilidža. Radna grupa je u procesu izrade projektnog zadatka za izradu Idejnog arhitektonskog projekta objekta MUP-a KS i Uprave policije MUP-a KS na području Općine Ilidža</p>
13.	<p><b>IZGRADNJA OBJEKTA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO I UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO NA PODRUČJU OPĆINE TRNOVO</b></p>	<p>REALIZACIJA PROJEKTA Na osnovu zahtjeva Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo pruža stručnu pomoć navedenom Ministarstvu u projektu izgradnje objekta MUP-a KS I Uprave policije MUP-a KS na području Općine Trnovo. Lokacija predviđena za izgradnju objekta MUP-a KS I Uprave policije MUP-a KS na području Općine Trnovo nalazi se neposrednoj blizini zgrade Općine Trnovo i novoizgrađenog objekta Centar za zdravo starenje. Radi se o katastarskim parcelama k.č. 126/2 i 125/1 KO Trnovo o čemu će se odlučiti nakon pribavljanja Idejnog projekta. Podrška Zavoda se odnosi na pripremne radnje na izgradnji predmetnog objekta, imovinsko-pravne poslove, izradu projektnih zadataka za pribavljanje razne projektne dokumentacije, te pomoć u pribavljanju saglasnosti</p>

	<p>LOKACIJA: OPĆINA TRNOVO INVESTITOR: MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO</p>	<p>nadležnih organa. Zavod je imenovao člana u radnu grupu za realizaciju projekta izgradnje objekta MUP-a KS I Uprave policije MUP-a KS na području Općine Trnovo, te je na osnovu potreba MUP-a KS, radna grupa izradila projektni zadatak za izradu Idejnog arhitektonskog projekta objekta MUP-a KS I Uprave policije MUP-a KS na području Općine Trnovo. MUP KS će u narednom period provesti proceduru pribavljanja predmetnog Idejnog projekta.</p>
--	--	--

**NADZOR NAD IZVOĐENJEM  
RADOVA  
AKTIVNI UGOVORI - NASTAVAK REALIZACIJE U 2024.g.**

**OPĆINA CENTAR**

REDNI BROJ	UGOVOR				REALIZACIJA	
	NAZIV	INVESTITOR	IZVOĐAČ	VRIJEDNOST	UKUPNO	u 2023. g.
1	REKONSTRUKCIJA BAZENA FASTO	FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE	UNIGRADNJA	1.836.471	3.233.353	129.553
2	I DOPUNSKI UGOVOR			599.999		
3	II DOPUNSKI UGOVOR			635.336		
4	III DOPUNSKI UGOVOR			250.000		
5	NABAVKA ORMARIĆA I KLUPA NA BAZENU DIF		ADUT PLUS	41.586.48	0	0
6	IZGRADNJA DIJELA I DIONICE PRVE TRANSVERZALE - U G O V O R I	DIREKCIJA ZA PUTEVE KS	EURO ASFALT	1.617,781	469.170	0



7	<b>IZGRADNJA OBJEKTA KOLEKTIVNOG STANOVANJA K-78, LOKALITET ŠIP - II FAZA</b>	FOND KS ZA IZGRADNJU STANOVA ZA ČLANOVE ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, RATNE DEMOBILIZIRANE BORCE I PROGNA NE OSOBE	GD KONSTRUKCIJE	1,007.370	830.743	0
8	<b>RADOVI NA VANJSKOM UREĐENJU OKO OBJEKTA K-78, LOKALITET ŠIP</b>			462.558	0	0
9	<b>DODATNI NAPREDVIĐENI RADOVI NA VANJSKOM UREĐENJU OKO OBJEKTA K-78</b>			92.186	0	0
10	<b>IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI PADINE NA LOKALITETU HAKIJE KULENOVIĆA (FAZA I i II)</b>	OPĆINA CENTAR	MIBRAL	848.282	578.007	2.539
11	<b>NABAVKA FASADERSKIH RADOVA NA OJ DZ CENTAR</b>	JU DOM ZDRAVLJA KS	BAUM PALETA	109.918	0	0
12	<b>IZRADA DOPUNE ELABORATA O INŽENJERSKOGEOLOŠKIM KARAKTERISTIKAMA TERENA ZA POTREBE RP SOUKBUNAR,</b>	ZAVOD ZA IZGRADNJU KS	WINNER PROJECT	55.961	35.673	35.673
13	<b>REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA PROSTORA ODJELJENJA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO</b>	JU OPĆA BOLNICA	EKO- GRADNJA	221.715	91.364	91.364
14	<b>REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA PRIZEMNOG DIJELA OBJEKTA ZA POTREBE DNEVNE BOLNICE</b>		GENERAL CONSTRUCTION	321.142	149.300	149.300
15	<b>REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA POTREBE DNEVNE BOLNICE -DODATNI</b>		63.179	0	0	

16	<b>REKONSTR. OBJEKTA KOGENERACIJSKO POSTROJENJE U CENTAR ZA UPRAVLJANJE MEDIINSKIM OTPADOM</b>	KCUS	KOLINVEST	548.051	109.923	109.923
17	<b>NABAVKA I ZAMJENA FASADNE STOLARIJE U OJ DZ CENTAR</b>	JU DOM ZDRAVLJA KS	SIMPRO	346.320	0	0
18	<b>VODOVOD I HIDRANTSKA MREŽA, KANALIZACIJSKO-SANITARNI RADOVI, ELEKTROINSTALACIJE I MAŠINSKE I INSTALACIJE</b>	KJKP "PARK"	DŽEKOS	209.944	151.170	151.170
19	<b>PRIKLJUČAK GASNIH INSTALACIJA U OBJEKTU ZIMOVNIK</b>			5.077	4.785	4.784
20	<b>SANACIJA ULICE BRANILACA ŠIPA U DUŽINI 375 M, OPĆINA CENTAR</b>	ZAVOD ZA IZGRADNJU KS	OXA	99.441	93.822	93.822
22	<b>ADAPTACIJA I RENOVIRANJE ŠKOLSKE SALE JU I GIMNAZIJA SARAJEVO</b>	JU PRVA GIMNAZIJA	GALBOS	117.585	77.714	77.714
<b>OPĆINA CENTAR UKUPNO:</b>				<b>9.448.315</b>	<b>5.825.025</b>	<b>845.843</b>

## OPĆINA HADŽIĆI

REDNI BROJ	UGOVOR				REALIZACIJA	
	NAZIV	INVESTITOR	IZVOĐAČ	VRIJEDNOST	UKUPNO	u 2023. g.
1	PRVA FAZA RADOVA NA VODOSNABDIJEVANJU NASELJA BJELOTINE, LOKALITET MILINJAČA, HADŽIĆI	OPĆINA HADŽIĆI	MUSIĆ COMPANY MANJO	546.144	494.923	0
2	HITNE INTERVENCIJE NA ČIŠĆENJU I UREĐENJU RIJEČNIH KORITA RIJEKA KORČA, BJELAŠNICA I ZUJEVINA	OPĆINA HADŽIĆI	TOP TIM TRI	237.315	99.947	0
3	IZGRADNJA VODOVODNOG SISTEMA ZA GORNJI DIO NASELJA BARE, OPĆINA HADŽIĆI	OPĆINA HADŽIĆI	TED INVEST TELEFONGRADNJA	696.770	579.309	202.697
4	IZGRADNJA STRELIŠTA ZA 53 EFNS	KJP ZO184"OCS	HALILOVIĆ	458.479	400.91	356.105
5	IZGRADNJA VODOVA FEKALNOG KOLEKTORA NA PODRUČJU OPĆINE HADŽIĆI TE SPAJANJE NA GLAVNI KOLEKTOR	OPĆINA HADŽIĆI	JKP "KOMUNALAC"	507.917	202.270	202.270
7	IZVOĐENJE RADOVA NA VODOSNABDIJEVANJU NASELJA PAZARIĆ-BREČAK	OPĆINA HADŽIĆI	BUJICE	465.917	117.934	117.934

8	<b>IZRADA PANELNE OGRADE SA KONTROLOM PRISTUPA OKO PRIVREDNE ZONE HADŽIĆI</b>	OPĆINA HADŽIĆI	MUSIĆ COMPANY	309.152	150.775	150.775
9	<b>REGULACIJA RIJEKE ZUJEVINE - NASTAVAK</b>	OPĆINA HADŽIĆI	MUSIĆ COMPANY BOSMAN	467.756	227.412	227.412
10	<b>REGULACIJA RIJEKE ZUJEVINE U INDUSTRIJSKOJ ZONI- BOCE BINJEŽEVO-I FAZA</b>	OPĆINA HADŽIĆI	MUSIĆ COMPANY BOSMAN	180.434	58.797	58.797
11	<b>REGULACIJA RIJEKE ZUJEVINE U INDUSTRIJSKOJ ZONI- BOCE BINJEŽEVO-II FAZA</b>			162.122	45.533	45.533
12	<b>IZGRADNJA RASVJETE U PRIVREDNOJ ZONI HADŽIĆI</b>	OPĆINA HADŽIĆI	SES	213.371	88.016	88.016
13	<b>HITNE INTERVENCIJE NA ČIŠĆENJU I UREĐENJU RIJEČNIH KORITA</b>	OPĆINA HADŽIĆI	OD "POGLED"	173.541	20.604	20.604
14	<b>SANACIJA KROVNE KONSTRUKCIJE I UTOPLJAVANJE OBJAKTA JU KSIRC HADŽIĆI</b>	OPĆINA HADŽIĆI	SELA	865.775	0	0
<b>OPĆINA HADŽIĆI UKUPNO:</b>				<b>5.284.692</b>	<b>2.486.010</b>	<b>1.470.142</b>

## OPĆINA ILIJAŠ

REDNI BROJ	UGOVOR				REALIZACIJA	
	NAZIV	INVESTITOR	IZVOĐAČ	VRIJEDNOST	UKUPNO	u 2023. g.
1	<b>NASTAVAK IZVOĐENJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI R445: IZRADA a.b. ZIDOVA; DIONICA: OD MOSTA NA RIJECI BOSNI U MALEŠIĆIMA DO SKRETANJA ZA BIOČU U STAROM ILIJAŠU; RASKRSNICA ZA BIOČU U STAROM ILIJAŠU</b>	DIREKCIJA ZA PUTEVE KS	MGBH	909.767	800.757	109.010
2	<b>IZVOĐENJE RADOVA NA POVEĆANJU KAPACITETA PITKE VODE U VODOSNABDIJEVANJU SISTEMA IZVORIŠTA "JAZIĆ"</b>	OPĆINA ILIJAŠ	MIBRAL	176.436	157.929	157.929
3	<b>UREĐENJE DIJELA KORITA POTOKA GNIONICE - II FAZA</b>	OPĆINA ILIJAŠ	ŠPIC BETON	599.515	0	0
4	<b>NASTAVAK IZGRADNJE DISTRIBUTIVNE MREŽE I IZGRADNJI PRIKLJUČNIH GASOVODA U INDUSTRIJSKOJ ZONI "LUKE" ILIJAŠ</b>	OPĆINA ILIJAŠ	DŽEKOS	101.702	52.085	52.085
5	<b>REKONSTRUKCIJA CESTE U NASELJU VRATUŠA</b>	OPĆINA ILIJAŠ	OXA	725.400	197.959	197.959

6	<b>JU OSNOVNA ŠKOLA "STARI ILIJAŠ" _REKONSTRUKCIJA I SANACIJA KABINETA BIOLOGIJE, FIZIKE I HEMIJE</b>	JU OSNOVNA ŠKOLA "STARI ILIJAŠ"	FAZUM GRADNJA	85.149	0	0
7	<b>HITNE INTERVENCIJE NA VODOTOCIMA II KATEGORIJE</b>	OPĆINA ILIJAŠ	NISKOGRADNJA DURMIĆ	68.477	56.295	56.295
<b>OPĆINA ILIJAŠ UKUPNO:</b>				2.666.446	1.265.025	573.278

## OPĆINA ILIDŽA

REDNI BROJ	UGOVOR				REALIZACIJA	
	NAZIV	INVESTITOR	IZVOĐAČ	VRIJEDNOST	UKUPNO	u 2023. g.
1	REKONSTRUKCIJA IGMANSKE CESTE OD GLAVOGODINA DO OSMICA NA IGMANU UGOVOR I	DIREKCIJA ZA PUTEVE KS	DEMUS	1.000.000	465.292	134.880
2	REKONSTRUKCIJA IGMANSKE CESTE OD GLAVOGODINA DO OSMICA NA IGMANU UGOVOR II			798.351	330.289	199.422
3	ISKOP TVRDE STIJENE, KATEGORIJA 5, - IGMANSKA CESTA			378.495	0	0
4	IZGRADNJA REZERVOARA ZA VODU ZA PIĆE CRKVINE (I) FAZA U SKLOPU VODOSNADBIJEVANJA PADINSKIH DIJELOVA MZ OSJEK I MZ BLAŽUJ	OPĆINA ILIDŽA	AGI	901.515	830.656	0
5	RADOVI NA PROŠIRENJU GROBLJA VLAKOVO - III FAZA	KJKP „POKOP“	DEMUS	706.649	664.537	0
6	IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIONE MREŽE DN500 I ATMOSFERSKOG KOLEKTORA DN1000 U ULICI BOJNICKA AZIĆI - I FAZA	OPĆINA ILIDŽA	BUJICE	456.300	437.754	0

7	<b>IZGRADNJA PUMPNE STANICE BLAŽUJ DOVODNOG I DIJELA POTISNOG CJEVOVODA I MULJNOG ISPUSTA</b>	OPĆINA ILIDŽA	TED INVEST	431.730	165.975	165.975
8	<b>IZGRADNJA SEPARATNE KANALIZACIONE MREŽE U NASELJU BUTMIR I FAZA</b>	OPĆINA ILIDŽA	BUJICE	1.681.992	1.074.715	870.970
9	<b>IZVOĐENJE DODATNIH RADOVA NA IZVOĐENJU RADOVA NA IZGRADNJI SEPARATNE KANALIZACIONE MREŽE U NASELJU BUTMIR, I FAZA</b>			355.482	170.074	170.074
10	<b>PROŠIRENJE GROBLJA VLAKOVO IV FAZA</b>	KJKP "POKOP"	ADO - TRANS	223.546	109.617	109.617
11	<b>REGULACIJA KORITA VODOTOKA ZUJEVINE U MZ BLAŽUJ, OPĆINA ILIDŽA</b>	OPĆINA ILIDŽA	MEVLUDIN COMMERC	134.895	0	0
12	<b>IZGRADNJA DIJELA XIII TRANSVERZALE - RASKRSNICE SA PRELAZOM PREKO TRAMVAJSKE PRUGE</b>	DIREKCIJA ZA PUTEVE KS	BOSMAN	2.048.939	125.082	125.082
13	<b>SANACIJA, REKONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE SAOBRAĆAJNICA DRUGOG REDA NA PODRUČJU OPĆINA ILIDŽA LOT 2 ASFALTIRANJE ULICE ROGAČIĆI OD BR.171 DO BR. 175</b>	OPĆINA ILIDŽA	DEMUS	12.068	0	0



14	<b>SANACIJA, REKONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE SAOBRAĆAJNICA DRUGOG REDA NA PODRUČJU OPĆINA ILIDŽA LOT 2 BLATUŠA</b>			35.236	0	0
15	<b>SANACIJA, REKONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE SAOBRAĆAJNICA DRUGOG REDA NA PODRUČJU OPĆINA ILIDŽA LOT 2 VLAKOVO OD BR.492 DO BR.498</b>			14.769	0	0
16	<b>SANACIJA, REKONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE SAOBRAĆAJNICA DRUGOG REDA NA PODRUČJU OPĆINA ILIDŽA LOT 2 REHABILITACIJA ULICE PLANTAŽE OD BR. 130 DO BR. 146</b>			79.784	0	0
17	<b>REKONSTRUKCIJA I SANACIJA KABINETA BIOLOGIJE, FIZIKE I HEMIJE</b>	JU "PRVA OSNOVNA ŠKOLA" ILIDŽA	INTERMING	64.350	0	0
18	<b>REKONSTRUKCIJA I SANACIJA KABINETA BIOLOGIJE, FIZIKE I HEMIJE Anex I</b>			10.724	0	0
19	<b>IZGRADNJA CENTRA ZA KOMUNALNE USLUGE REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE POSTOJEĆIH PROSTORA U OVJEKTU JU KSIRC ILIDZA MALA ALEJA 67</b>	OPĆINA ILIDŽA	UNIGRADNJA	244.767	5.130	5.130
20	<b>KROV DVORANE KSIRC</b>	OPĆINA ILIDŽA	IYARA	397.743	0	0

21	<b>IZGRADNJA KRUŽNE RASKRSNICE NA RASKRSNICI ULICE M17-LUŽANSKO POLJE -IV VITEŠKE BRIGADE</b>	OPĆINA ILIDŽA	MEVLUDIN COMMERC	1.195.617	0	0
22	<b>IZGRADNJA DIJELA VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE U ULICI OTEŠKA</b>	OPĆINA ILIDŽA	TED INVEST	148.913	0	0
23	<b>IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE HRASNICA</b>	OPĆINA ILIDŽA	ANS DRIVE	7.848.272	0	0
24	<b>PROŠIRENJE ALEJE VETERANA NA GROBLJU VLAKOVO</b>	KJKP "POKOP"	HARYSCO	344.401	0	0
<b>OPĆINA ILIDŽA UKUPNO:</b>				19.514.538	<b>4.379.122</b>	<b>1.781.149</b>

## OPĆINA NOVI GRAD

REDNI BROJ	UGOVOR				REALIZACIJA	
	NAZIV	INVESTITOR	IZVOĐAČ	VRIJEDNOST	UKUPNO	u 2023. g.
1	PRIKUPLJANJE POSTOJEĆIH IZVORA NA DEPONIJU SMILJEVIĆI	MINISTARSTVO KOMUNALNE PRIVREDE,		83,572	78,261	0
2	IZGRADNJA CJEVOVODA ZA PRIKUPLJANJE I PRIHVAT PROCJEDNIH VODA SA CENTRALNOG DIJELA ODLAGALIŠTA NA DEPONIJU "SMILJEVIĆI" U SARAJEVU	INFRASTRUKTURE, PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA	GRAKOP	138,668	121,986	16,682
3	REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE PROFILA DN100 I DN150 U AHATOVIĆIMA UGOVOR 1	OPĆINA NOVI GRAD	HARYSKO INSTEL	462,150	448,465	194,091
4	IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U ULICI FERIDA SRNJE UGOVOR 1	OPĆINA NOVI GRAD	TED INVEST ORMAN	324,663	98,364	104,017
5	IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U ULICI FERIDA SRNJE UGOVOR 2			41,000	35,687	35,687

6	<b>IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U ULICI FERIDA SRNJE UGOVOR 3</b>			133,470	96,811	96,811
7	<b>ADAPTACIJA TEKUĆEG I TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA KUĆA SLOBODA U SKLOPU SK TUNEL D-B ( DOBRINJSKA STRANA)</b>	JU FOND MEMORIJALA KS	CENTAR- HAN	702,069	579,739	579,739
8	<b>ADAPTACIJA TEKUĆEG ODRŽAVANJA OBJEKTA SK TUNEL D-B - ANEX UGOVORA 1</b>			132,826	119,201	119,201
9	<b>ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI RADOVI (II DIO) NA OBJEKTU KUĆA SLOBODA U SKLOPU SK TUNEL D-B (DOBRINJSKA STRANA)</b>			205,449	140,027	140,027
10	<b>REKONSTRUKCIJA PUTA U ULICI AHATOVIĆKA; DIONICA OD SPOJA AHATOVIĆKE ULICE SA DOBROŠEVIĆKOM ULICOM</b>	DIREKCIJA ZA PUTEVE KS	MGBH	741,853	566,430	566,430
11	<b>IZGRADNJA KRUŽNE RASKRSNICE NA SPOJU ULICA DŽEMALA BIJEDIĆA, SRĐANA ALEKSIĆA I VELIKIH DRVETA</b>	DIREKCIJA ZA PUTEVE KS, OPĆINA NOVI GRAD	MEVLUDIN COMMERC	1,369,881	832,650	537,231
12	<b>GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI NA DOGRADNJI POLICIJSKOG OBJEKTA PS NOVI GRAD ( PRVA FAZA)</b>	MUP KS	ITC ZENICA	526,870	122,747	122,747
13	<b>UGOVOR - 1 IZGRADNJA SPORTSKO-REKREACIONOG CENTRA DOBRINJA</b>	OPĆINA NOVI GRAD	UNIGRADNJA	788,727	0	0
14	<b>UGOVOR - 2 IZGRADNJA SPORTSKO-REKREACIONOG CENTRA DOBRINJA</b>			1,385,332	0	0

15	<b>UGOVOR - Izvođenje dodatnih radova na IZGRADNJA SPORTSKO-REKREACIONOG CENTRA DOBRINJA</b>			139,058	0	0
16	<b>UGOVOR - 3 IZGRADNJA SPORTSKO-REKREACIONOG CENTRA DOBRINJA</b>			799,573	0	0
17	<b>UGOVOR - 4 IZGRADNJA SPORTSKO-REKREACIONOG CENTRA DOBRINJA</b>			795,808	0	0
18	<b>UGOVOR - Izvođenje dodatnih radova na IZGRADNJA SPORTSKO-REKREACIONOG CENTRA DOBRINJA</b>			202,107	0	0
19	<b>UGOVOR - 5 IZGRADNJA SPORTSKO-REKREACIONOG CENTRA DOBRINJA</b>			1,924,885	0	0
20	<b>Addendum za Ugovore -RUC (bazenska tehnika)</b>			456,317	0	0
21	<b>SRC DOBRINJA SA OTVORENIM BAZENOM III FAZA</b>			1,448,223	996,550	996,550
22	<b>REKONSTRUKCIJA A TRANSVERZALE (PRIKLJUČAK ULICA BRANISLAVA NUŠIĆA I HAJRUDINA ŠABANIJE NA A TRANSVERZALU)</b>	OPĆINA NOVI GRAD DIREKCIJA ZA PUTEVE KS	ORMAN	582,603	429,284	429,284
23	<b>IZMJEŠTANJE BATERIJE VENTILA I ČELIČNOG GASOVODA U ULICI DŽEMALA BIJEDIĆA I SRĐANA ALEKSIĆA TE IZMJEŠTANJE PRIJEMNO REGULACIONE STANICE I PRIPADAJUĆIH GASOVODA NA SPOJU ULICA DŽEMALA BIJEDIĆA I IVE ANDRIĆA</b>	OPĆINA NOVI GRAD	KJKP SARAJEVOGAS	73,591	0	0

24	<b>ZAŠTITNA OGRADA NA TRAMV STAJALIŠTU OTOKA (SMJER ILIDŽA-GRAD)</b>	MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA	STEP	4,422	0	0
25	<b>IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U ULICI 14.JUNI U ZONI REZERVOARA "DONJI MIHALJEVIĆI"</b>	OPĆINA NOVI GRAD	HIDROM	534,321	181,385	181,385
26	<b>IZVOĐENJE RADOVA NA SPOJU ULICA IX TRANSFERZALE, ULICA DŽEMALA BIJEDIĆA I IVE ANDRIĆA SA PROJKETOM IZMJEŠTANJA ILI ZAŠTITE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU KRUŽNE RASKRSNICE</b>	OPĆINA NOVI GRAD DIREKCIJA ZA PUTEVE KS	BOSMAN	1,964,020	0	0
27	<b>IZGRADNJA VODOVODNE DISTRIBUTIVNE MREŽE U ULICI BUTILSKA</b>	OPĆINA NOVI GRAD	MANJO	831,198	416,201	416,201
28	<b>ISKOP ROVA RADI POLAGANJA CJEVOVODA DN 700 mm</b>	OPĆINA NOVI GRAD DIREKCIJA ZA PUTEVE KS	MEVLUDIN COMMERC	93,358	74,203	74,203
29	<b>UGRADNJA LIFTA ZA UČENIKE SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU</b>	JU OŠ SKENDER KULENOVIĆ	EURO PROST	64,467	0	0
30	<b>REHABILITACIJA VIII TRANSVERZALE (ULICE MAJDANSKA I SULEJMANA EFENDIJE MUSIĆA), FAZA I</b>	OPĆINA NOVI GRAD DIREKCIJA ZA PUTEVE KS	GRAKOP	906,769	0	0
<b>OPĆINA NOVI GRAD UKUPNO:</b>				17.857.249	5.337.989	<b>4.610.285</b>

## OPĆINA NOVO SARAJEVO

REDNI BROJ	UGOVOR				REALIZACIJA	
	NAZIV	INVESTITOR	IZVOĐAČ	VRIJEDNOST	UKUPNO	u 2023. g.
1	IZGRADNJA KANALIZACIONE I VODOVODNE MREŽE U ULICI PETRA SINANA ŠAINA	OPĆINA NOVO SARAJEVO	MIBRAL	922.428	733.548	539.000
2	NABAVKA ISPORUKA I UGRADNJI DIJELA SISTEMA ZA KONTROLU PRISTUPA, ZAŠTITE I SIGURNOSTI NA DIJELU LOKALITETA PARK - ŠUME HUM	OPĆINA NOVO SARAJEVO	ARGON SISTEMI	274.999	0	0
3	SANACIJA KLIZIŠTA NA LOKALITETU HUM - KLIZIŠTE K4	OPĆINA NOVO SARAJEVO	MIBRAL	884.848	524.911	524.911
4	TREĆA GIMNAZIJA RADOVI NA ELIMINACIJI ARHITEKTONSKIH BARIJERA	UNDP	SELA	279.700	10.237	10.237
5	CENTAR ZA SOCIJALNI RAD RADOVI NA ELIMINACIJI ARHITEKTONSKIH BARIJERA	UNDP	SELA	169.543	64.535	64.535
6	REHABILITACIJA (SANACIJA) DIJELA ULICE LOŽIONIČKA	DIREKCIJA ZA PUTEVE KS	STRABAG	1.160.626	452.235	452.235
7	ČIŠĆENJE I SNIMANJE KANALIZACIONE MREŽE U ULICI NEDIMA FILIPOVIĆA	ZAVOD ZA IZGRADNJU KS	KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA"	5.827	0	0
<b>OPĆINA NOVO SARAJEVO UKUPNO:</b>				3.697.971	1.785.466	<b>1.590.918</b>

## OPĆINA STARI GRAD

REDNI BROJ	UGOVOR				REALIZACIJA	
	NAZIV	INVESTITOR	IZVOĐAČ	VRIJEDNOST	UKUPNO	u 2023. g.
1	SANACIJA BISTRIČKOG POTOKA U SARAJEVU - I FAZA	GRAD SARAJEVO	MIBRAL	249.731	143.831	0
2	SANACIJA BISTRIČKOG POTOKA U SARAJEVU - II i III FAZA	GRAD SARAJEVO		423.638	0	0
3	REKONSTRUKCIJA SEPARATNE KANALIZACIONE MREŽE U DIJELU ULICE ARAPOVA, OD RASKRSNICE SA ULICOM ŽEPA DO ULICE MEJLIJANA,	OPĆINA STARI GRAD	HARYSCO	186.182	102.669	0
4	NEPREDVIĐENI RADOVI "REKONSTRUKCIJA SEPARATNE KANALIZACIONE MREŽE U DIJELU ULICE ARAPOVA, OD RASKRSNICE SA ULICOM ŽEPA DO ULICE MEJLIJANA			19.987	0	0
5	PRVA FAZA RADOVA REKONSTRUKCIJE SEPARATNE KANALIZACIONE MREŽE U DIJELU ULICE MAČKAREVA, OD ULICE VRATNIK MEJDAN DO RASKRSNICE SA ULICOM PRIJEKA ČESMA	OPĆINA STARI GRAD	HARYSCO	300.032	187.366	0
6	IZGRADNJA MREŽE ZA ODVODNJU FEKALNIH VODA OBJEKATA LOCIRANOG UZ DOLAZNU STANICU TREBEVIČKE ŽIČARE	GRAD SARAJEVO	MIBRAL	1.474.160	1.224.360	183.391
7	DODATNI RADOVI NA SANACIJI ASFALTNE POVRŠINE APELOVE CESTE			294.801	265.138	265.138



8	IMPLEMENTACIJA SEMAFORIZACIJE RASKRSNICE VJEĆNICA- MOST ISA BEGA ISHAKOVIĆA - GARAŽA	MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA	STEP	0	0	0
9	SANACIJA KLIZIŠTA NA LOKALITETU SEDRENİK BR.56	OPĆINA STARI GRAD	OXA	56.160	0	0
10	SANACIJA KLIZIŠTA NA LOKALITETU MOČILA BROJ 45, OPĆINA STARI GRAD	OPĆINA STARI GRAD	OXA	94.931	0	0
11	REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE KOLSKE SAOBRAĆAJNICE I IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA-SANACIJA KLIZIŠTA U ULICI TRČIVODE BROJ 46,OPĆINA STARI GRAD	OPĆINA STARI GRAD	OXA	209,757,23	0	0
12	II FAZA REKONSTRUKCIJE SEPARATNE KANALIZACIONE MREŽE U DIJELU ULICE MAČKAREVA SA SANACIJOM KALDRME I IZMJEŠTANJEM GASNE MREŽE, OD RASKRSNICE SA ULICOM PRIJEKA ČESMA DO ULICE ĆEBEDŽIJE, MZ VRATNIK	OPĆINA STARI GRAD	TED INVEST	455.709	0	0
13	REHABILITACIJA REGIONALNOG PUTA DARIVA - HREŠA - GRANICA ENTITETA (L=CCA 5km), DIONICA III: REZERVOAR NA BRUSULJAMA - DO KRAJA SANIRANOG DIJELA, L= CCA 225m	DIREKCIJA ZA PUTEVE KS	KJKP RAD	311.365	0	0
14	ČIŠĆENJE KORITA OTVORENIH VODOTOKA ČOLINOG POTIKA I RAMIĆA POTOKA	OPĆINA STARI GRAD	TELEFONOGRADNJA	79.548	0	0
<b>OPĆINA STARI GRAD UKUPNO:</b>				3.946.243	1.923.365	<b>448.529</b>

## OPĆINA TRNOVO

REDNI BROJ	UGOVOR				REALIZACIJA	
	NAZIV	INVESTITOR	IZVOĐAČ	VRIJEDNOST	UKUPNO	u 2023. g.
1	AUTOMATSKA GARAŽA ZA ŠESTOSJEDNU ŽIČARU	KJP "ZOI 84" OCS	STRUCON	1.983.150	1.922.754	60.396
2	DODATNI RADOVI NA IZGRADNJI AUTOMATSKE GARAŽE			396.627	354.540	256.237
3	IZGRADNJA CENTRALNOG VODOVODA MZ TRNOVO	OPĆINA TRNOVO	BUJICE	619.924	567.781	305.225
4	IZMJEŠTANJE ČETVEROSJEDNE ŽIČARE	KJP "ZOI 84" OCS	STRUCON	4.212.000	3.995.550	409.500
5	NABAVKA I POSTAVLJANJE ZNAKOVA NA SKI STAZAMA : LOT2 AL ZNAKOVI I PRATEĆA OPREMA	KJP "ZOI 84" OCS	BULJAN CESTE	46.800	17.204	17.204
6	IZGRADNJA REGIONALNOG VODOVODA HOJTA - IGMAN - BJELAŠNICA DIONICA PANDURICA - ŠILJAK - AKUMULACIJA II	OPĆINA TRNOVO	ITC ZENICA ROCO-COMMERC	400.000	113.576	0

7	<b>LOT1. IZGRADNJA SISTEMA OSNJEŽAVANJA GRAVITACIONI SISTEM</b>	KJP "ZOI 84" OCS	SUPERSNOW S.A. MGBH	5.312.509	4.501.595	3.644.315
8	<b>LOT 2. IZGRADNJA SISTEMA OSNJEŽAVANJA SISTEM VISOKOG PRITISKA</b>	KJP "ZOI 84" OCS	TECHNOALPIN S.P.A BOLZANO ORMAN GRAKOP	6.783.918	4.913.461	3.532.989
9	<b>OPREMANJE TOALETA U OBJEKTU GARAŽE ŠESTEROSJEDNE ŽIČARE NA BJELAŠNICI</b>	KJP "ZOI 84" OCS	VEKTOR-INTEGRA	254.912	0	0
10	<b>REHABILITACIJA REGIONALNOG PUTA R442a HADŽIĆI - GORNJA GRKARICA - GRANICA ENTITETA, DIONICA : OD PRIKLJUČKA ZA TRNOVO, PENDIČIĆI, DEJČIĆI, LEDIĆI DO GRANICE ENTITETA, km 18+500 DO km 27+965, L=9.465km, - KNJIGA 1 I OSTATAK KNJIGA 2 - km 19+960 DO km 24+800, FAZA I: OD km 21+060 DO km 22+460</b>	DIREKCIJA ZA PUTEVE KS	ORMAN	990.000	268.685	268.685
12	<b>IZGRADNJA VODOVODA PANDURICA - PROSKOK</b>	OPĆINA TRNOVO	HYDRA	989.318	403.750	403.750
13	<b>LOT 1.-NADOGRAĐNJA SISTEMA RASVJETE SKI STAZA 5A-ŠTINJI DO DO BABINOŠ DOLA, LOT-1</b>	KJP "ZOI 84" OCS	STEP	772.392	670.443	670.443
14	<b>UREĐENJE SKI STAZE I PRATEĆE INFRASTRUKTURE ANKERA I SNJEGOBRANA NA STAZI KOTLOVI - LOT 1</b>	KJP "ZOI 84" OCS	B2	1.107.499	0	0

15	<b>IZGRADNJA SKI STAZE TERHNIČKI PUT - AKUMULACIJA 2 I IZGRADNJA STAZA NA OBJE STRANE OD IZLAZNE STAZE ČETVEROSJEDA - LOT 2</b>			701.215	477.889	<b>477.889</b>
16	<b>REKONSTRUKCIJA GORNJEG DIJELA STAZE 5 I KOMPLETNE STAZE 5B I IZGRADNJA SPOJNE SKI STAZE IZMEĐU STAZE 4 I KOLIJEVKE</b>			841.480	671.024	<b>671.024</b>
17	<b>LOT 2.-NADOGRAĐNJA SISTEMA RASVJETE SKI STAZA 5 LOT-2</b>	KJP "ZOI 84" OCS	SES	396.630	201.419	<b>201.419</b>
18	<b>UREĐENJE KORITA RIJEKE, LOT 1. UREĐENJE KORITA RAKITNICE U ŠABIĆIMA OD PROFILA P25-P29, DUŽINE L=82,5m</b>	OPĆINA TRNOVO	MEVLUDIN COMMERC	199.934	0	<b>0</b>
19	<b>UREĐENJE KORITA RIJEKE, Lot 2. UREĐENJE KORITA KRSINJE U PENDIČIĆIMA - NASTAVAK RADOVA, DUŽINE L=93,5m</b>	OPĆINA TRNOVO	MEVLUDIN COMMERC	199.931	0	<b>0</b>
20	<b>HIDROSJETVA SKIJAŠKIH STAZA</b>	KJP "ZOI 84" OCS	EURO-AGRAR	70.200	14.127	<b>14.127</b>
21	<b>HIDROSJETVA SKIJAŠKIH STAZA</b>	KJP "ZOI 84" OCS	EURO-AGRAR	46.800	29.965	<b>29.965</b>

22	<b>ODVODNJA OBORINSKIH VODA SA PARKINGA BABIN DO</b>	KJP "ZOI 84" OCS	ATLAS -D	339.151	270.005	270.005
23	<b>REKONSTRUKCIJA SABIRNOG BAZENA ZA PUNJENJE AKUMULACIJE 1</b>	KJP "ZOI 84" OCS	ORMAN	85.505	0	0
24	<b>REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE I FEKALNE KANALIZACIJE BABIN DO BJELAŠNICA</b>	KJP "ZOI 84" OCS	HHYDRA	151.952	124.902	124.902
25	<b>BENETON KROV - SANACIJA</b>	KJP "ZOI 84" OCS	ALBERA	69.317	23.552	23.552
26	<b>UREĐENJE KORITA RIJEKE, LOT 3. UREĐENJE KORITA KRSINJE U GRAČANICI, DUŽINE L=35m</b>	OPĆINA TRNOVO	MGBH	99.968	54.785	54.785
27	<b>REHABILITACIJA REGIONALNOG PUTA R753, DIONICA SPOJ SA R960 - UMOLJANI, L=cca3,5km, FAZA I, OD P1 DO P126, L=1.36km</b>	DIREKCIJA ZA PUTEVE KS	GRAKOP	699.822	0	0
<b>OPĆINA TRNOVO UKUPNO:</b>				27.770.954	19.597.007	<b>11.436.413</b>

## OPĆINA VOGOŠĆA

REDNI BROJ	UGOVOR				REALIZACIJA	
	NAZIV	INVESTITOR	IZVOĐAČ	VRIJEDNOST	UKUPNO	u 2023. g.
1	IZVOĐENJE KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA VODOVODNOJ MREŽI I POLAGANJU DN100 mm U ULICI KRIVOGLAVCI, NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆI	OPĆINA VOGOŠĆA	KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA"	118.533	85.470	50.145
2	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE U NASELJU DONJI HOTONJ, POTEZ DŽAMIJA -SRC SPORTA HOTONJ (OBUHVAT ULICE RAMIZA GUGAČA -RAMIZA ALIĆA-DONJI HOTONJ IV I PRIPADAJUĆE ULICE)- FAZA II	OPĆINA VOGOŠĆA	HIDROM	459.524	359.026	114.034
3	REKONSTRUKCIJA ZGRADE PIO U SVRHU FORMIRANJA CENTRA ZA ZDRAVO STARENJE	OPĆINA VOGOŠĆA	SELA	70.196	42.158	8.879
4	SANACIJA KLIZIŠTA NA LOKALITETU SVRAKE IV-UGOVOR I	ZAVOD ZA IZGRADNJU KS, KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE KS, OPĆINA VOGOŠĆA	TERMOBETON	351.736	34.974	34.974
5	NEOPHODNA NABAVKA, POSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE I OPREME NA PODRUČJU MZ KOBILJA GLAVA, MZ HOTONJ, MZ BLAGOVAC, MZ VOGOŠĆA I, MZ VOGOŠĆA II, MZ SEMIZOVAC I MZ SVRAKE	OPĆINA VOGOŠĆA	SACOM	44.962	39.723	39.723

6	<b>POSTAVLJANJE ZAŠTITNE (SIGURNOSNE) OGRADE, PJEŠAČKE OGRADE, PREVENTIVNIH IZBOČINA I SAOBRAĆAJNIH OGLEDALA U ULICAMA: MUJE ŠEJTE, BRAĆE KRŠO, KARAVDIĆA SOKAK, JASMINA DŽINDE, RAVNE, BRANILACA HOTONJA, SVRAKE III, BLAGOVAC III I KENANA BRKANIĆA, NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA</b>			58.945	57.643	57.643
7	<b>REKONSTRUKCIJA SAOBRAĆAJNICE U UL.SVRAKE IV-NASTAVAK U DUŽINI OD cca 110 m</b>	OPĆINA VOGOŠĆA	AME	303.522	148.835	148.835
8	<b>DOGRADNJA JU OŠ "ZAHID BARUČIJA" VOGOŠĆA</b>	OPĆINA VOGOŠĆA	ITC ZENICA	2.701.177	132.613	132.613
9	<b>DOGRADNJA JU OŠ "ZAHID BARUČIJA" VOGOŠĆA- DODATNI</b>			222.402	76.549	76.549
10	<b>IZGRADNJA KIŠNE I FEKALNE KANALIZACIJE U NASELJU HOTONJ IV SA OBNOVOM ASFALJNIH POVRŠINA NAKON IZVEDENIH RADOVA</b>	OPĆINA VOGOŠĆA	BUJICE	637.618	424.835	424.835
11	<b>SANACIJA PUTEVA U ULICAMA: DONJA JOŠANICA I, BRANILACA HOTONJA I RAŠIDA BEŠLIJE</b>	OPĆINA VOGOŠĆA	MGBH	454.182	362.172	362.172
12	<b>SANACIJA PUTEVA U ULICAMA: DRESKOVAČA, BARICA, GORA (LJETOVİK) I PJEŠAČKE STAZE U UL.DONJA VOGOŠĆA</b>	OPĆINA VOGOŠĆA	AME	389.550	332.248	332.248

13	<b>VODOSNABDIJEVANJE NASELJA POTUROVIĆI I LJUBINA NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA - I FAZA</b>	OPĆINA VOGOŠĆA I KJKP VIK	UNIONINVEST	919.177	265.878	265.878
14	<b>VODOSNABDIJEVANJE GORNJIH ZONA NASELJA KRIVOGLAVCI I SVRAKE-I FAZA (Izgradnja rezervoara Krivoglavci I i rezervoara Krivoglavci II)</b>	OPĆINA VOGOŠĆA	MIBRAL	983.970	506.702	506.702
15	<b>ZIMSKO ODRŽAVANJE LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA I TROTOARA, NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA U SEZONI 2023/2024. GODINE</b>	OPĆINA VOGOŠĆA	AME	479.637	100.922	100.922
16	<b>IZGRADNJA DIJELA SAOBRAĆAJNICE U NASELJU ROSULJE U DUŽINI OD cca 260 m</b>	DIREKCIJA ZA PUTEVE KS OPĆINA VOGOŠĆA	AME	399.729	25.527	25.527
17	<b>REDOVNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA, PJEŠAČKIH STAZA, TRGOVA, PLATOVA I PARKINGA NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA U 2023. GODINI - UGOVOR I</b>	OPĆINA VOGOŠĆA	OXA	125.462	91.084	91.084
18	<b>REDOVNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA, PJEŠAČKIH STAZA, TRGOVA, PLATOVA I PARKINGA NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA U 2023. GODINI - UGOVOR II</b>			115.406	0	0



19	<b>TRAJNA REGULACIJA RIJEKE VOGOŠĆE NA DIONICI OD PROFILA P17 DO IZVEDENE REGULACIJE - II FAZA</b>	OPĆINA VOGOŠĆA	TERMO-BETON	328.758	277.015	<b>277.015</b>
20	<b>OBNAVLJANJE, ZAMJENA I OJAČANJE KOLOVOZA NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA - UGOVOR I</b>	OPĆINA VOGOŠĆA	AME	87.555	59.464	<b>59.464</b>
21	<b>OBNAVLJANJE, ZAMJENA I OJAČANJE KOLOVOZA NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA - UGOVOR II</b>			124.436	0	<b>0</b>
22	<b>VODOSNABDIJEVANJE GORNJIH ZONA NASELJA KRIVOGLAVCI I SVRAKE U OPĆINI VOGOŠĆA - III FAZA</b>	OPĆINA VOGOŠĆA	HARYSKO INSTEL	972.373	299.073	<b>299.073</b>
23	<b>VODOSNABDIJEVANJE NASELJA POTUROVIĆI I LJUBINA NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA - II FAZA CJEVOVOD</b>	OPĆINA VOGOŠĆA	TED INVEST	687.107	164.794	<b>164.794</b>
24	<b>VODOSNABDIJEVANJE GORNJIH ZONA NASELJA KRIVOGLAVCI I SVRAKE - II FAZA - PUMPNE STANICE KRIVOGLAVCI I I II</b>	OPĆINA VOGOŠĆA I KJKP VIK	UNIONINVEST	713.700	0	<b>0</b>
25	<b>IZGRADNJA KIŠNE I FEKALNE KANALIZACIJE U NASELJU HOTONJ IV - II FAZA</b>	OPĆINA VOGOŠĆA	TED INVEST	402.227	0	<b>0</b>
26	<b>ČIŠĆENJE KORITA RIJEKE LJUBINE, KRITIČNE TAČKE - II FAZA</b>	OPĆINA VOGOŠĆA	TERMO-BETON	81.315	0	<b>0</b>
<b>OPĆINA VOGOŠĆA UKUPNO:</b>				<b>12.233.199</b>	<b>3.886.703</b>	<b>3.573.107</b>

## PROJEKTI NA PODRUČJU VIŠE OPĆINA

REDNI BROJ	UGOVOR				REALIZACIJA	
	NAZIV	INVESTITOR	IZVOĐAČ	VRIJEDNOST	UKUPNO	u 2023. g.
1	I FAZA RADOVA IZGRADNJE I OPREMANJA TRAMVAJSKIH STAJALIŠTA ZA KONTROLISANU NAPLATU KARATA I UVOĐENJE ELEKTRONSKOG SISTEMA NAPLATE	MINISTARTVO SAOBRAČAJA	BS TELECOM SOLUTION I EUROASFALT	7.115.064	5.927.427	37.582
2	UGOVOR III - REDOVNO ODRŽAVANJE AUTOMATSKIH BROJAČA SAOBRAČAJA	DIREKCIJE ZA PUTEVE KS	NTSI-INSTITUT	39.087	19.798	19.798
3	ODRŽAVANJE SEMAFORA U KANTONU SARAJEVO	MINISTARTVO SAOBRAČAJA	STEP	699.566	265.255	265.255
4	IZRADA TEMELJA ZA NIŠANE I NADGROBNE SPOMENIKA NA GRADSKIM GROBLJIMA U KANTONU SARAJEVO	JU "FOND MEMORIJALA KS"	KJKP POKOP	240.366	167.967	167.967
5	IZRADA I POSTAVLJANJE NIŠANA I SPOMENIKA ZA ŠEHIDE, UMRLE BRANITELJE I RODITELJE ŠEHIDA	JU "FOND MEMORIJALA KS"	KLESAR	719.881	677.307	677.307
6	IZRADA TEMELJA ZA NIŠANE I NADGROBNE SPOMENIKA NA GRADSKIM GROBLJIMA U KANTONU SARAJEVO - ugovor 2	JU "FOND MEMORIJALA KS"	KJKP POKOP	14.617	0	0
<b>PROJEKTI NA PODRUČJU VIŠE OPĆINA UKUPNO:</b>				<b>8.828.581</b>	<b>7.057.754</b>	<b>1.167.909</b>


## PRAČA

REDNI BROJ	UGOVOR				REALIZACIJA	
	NAZIV	INVESTITOR	IZVOĐAČ	VRIJEDNOST	UKUPNO	u 2023. g.
1	IZGRADNJA PRIHVATILIŠTA ZA NAPUŠTENE PSE KANTONA SARAJEVO I FAZA PRAČA	KJP"VETERINARSKA STANICA"	RADIS	2.105,957	49.959	49.959
<b>PRAČA UKUPNO:</b>				2.105,957	<b>49.959</b>	<b>49.959</b>

## MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA - POTOČARI

REDNI BROJ	UGOVOR				REALIZACIJA	
	NAZIV	INVESTITOR	IZVOĐAČ	VRIJEDNOST	UKUPNO	u 2023. g.
1	IZGRADNJA DEPOA ZA SMJEŠTAJ BIOLOŠKIH MATERIJALA, PREDMETA I LIČNE ODJEĆE ŽRTAVA GENOCIDA	CRS & MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA - POTOČARI	UNIONINVEST	1.215,248	0	0
<b>MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA - POTOČARI UKUPNO:</b>				1.215,248	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>REKAPITULACIJA</b>				
<b>AKTIVNI UGOVORI - NASTAVAK REALIZACIJE U 2024.g.</b>				
<b>PODRUČJE REALIZACIJE</b>	<b>BROJ UGOVORA</b>	<b>VRIJEDNOSTI UGOVORA (KM)</b>	<b>REALIZACIJA (KM)</b>	
			<b>UKUPNO</b>	<b>u 2023. g.</b>
<b>OPĆINA CENTAR</b>	22	9.448.315	5.825.025	845.843
<b>OPĆINA HADŽIĆI</b>	14	5.284.692	2.486.010	1.470.142
<b>OPĆINA ILIJAŠ</b>	7	2.666.446	1.265.025	573.278
<b>OPĆINA ILIDŽA</b>	24	19.514.538	4.379.122	1.781.149
<b>OPĆINA NOVI GRAD</b>	30	17.857.249	5.337.989	4.610.285
<b>OPĆINA NOVO SARAJEVO</b>	7	3.697.971	1.785.466	1.590.918
<b>OPĆINA STARI GRAD</b>	14	3.946.243	1.923.365	448.529
<b>OPĆINA TRNOVO</b>	27	27.770.954	19.597.007	11.436.413
<b>OPĆINA VOGOŠĆA</b>	26	12.233.199	3.886.703	3.573.107
<b>PROJEKTI NA PODRUČJU VIŠE OPĆINA</b>	6	8.828.581	7.057.754	1.167.909
<b>PRAČA</b>	1	2.105.957	49.959	49.959
<b>MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA - POTOČARI</b>	1	1.215.248	0	0
<b>UKUPNO</b>	<b>179</b>	<b>114.569.392</b>	<b>53.593.426</b>	<b>27.547.530</b>

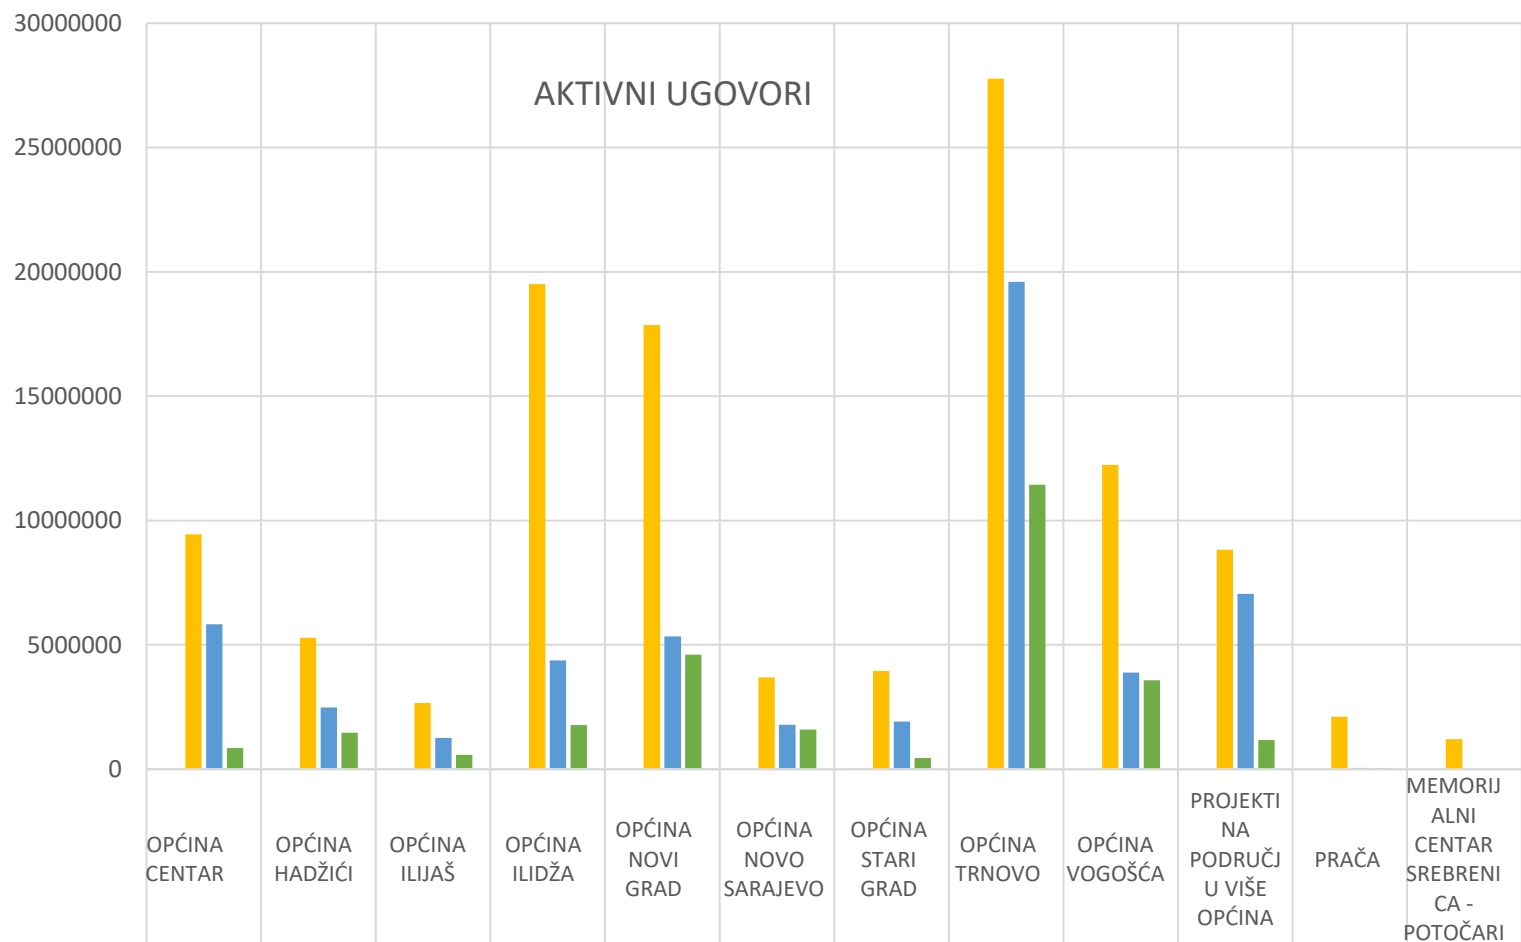

■ BROJ UGOVORA	22	14	7	24	30	7	14	27	26	6	1	1
■ UGOVORENO KM	9.448.315	5.284.692	2.666.446	19.514.538	17.857.249	3.697.971	3.946.243	27.770.954	12.233.199	8.828.581	2.105.957	1.215.248
■ UKUPNO REALIZOVANO KM	5.825.025	2.486.010	1.265.025	4.379.122	5.337.989	1.785.466	1.923.365	19.597.007	3.886.703	7.057.754	49.959	0
■ REALIZOVANO U 2023. KM	845.843	1.470.142	573.278	1.781.149	4.610.285	1.590.918	448.529	11.436.413	3.573.107	1.167.909	49.959	0

**NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA  
UGOVORI ZAVRŠENI U 2023.g.**

**OPĆINA CENTAR**

REDNI BROJ	UGOVOR				REALIZACIJA	
	NAZIV	INVESTITOR	IZVOĐAČ	VRIJEDNOST	UKUPNO	u 2023. g.
1	IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI TRAFOSTANICE "797 ORTOPEDIJA - DRUGA FAZA" U KRUGU UKC SARAJEVO	KCUS	DELING	19.890	19.890	19.890
2	IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI TRAFOSTENICE925 - STARA HIRURGIJA			100.035	99.943	99.943
3	SANACIJA TERASE I DIJELA DVORIŠTA CENTRALNOG DIJELA OBJEKTA ZAVODA	JU ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVA KS	DINALSA	28.794	22.148	22.148
4	REKONSTRUKCIJA VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE U ULICI KRANJČEVIĆEVA II	KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA"	MIBRAL	782.307	696.852	357.822
5	REKONSTRUKCIJA VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE U ULICI KRANJČEVIĆEVA II_ FAZA II			126.293	99.136	99.136

6	ZAMJENA LIFTOVA JU OB "PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ"	JU OPĆA BOLNICA	KA BEST	113.256	113.256	113.256
7	ZAMJENA POSTOJEĆEG SISTEMA VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE JU OB "PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ"		CLIMA - TRADE	349.919	338.642	338.642
8	IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI ILUMINACIJE FASADE NA OBJEKTU AKADEMIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI U SARAJEVU	OPĆINA CENTAR	SES	70.588	70.407	70.407
16	IZVOĐENJE DODATNIH RADOVA NA SANACIJI ILUMINACIJE FASADE NA OBJEKTU AKADEMIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI U SARAJEVU			6.733	6.733	6.733
9	ADAPTACIJA SERVER SOBE ZAVODA ZA IZGRADNJU KS	ZAVOD ZA IZGRADNJU KS	DINALSA	21.242	21.242	21.242
10	ZAMJENA POSTOJEĆEG SISTEMA VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE - OPĆA BOLNICA	Ministarstvo zdravstva KS	KLIMA TRADE	349.919	338.642	338.642
11	IZVOĐENJE RADOVA NA UGRADNJI RASVJETE U OBJEKTU EVROPSKA KUĆA KULTURE I NACIONALNIH MANJINA	OPĆINA CENTAR	SES	158.045	158.045	158.045
12	IZGRADNJA ZIMOVNIKA U RZC PIONIRSKA DOLINA I ZOO VRT	KJKP "PARK"	DŽEKOS	555.165	549.617	549.617

13	<b>IZGRADNJA ZIMOVNIKA U RZC PIONIRSKA DOLINA I ZOO VRT      Anex I</b>			28.959	26.951	26.951
14	<b>DODATNI RADOVI</b>			4.997	4.997	4.997
15	<b>VODOVODNE INSTALACIJE</b>			3.653	2.978	2.978
17	<b>HITNA SANACIJA NA STANOVIMA ZAVODA ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO</b>	ZAVOD ZA IZGRADNJU KS	ARH ING	6.903	6.552	6.552
18	<b>IZRADA ENERGETSKOG CERTIFIKATA</b>	FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE	EUROING	4.680	4.680	4.680
<b>OPĆINA CENTAR UKUPNO:</b>				2.731.379	<b>2.580.710</b>	<b>2.241.680</b>



## OPĆINA HADŽIĆI

REDNI BROJ	UGOVOR				REALIZACIJA	
	NAZIV	INVESTITOR	IZVOĐAČ	VRIJEDNOST	UKUPNO	u 2023. g.
1	NABAVKA I UGRADNJA PREPUMPNE STANICE ZA FEKALNE VODE U OBUHVATU TURISTIČKOG KOMPLEKSA RAWASI	OPĆINA HADŽIĆI	TOP TIM TRI	40.850	4.085	4.085
2	DODATNI RADOVI NA VODOSNABDIJEVANJU NASELJA BJELOTINE - MATIĆI PRVA FAZA	OPĆINA HADŽIĆI	MUSIĆ COMPANY MANJO	69.616	68.205	68.205
3	IZGRADNJA DIJELOVA SAOBRAĆAJNICE "1,2 I 3" U PRIVREDNOJ ZONI HADŽIĆI	OPĆINA HADŽIĆI	BUCOMERC	315.900	299.675	0
4	I FAZA RADOVA NA REHABILITACIJI PUTA U NASELJU GRIVIĆI	OPĆINA HADŽIĆI DIREKCIJA ZA PUTEVE KS	MUŠINBEGOVIĆ GRADNJA	273.780	273.780	40.357
5	II FAZA RADOVA NA REHABILITACIJI PUTA U NASELJU GRIVIĆI			268.522	224.536	141.302
6	IZGRADNJA SPORTSKOG I DJEČIJEG IGRALIŠTA U NASELJU DROZGOMETVA	OPĆINA HADŽIĆI	FLEX INVEST	386.100	362.231	94.747

7	<b>IZVOĐENJE DODATNIH RADOVA NA IZGRADNJI SPORTSKOG I DJEČIJEG IGRALIŠTA U NASELJU DROZGOMETVA</b>			28.908	28.908	28.908
8	<b>IZMJEŠTANJE REGULACIJE RIJEKE ZUJEVINE OD UŠĆA ŽUNOVAČKOG POTOKA DO PROFILA P5 U HADŽIĆIMA</b>	OPĆINA HADŽIĆI	MUSIĆ COMPANY BOSMAN	347.490	345.570	45.857
9	<b>REKONSTRUKCIJA I VANJSKO UREĐENJE O.Š. "6 MART" HADŽIĆI</b>	OPĆINA HADŽIĆI	ZZ GROS- COMP	175.041	168.607	141.224
10	<b>UGRADNJA PUTNIČKOG LIFTA NA HIDRAULIČKI POGON U JU OSNOVNA ŠKOLA HADŽIĆI</b>	OPĆINA HADŽIĆI	EURO PROST	70.142	70.142	70.142
11	<b>IZVOĐENJE PRVE FAZE RADOVA NA IZGRADNJI PUTA U MIŠEVIĆIMA OD P1 DO P22, L=574m UGOVOR I</b>	OPĆINA HADŽIĆI DIREKCIJA ZA PUTEVE KS	GRAKOP	693.655	693.320	63.596
12	<b>IZVOĐENJE DRUGE FAZE RADOVA NA IZGRADNJI PUTA U MIŠEVIĆIMA OD P22 DO P40, L=450m UGOVOR II</b>			670.264	549.910	409.159
13	<b>IZGRADNJA DIJELOVA SAOBRAĆAJNICA „1 i 4“ U PRIVREDNOJ ZONI HADŽIĆI</b>	OPĆINA HADŽIĆI	ADO - TRANS	596.700	486.999	27.668
14	<b>IZGRADNJA PUTNE KOMUNIKACIJE TRZANJ - ODŽAK</b>	OPĆINA HADŽIĆI DIREKCIJA ZA PUTEVE KS	BUCOMERC	285.821	274.269	37.561

15	IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI KLIZIŠTA NA LOKALITETU GAJ-MOKRINE (LOT 1)	OPĆINA HADŽIĆI	OD "POGLED"	67.155	67.151	3.251
16	ZAMJENA VANJSKE FASADNE STOLARIJE U ZGRADI TARČIN-UL. 27.JULA br 11	OPĆINA HADŽIĆI	MEGA-ROLL	18.720	18.720	18.720
<b>OPĆINA HADŽIĆI UKUPNO:</b>				4.308.663	3.936.107	<b>1.194.780</b>

## OPĆINA ILIJAŠ

REDNI BROJ	UGOVOR				REALIZACIJA	
	NAZIV	INVESTITOR	IZVOĐAČ	VRIJEDNOST	UKUPNO	u 2023. g.
1	REHABILITACIJA REGIONALNOG PUTA R444 POSTOJEĆIH TROTOARA I IZGRADNJA NOVIH TROTOARA, DIONICA: SPOJ SA R445 DO GRADNICE KANTONA (PREMA BREZI), FAZA I - OD P1 DO P23, L=700 m	DIREKCIJA ZA PUTEVE KS	CITARPRODUKT	666.666	556.983	80.967
2	IZVOĐENJE RADOVA NA REGULACIJI VODOTOKA POTOKA GNIONICA OD P0 DO P6	OPĆINA ILIJAŠ	ŠPIC BETON	497.583	497.482	157.787
3	SANACIJA KLIZIŠTA U NASELJU ALIĆA GAJ LOT -2	OPĆINA ILIJAŠ	SARAJEVO PUTEVI MGBH BILAL	266.350	266.350	120.042

4	<b>UGRADNJA SIGURNOSNIH ODBOJNIH OGRADA NA PUTU R445 LOT1</b>	DIREKCIJA ZA PUTEVE KS	SAKOM	262.846	213.254	213.254
5	<b>IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI PRIMARNOG GRADSKOG VODOVODA U NASELJU BIOČA</b>	OPĆINA ILIJAŠ	FAZUM GRADNJA	324.675	320.198	310.700
6	<b>IZGRADNJA DIJELA FEKALNE I OBORINSKE KANALIZACIONE MREŽE U DIJELU OBUHVATA RP BANOVAČ U DUŽINI 645M I 655M</b>	OPĆINA ILIJAŠ	TED INVEST	361.863	361.711	361.711
7	<b>IZGRADNJA DIJELA FEKALNE I OBORINSKE KANALIZACIONE MREŽE U DIJELU OBUHVATA RP "BANOVAČ"</b>	OPĆINA ILIJAŠ	TED INVEST	350.141	316.832	316.832
8	<b>REHABILITACIJA REGIONALNOG PUTA R444 POSTOJEĆIH TROTOARA I IZGRADNJA NOVIH TROTOARA, DIONICA: SPOJ SA R445 DO GRANICE KANTONA FAZA II</b>	DIREKCIJA ZA PUTEVE KS	CITARPRODUKT	637.515	523.519	523.519
	REHABILITACIJA REGIONALNOG PUTA R444 POSTOJEĆIH TROTOARA I IZGRADNJA NOVIH TROTOARA, DIONICA: SPOJ SA R445 DO GRANICE KANTONA (PREMA BREZI), FAZA II - OD P32 DO P65, L=700 m	OPĆINA ILIJAŠ		637.515	523.519	523.519
9	<b>IZGRADNJA VIŠENAMJENSKE SPORTSKE PLOHE KOD JU OŠ "HAŠIM SPAHIĆ" ILIJAŠ</b>	OPĆINA ILIJAŠ	FAZUM	353.872	353.638	353.638

10	RADOVI NA REHABILITACIJI PUTA U INDUSTRIJSKOJ ZONI "LUKA" SA FEKALNOM I OBORINSKOM ODVODNJOM I REKONSTRUKCIJOM VODOVODNE MREŽE OD RASKRSNICE KOD FIRME "ILMEX" DO RASKRSNICE MLIN CCA 330m	OPĆINA ILIJAŠ	NISKOGRADNJA DURMIĆ	342.810	297.091	297.091
11	IZGRADNJA PUTNIH KOMUNIKACIJA U OBUIHVATU IZ "LUKE"	OPĆINA ILIJAŠ	CITARPRODUKT	304.785	268.878	268.878
12	REKONSTRUKCIJA TOPLOVODNIH INSTALACIJA GRIJANJA I KOTLOVNICE JU OŠ SREDNJE	OPĆINA ILIJAŠ	BRAĆA KARIĆ	94.987	94.957	94.957
	RADOVI NA REHABILITACIJI PUTA U INDUSTRIJSKOJ ZONI "LUKA" SA FEKALNOM I OBORINSKOM ODVODNJOM I REKONSTRUKCIJOM VODOVODNE MREŽE OD RASKRSNICE KOD FIRME "ILMEX" DO RASKRSNICE MLIN CCA 330m	OPĆINA ILIJAŠ	NISKOGRADNJA DURMIĆ	342.810	297.091	297.091
13	REKONSTRUKCIJA PUTA U IZ "ŽELJEZERA" SA OBORINSKOM ODVODNJOM	OPĆINA ILIJAŠ	HALILOVIĆ	230.490	167.736	167.736
<b>OPĆINA ILIJAŠ UKUPNO:</b>				5.674.908	5.059.238	<b>4.087.719</b>

## OPĆINA ILIDŽA

REDNI BROJ	UGOVOR				REALIZACIJA	
	NAZIV	INVESTITOR	IZVOĐAČ	VRIJEDNOST	UKUPNO	u 2023. g.
1	ISKOP TVRDE STIJENE, KATEGORIJA 5, U ŠIROKOM OTKOPU, MAŠINSKI ISKOP, SA UTOVAROM I PREVOZOM NA STD 10 km, OD P26 DO P789 (0+402,84 do 1+507,67)	DIREKCIJA ZA PUTEVE KS	DEMUS	134.013	133.744	133.744
2	REKONSTRUKCIJA MOKRIH ČVORAOVA U OBJEKTU JU "PRVA OSNOVNA ŠKOLA"	OPĆINA ILIDŽA	ZZ GROS- COMP	160.056	153.140	153.140
3	REKONSTRUKCIJA MOKRIH ČVORAOVA U OBJEKTU JU "PRVA OSNOVNA ŠKOLA" DODATNI RADOVI			8.498	8.498	8.498
4	RADOVI NA PROŠIRENJU ALEJE VETERANA	KJKP „POKOP“	DEMUS	988.617	961.892	292.331
5	IZGRADNJA KRUŽNE RASKRSNICE NA RASKRSNICI ULICA BUTMIRSKA CESTA - POLIGONSKA-AERODROMSKA	DIREKCIJA ZA PUTEVE KS OPĆINA ILIDŽA	BETON FRESH	406.566	406.566	106.566
6	IZGRADNJA SEPARATNE KANALIZACIONE MREŽE U OBUHVATU ULICA HENDEKUŠA I OSIK I	OPĆINA ILIDŽA	MANJO	452.708	443.298	182.528

7	<b>IZGRADNJA SEPARATNE KAN. MREŽE U OBUHVATU ULICA HENDEKUŠA I OSIK I- dodatni</b>			86.024	80.021	80.021
8	<b>IZGRADNJA SEPARATNE KANALIZACIONE MREŽE U OBUHVATU ULICA HENDEKUŠA I OSIK II</b>			72.991	59.161	59.161
9	<b>IZGRADNJA SEPARATNE KANALIZACIONE MREŽE U OBUHVATU ULICA HENDEKUŠA I OSIK III</b>			291.305	137.240	137.240
10	<b>UREĐENJE I OPREMANJE POVRŠINE JAVNE NAMJENE (PJEŠAČKA ZONA), TRG SABITA HADŽIĆA I ŠKOLSKI TRG SA MEĐUSOBNOM VEZOM U UL.MALA ALEJA-ILIDŽA CENTAR</b>	OPĆINA ILIDŽA	MIBRAL	1.748.978	1.655.601	777.961
11	<b>DODATNI RADOVI NA PROJEKTU "UREĐENJE I OPREMANJE POVRŠINE JAVNE NAMJENE, TRG SABITA HADŽIĆA I ŠKOLSKI TRG SA MEĐUSOBNOM VEZOM U UL.MALA ALEJA</b>			70.846	65.417	65.417
12	<b>GRAĐEVINSKI RADOVCI VEZANI ZA HORIKULTURNO UREĐENJE CENTRALNOG TRGA</b>			4.549	4.549	4.549
13	<b>ODVODNJA I ZATRPAVANJE KANALA KOJI VODI DO RIJEKE DOBRINJE</b>	PD BUTMIR	MEVLUDIN COMMERC	90.581	86.860	86.860
14	<b>REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE U VELIKOJ ALEJI</b>	OPĆINA ILIDŽA	NEXEN	163.776	129.744	129.744

15	<b>RADOVI NA PROŠIRENJU ALEJE VETERANA IIa FAZA</b>	KJKP "POKOP"	EKO TEH	839.788	749.555	749.555
16	<b>ADAPTACIJA JAVNOG TOALETA NA PODRUČJU SPOMENIKA PRIRODE "VRELO BOSNE"</b>	KJU ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA	ZZ GROS COMP	163.288	173.606	173.606
17	<b>ANEX I</b>			23.230		
18	<b>IZGRADNJA KRUŽNE RASKRSNICE U OTESU</b>	OPĆINA ILIDŽA	MEVLUDIN	211.139	210.701	210.701
19	<b>SANACIJA, REKONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE SAOBRAĆAJNICA DRUGOG REDA NA PODRUČJU OPĆINA ILIDŽA LOT 2 -asfaltiranje ulice ROGAČIĆI do br.87</b>	OPĆINA ILIDŽA	DEMUS	18.810	18.409	18.409
20	<b>SANACIJA, REKONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE SAOBRAĆAJNICA DRUGOG REDA NA PODRUČJU OPĆINA ILIDŽA LOT 2 -asfaltiranje ulice PLANTAŽE od br.96 do br.120</b>			17.406	17.272	17.272
21	<b>SANACIJA, REKONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE SAOBRAĆAJNICA DRUGOG REDA NA PODRUČJU OPĆINA ILIDŽA LOT 2 -Rekonstrukcija ulice Džananova desna strana</b>			64.370	52.765	52.765
22	<b>SANACIJA, REKONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE SAOBRAĆAJNICA DRUGOG REDA NA PODRUČJU OPĆINA ILIDŽA LOT 2 -Rekonstrukcija KRAKA ULICE Oteška kod br.57</b>			16.619	16.247	16.247



23	<b>SANACIJA, REKONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE SAOBRAĆAJNICA DRUGOG REDA NA PODRUČJU OPĆINA ILIDŽA LOT 2 -Rehabilitacija kraka ulice Uglješe Uzelca od br.71 do br.87</b>			27.316	23.509	23.509
24	<b>SANACIJA, REKONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE SAOBRAĆAJNICA DRUGOG REDA NA PODRUČJU OPĆINA ILIDŽA LOT 2 -Ojačanje podtla u sklopu projekta rehabilitacije kraka ulice Uglješe Uzelca od br.71 do br.88</b>			8.154	6.246	6.246
25	<b>SANACIJA, REKONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE SAOBRAĆAJNICA DRUGOG REDA NA PODRUČJU OPĆINA ILIDŽA LOT 2 -Asfaltiranje kraka ulice Rogačići (dseni prilaz džamiji)</b>			11.944	11.790	11.790
26	<b>SANACIJA, REKONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE SAOBRAĆAJNICA DRUGOG REDA NA PODRUČJU OPĆINA ILIDŽA LOT 2 -Asfaltiranje dijela ulice Željeznička br.45</b>			12.716	10.461	10.461
27	<b>SANACIJA, REKONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE SAOBRAĆAJNICA DRUGOG REDA NA PODRUČJU OPĆINA ILIDŽA LOT 2 -Asfaltiranje ulice Igmanskih bataljona do br.26</b>			17.963	14.256	14.256
28	<b>SANACIJA, REKONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE SAOBRAĆAJNICA DRUGOG REDA NA PODRUČJU OPĆINA ILIDŽA LOT 2 -Asfaltiranje parking protora u ulici Bosanski ljljan kod džamije</b>			24.398	20.820	20.820
29	<b>SANACIJA, REKONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE SAOBRAĆAJNICA DRUGOG REDA NA PODRUČJU OPĆINA ILIDŽA LOT 2 -Ojačanje podtla Rogačići do br.87</b>			913	365	365

30	SANACIJA, REKONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE SAOBRAĆAJNICA DRUGOG REDA NA PODRUČJU OPĆINA ILIDŽA LOT 2 -Begluk			11.231	10.082	10.082
31	REKONSTRUKCIJA I SANACIJA KABINETA BIOLOGIJE, HEMIJE I FIZIKE U JU PETA OSNOVNA ŠKOLA SOKOLOVIĆI	JU PETA OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA	INTERMING	79.976	74.475	74.475
32	REKONSTRUKCIJA I SANACIJA KABINETA BIOLOGIJE, HEMIJE I FIZIKE U JU PETA OSNOVNA ŠKOLA SOKOLOVIĆI ANEX I			12.812		
33	REHABILITACIJA ULICE ZENIK	OPĆINA ILIDŽA	GP ING	362.700	351.740	351.740
<b>OPĆINA ILIDŽA UKUPNO:</b>				6.604.280	6.088.029	<b>3.980.057</b>

## OPĆINA NOVI GRAD

REDNI BROJ	UGOVOR				REALIZACIJA	
	NAZIV	INVESTITOR	IZVOĐAČ	VRIJEDNOST	UKUPNO	u 2023. g.
1	IZGRADNJA PRIMARNE KANALIZACIONE MREŽE U PODRUČJU ULICE SAFETA ZAJKE I KURTA SCHORKA KROZ POSLOVNE ZONE BAČIĆI I DONJE TELALOVO POLJE	OPĆINA NOVI GRAD	MANJO	801.943	662.945	14.220
2	REHABILITACIJA DIJELA ULICE DŽEMALA BIJEDIĆA	OPĆINA NOVI GRAD	ORMAN	626.185	614.900	461.279
3	ČIŠĆENJE KORITA RIJEKE MILJACKE OD BJEKTA FIS U HALILOVIĆIMA DO RTV DOMA, UGOVOR BR.1	MINISTARSTVO PRIVREDE KS, OPĆINA NOVI GRAD, ZAVOD ZA IZGRADNJU KS	HARYSCO HL GRADNJA	200.000	199.999	199.999
4	ČIŠĆENJE KORITA RIJEKE MILJACKE OD BJEKTA FIS U HALILOVIĆIMA DO RTV DOMA, UGOVOR BR.2			99.997	99.988	99.988
5	SANACIJA KLIZIŠTA UZ INTERNU SAOBRAĆAJNICU KOD PLATO A ZA INTERNI OTPAD NA DEPONIJ I "SMILJEVIĆI"	MINISTARSTVO KOMUNALNE PRIVREDE, INFRASTRUKTURE, PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA, KJKP RAD	GRAKOP	95.000	172.520	70.920
<b>OPĆINA NOVI GRAD UKUPNO:</b>				1.823.124	1.750.352	<b>846.407</b>

## OPĆINA NOVO SARAJEVO

REDNI BROJ	UGOVOR				REALIZACIJA	
	NAZIV	INVESTITOR	IZVOĐAČ	VRIJEDNOST	UKUPNO	u 2023. g.
1	IMPLEMENTACIJA SVJETLOSNE I ZVUČNE SIGNALIZACIJE ZA SLIJEPA I SLABOVIDNA LICA NA SEMAFORIZIRANIM RASKRSNICAMA NA PODRUČJU OPĆINE NOVO SARAJEVO	OPĆINA NOVO SARAJEVO	STEP	80.373	66.475	3.990
2	NABAVKA I UGRADNJA KOTLA ZA GRIJANJE NA OBJEKTU JAVNA USTANOVA OŠ POFALIĆI	MINISTARSTVO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KS OPĆINA NOVO SARAJEVO JU OŠ POFALIĆI ZAVOD ZA IZGRADNJU KS	E+E+E+ENERGY	95.000	94.628	94.628
3	DODATNI RADOVI NA NABAVCI I UGRADNJI KOTLA ZA GRIJANJE U JU OŠ POFALIĆI			3.563	3.563	3.563
4	DJELIMIČNA REKONSTRUKCIJA PLAFONA U JU OŠ POFALIĆI		GALBOLS	68.913	67.699	67.699
5	DODATNI RADOVI	1.571		1.571	1.571	
6	IZGRADNJA PROSTORA ZA ODMOR I REKREACIJU U ul. VARAŽDINSKA	OPĆINA NOVO SARAJEVO	MIBRAL	699.998	682.103	217.542
7	SANACIJA POMOĆNOG STADIONA PORED SPORTSKE DVORANE GORAN ČENGIĆ	Ministarstvo kulture i sporta	BUCOMERC PEJKOM	683.225	662.242	43.510

8	DODATNI RADOVI	KS Općina Novo Sarajevo		91.999	69.286	69.286
9	UGRADNJA SIGURNOSNIH ODBOJNIH OGRADA NA PUTU R901 LOT2	DIREKCIJA ZA PUTEVE KS	SAKOM	215.640	132.610	4.253
10	IMPLEMENTACIJA UNAPREĐENJA SIGURNOSTI PRELASKA PJEŠAKA NA RASKRSNICI SAFETA HADŽIĆA - OLOVSKA	MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA	STEP	69.584	38.549	38.549
11	PRVA FAZA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA - VRTIĆA CICIBAN	UDRUŽENJE DAJTE NAM ŠANSU	DŽEKOS	577.828	667.001	667.001
12	ANEX I			89.173		
13	PRODUŽENJE ISKLJUČNIH TRAKA NA RASKRSNICI ULICA ZMAJA OD BOSNE I HAMDJE ČEMERLIĆA 8II TRANSVERZALA; PRAVAC CENTAR-ILIDŽA	DIREKCIJA ZA PUTEVE KS	KJKP "RAD"	20.368	12.453	12.453
14	PRODUŽENJE ISKLJUČNIH TRAKA NA RASKRSNICI ULICA ZMAJA OD BOSNE I HAMDJE ČEMERLIĆA 8II TRANSVERZALA; PRAVAC ILIDŽA - CENTAR			30.814	17.507	17.507
15	PRODUŽENJE ISKLJUČNIH TRAKA NA RASKRSNICI ULICA ZMAJA OD BOSNE I HAMDJE ČEMERLIĆA II TRANSVERZALA; PRAVAC CENTAR- ILIDŽA - CENTAR			15.879	15.781	15.781
16	ZAŠTITNA OGRADA NA TRAMV STAJALIŠTU OTOKA (SMJER ILIDŽA-GRAD)	MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA	STEP	4.422	4.422	4.422
<b>OPĆINA NOVO SARAJEVO UKUPNO:</b>				2.748.351	2.535.890	<b>1.261.754</b>

## OPĆINA STARI GRAD

REDNI BROJ	UGOVOR				REALIZACIJA	
	NAZIV	INVESTITOR	IZVOĐAČ	VRIJEDNOST	UKUPNO	u 2023. g.
1	IZGRADNJA SEPARATNE KANALIZACIONE MREŽE U DIJELOVIMA ULICA BARUTHANA OD BROJA 71 DO ULICE HLADIVODE BROJ 70, MZ MOŠĆANICA, OPĆINA STARI GRAD	OPĆINA STARI GRAD	MIBRAL	600.104	409.875	16.094
2	SANACIJA KLIZIŠTA NA LOKALITETU KRKA BROJ 11	OPĆINA STARI GRAD	OXA	139.916	139.911	139.911
3	REHABILITACIJA REGIONALNOG PUTA DARIVA - HREŠA - GRANICA ENTITETA (L=CCA 5km), DIONICA III: REZERVOAR NA BRUSULJAMA - DO KRAJA SANIRANOG DIJELA, L= CCA 225m	DIREKCIJA ZA PUTEVE KS	KJKP RAD	311.365	163.443	163.443
<b>OPĆINA STARI GRAD UKUPNO:</b>				1.051.386	713.229	<b>319.449</b>

## OPĆINA TRNOVO

REDNI BROJ	UGOVOR				REALIZACIJA	
	NAZIV	INVESTITOR	IZVOĐAČ	VRIJEDNOST	UKUPNO	u 2023. g.
1	PROJEKTOVANJE SKI LIFTOVA K1 I K2, RADOVI NA IZGRADNJI PRVE FAZE SKI LIFTA K1 PO SISTEMU PROJEKTUJ I IZGRADI "KLJUČ U RUKE"	KJP "ZOI 84" OCS	PPG DOPPELMAYR SEILBAHNEN MGBH	2.474.550	2.474.550	247.455
2	UREĐENJE SKIJAŠKIH STAZA	KJP "ZOI 84" OCS	MGBH	2.049.662	2.049.186	1.314.505
3	NABAVKA I POSTAVLJANJE SIGURNOSNIH MREŽA NA STAZAMA I TO: LOT 1- A MREŽE NA LOKACIJI NA STAZI OLIMPIJSKI SPUST OD MILEROVOG DO ŠUMSKOG SKOKA	KJP "ZOI 84" OCS	BULJAN CESTE MATIAS 2	148.995	148.892	9.375
4	NABAVKA I POSTAVLJANJE SIGURNOSNIH MREŽA NA STAZAMA I TO: LOT 2: MREŽE I OSTALA OPREMA POTREBNA NA ODRŽAVANJU BRZIH DISCIPLINA NA STAZI OLIMPIJSKI SPUST	KJP "ZOI 84" OCS	BULJAN CESTE MATIAS 2	134.932	131.671	0
5	UGRADNJA KABLOVA ZA MJERENJE VREMENA I VIDEO NADZOR	KJP "ZOI 84" OCS	STEP	280.519	273.139	18.982
6	IZGRADNJA SPORTSKOG POLIGONA- SNOW PARK BJELAŠNICA	KJP "ZOI 84" OCS	CITY TRANSPORT	378.269	360.208	88.933

7	REHABILITACIJA REGIONALNOG PUTA R442a HADŽIĆI - GORNJA GRKARICA - GRANICA ENTITETA, DIONICA : OD PRIKLJUČKA ZA TRNOVO, PENDIČIĆI, DEJČIĆI, LEDIĆI DO GRANICE ENTITETA, km 18+500 DO km 27+965, L=9.465km, - KNJIGA 1 I OSTATAK KNJIGA 2 - km 19+960 DO km 24+800, FAZA I: OD km 18+500 DO km 21+060	DIREKCIJA ZA PUTEVE KS	ORMAN	1.000.021	1.000.011	1.000.011
8	ČIŠĆENJE KORITA RIJEKA	OPĆINA TRNOVO	MILIŠIĆ - TRANS	99.929	99.835	99.835
<b>OPĆINA TRNOVO UKUPNO:</b>				6.566.877	6.537.491	<b>2.779.094</b>

## OPĆINA VOGOŠĆA

REDNI BROJ	UGOVOR				REALIZACIJA	
	NAZIV	INVESTITOR	IZVOĐAČ	VRIJEDNOST	UKUPNO	u 2023. g.
1	IZVOĐENJE PRIKLJUČAKA NA KANALIZACIONU MREŽU NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA, NASELJE GORNJA JOŠANICA I	OPĆINA VOGOŠĆA	KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA"	21.838	20.897	20.897



2	<b>REKONSTRUKCIJA KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA VODOVODNOJ MREŽI KAO I DIJELA MREŽE KAO I DIJELA MREŽE U ULICI BRAĆE PLANJA/OD SPOJA NOVOIZGRAĐENOG CJEVOVODA DO RASKRŠĆA S ULICOM OMLADINSKA, UKLJUČUJUĆI I PRELAZ PREKO NOVOIZGRAĐENOG MOSTA+ANEKS 1 UGOVORA</b>	OPĆINA VOGOŠĆA	KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA"	42.697	42.697	42.697
3	<b>REKONSTRUKCIJA DIJELA SAOBRAĆAJNICE U ULICI DONJI HOTONJ U UKUPNOJ DUŽINI OD cca 380 m, NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA</b>	OPĆINA VOGOŠĆA	AME	502.757	500.446	173.012
4	<b>IZVOĐENJE KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA KANALIZACIONOJ MREŽI NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA, NASELJE HOTONJ IV, ul.MITRA ŠUĆURA</b>	OPĆINA VOGOŠĆA	KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA"	25.969	22.419	22.419
5	<b>HITNE INTERVENCIJE NA OBJEKTIMA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA, ZA PERIOD 2022-2024. GOD UGOVOR 1</b>	OPĆINA VOGOŠĆA	AME	83.070	83.070	26.255
6	<b>HITNE INTERVENCIJE NA OBJEKTIMA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA, ZA PERIOD 2022-2024. GOD UGOVOR 2</b>			71.042	62.222	62.222
7	<b>SANACIJA LOKALNIH PUTEVA U ULICAMA: 31. JULA, EJUBA DELALIĆA, MITRA ŠUĆURA I BARICA, NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA</b>	OPĆINA VOGOŠĆA	AME	340.516	340.497	163.950

8	<b>SANACIJA LOKALNIH PUTEVA U ULICAMA:STARA CESTA- KAMENICA, VRANJAK, NOVA CESTA- SEMIZOVAC I KRIVOGLAVCI I I II, TE SANACIJA OŠTEĆENJA NA KOLOVOZU U ULICAMA GORA I KRIVOGLAVCI I, NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA</b>	OPĆINA VOGOŠĆA	AME	441.889	441.789	178.196
9	<b>SANACIJA LOKALNIH PUTEVA U ULICAMA: IGMANSKA, BLAGOVAC III, SKENDERA KULENOVIĆA,GRAB I DONJA JOŠANICA I, TE SANACIJA ROVA I OBORINSKE ODVOĐNJE U DIJELU ULICE GORNJA JOŠANICA II, NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA</b>	OPĆINA VOGOŠĆA	AME	438.750	438.731	88.192
10	<b>ZIMSKO ODRŽAVANJE LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA I TROTOARA, NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA U SEZONI 2022/2023. GODINE</b>	OPĆINA VOGOŠĆA	AME	447.172	242.852	155.049
11	<b>IZRADA KANALIZACIONIH SEPARATNIH PRIKLJUČAKA U UL. MITRA ŠUĆURA U2</b>	OPĆINA VOGOŠĆA	KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA"	15.311	13.698	13.698
12	<b>IZRADA KANALIZACIONIH SEPARATNIH PRIKLJUČAKA U UL. MITRA ŠUĆURA U3</b>	OPĆINA VOGOŠĆA	KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA"	10.266	9.345	9.345
13	<b>IZGRADNJA IGRALIŠTA NA LOKACIJI TRGA ŽRTAVA GENOCIDA U SREBRENICI</b>	OPĆINA VOGOŠĆA	BABEL	35.100	29.133	29.133
14	<b>SANACIJA VANJSKOG IGRALIŠTA PRI JU OŠ "ZAJKO DELIĆ", KOBILJA GLAVA</b>	OPĆINA VOGOŠĆA	BABEL	14.227	13.174	13.174

15	<b>IZGRADNJA SPOMEN OBILJEŽJA MALOLJETNIM BORCIMA ARMIJE BIH</b>	OPĆINA VOGOŠĆA	G.H.	69.243	69.243	69.243
16	<b>IZGRADNJA, IZMJEŠTANJE, UKLANJANJE I ODRŽAVANJE KONTEJNERSKIH NIŠA, NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA- UGOVOR IV</b>	OPĆINA VOGOŠĆA	TERMO-BETON	12.390	11.208	11.208
17	<b>IZGRADNJA I SANACIJA NADSTREŠNICA NA AUTOBIUSKIM STAJALIŠTIMA GORNJI HOTONJ</b>	OPĆINA VOGOŠĆA	VIZIJA	9.359	9.359	9.359
18	<b>ČIŠĆENJE KORITA RIJEKE LJUBINE -KRITIČNE TAČKE-I FAZA</b>	OPĆINA VOGOŠĆA	MEVLUDIN COMMERC	98.631	98.443	98.443
19	<b>IZGRADNJA SPOMEN OBILJEŽJA MALOLJETNIM BORCIMA ARMIJE BIH</b>	OPĆINA VOGOŠĆA	G.H.	69.243	69.243	69.243
20	<b>REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE U ULICAMA JOŠANIČKA, BRAĆE KRŠO I OMLADINSKA</b>	OPĆINA VOGOŠĆA	SES	57.330	57.329	57.329
21	<b>IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI I NADOGRAĐNJI JAVNE RASVJETE U NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA - UGOVOR II</b>	OPĆINA VOGOŠĆA	SES	50.397	50.278	50.278
22	<b>DODATNI RADOVI NA IZGRADNJI VODOVODNE I KANALIZACONE MREŽE U DIJELU ULICE ROSULJE</b>	OPĆINA VOGOŠĆA	TED INVEST	60.299	60.299	60.299

23	<b>IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U DIJELU ULICE BARICA</b>	OPĆINA VOGOŠĆA	TED INVEST	81.876	30.970	30.970
24	<b>UGRADNJA ZAMJENSKIH BAŠTENSKIH IVIČNJAKA U SKLOPU PROJEKTA REHABILITACIJE ULICE IZETA DELIĆA, OPĆINA VOGOŠĆA</b>	DIREKCIJA ZA PUTEVE KS	AME	13.514	13.514	13.514
25	<b>REDOVNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA, PJEŠAČKIH STAZA, TRGOVA, PLATOVA I PARKINGA, NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA, U 2023. GODINI - UGOVOR IV</b>	OPĆINA VOGOŠĆA	AME	176.050	147.323	147.323
26	<b>UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA NA NEOPHODNOJ NABAVCI I POSTAVLJANJU POSEBNIH OBJEKATA NA CESTI RADI SMANJENJA BRZINE KRETANJA VOZILA I PRATEĆE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE U ULICAMA: SVRAKE IV, LJUBINA, VOGOŠĆANSKIH ODREDA, BRANILACA HOTONJA I ŠIPSKA</b>	OPĆINA VOGOŠĆA	SACOM	23.779	22.929	22.929
27	<b>IZVOĐENJE RADOVA NA NEOPHODNOJ NABAVCI I POSTAVLJANJU POSEBNIH OBJEKATA NA CESTI RADI SMANJENJA BRZINE KRETANJA VOZILA, SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE, DEMONTAŽI I POSTAVLJANJU OPREME U ULICAMA MERZUKA FERIZA, GORNJA JOŠANICA II, SKENDERA KULENOVIĆA, KRIVOGLAVCI I MUJE ŠEJTE</b>			7.256	6.886	6.886
28	<b>IZVOĐENJE RADOVA NA POSTAVLJANJU SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE I OPREME U ULICAMA BRAĆE PLANJA, OMLADINSKA, MUJE ŠEJTE I MERZUKA FERIZA</b>			8.522	8.505	8.505

29	<b>POSTAVLJANJE ZAŠTITNE (SIGURNOSNE) OGRADE, PJEŠAČKE OGRADE, PREVENTIVNIH IZBOČINA I SAOBRAĆAJNIH OGLEDALA U ULICAMA: MUJE ŠEJTE, BRAĆE KRŠO, KARAVDIĆA SOKAK, JASMINA DŽINDE, RAVNE, BRANILACA HOTONJA, SVRAKE III, BLAGOVAC III I KENANA BRKANIĆA, NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA</b>			58.945	57.643	57.643
30	<b>SANACIJA PLATOVA KOD BR.26 I PJEŠAČKIH STAZA KOD BR.41-49 U ULICI BRAĆE KRŠO NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA</b>	OPĆINA VOGOŠĆA	AME	207.090	199.385	199.385
31	<b>POSTAVLJANJE PLOČA SA IMENIMA NA SPOMEN OBILJEŽJU CIVILNIH ŽRTAVA RATA</b>	OPĆINA VOGOŠĆA	GRBO KINGSTONES	21.426	21.426	21.426
32	<b>IZGRADNJA SPOMEN OBILJEŽJA UBIJENIM MJEŠTANIMA NA LOKALITETU TIHOVIĆI-GRAB</b>	OPĆINA VOGOŠĆA	GRBO KINGSTONES	15.003	15.003	15.003
33	<b>SANACIJA LOKALNIH PUTEVA U ULICAMA BLAGOVAC IV I GRAB (NASTAVAK)</b>	OPĆINA VOGOŠĆA	AME	204.677	203.192	203.192
34	<b>UCJEVLJENJE SUHOG POTOKA</b>	OPĆINA VOGOŠĆA	TELEFONGRADNJA	11.698	11.698	11.698
35	<b>DODATNI RADOVI NA OJAČANJU PODTLA, DRENIRANJU PODZEMNIH I TRETIRANJU POVRŠINSKIH VODA U UL. EJUBA DELALIĆA</b>	OPĆINA VOGOŠĆA	AME	50.005	50.005	50.005

36	HORTIKULTURNO UREĐENJE KRUŽNIH TOKOVA, JAVNIH ZELENIH POVRŠINA, MOSTOVA I NABAVKA METALNIH ULOŽAKA ZA POSTOJEĆE PARKOVSKKE KORPE	OPĆINA VOGOŠĆA	GREEN SERVIS	64.935	64.935	64.935
37	REDOVNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA, PJEŠAČKIH STAZA, TRGOVA, PLATOVA, PARKINGA NA PODRUČJU OP.VOGOŠĆA ZA PERIOD 2023-2025 GODINA	OPĆINA VOGOŠĆA	TELEFONGRADNJA OXA	125.462	70.677	70.677
38	ADAPTACIJA PROSTORIJA MZ SEMIZOVAC	OPĆINA VOGOŠĆA	RMK ENGINEERING	55.975	55.968	55.968
39	REGULACIJA RIJEKE LJUBINE NA DIONICI OD MOSTA GAREŽ DO MOSTA M18 SA SANACIJOM KLIZIŠTA -II FAZA	OPĆINA VOGOŠĆA	MEVLUDIN COMMERC	314.145	281.137	281.137
40	SANACIJA AUTOBUSKE NADSTREŠNICE U NASELJU KRIVOGLAVCI	OPĆINA VOGOŠĆA	VIZIJA	5.441	5.441	5.441
41	REKONSTRUKCIJA DJEČIJEG IGRALIŠTA - TRG ŽRTAVA GENOCIDA U SREBRENICI	OPĆINA VOGOŠĆA	GLOVIS	64.513	61.131	61.131
42	REKONSTRUKCIJA DJEČIJEG IGRALIŠTA U UL. REMZIJE VEJE	OPĆINA VOGOŠĆA	GLOVIS	31.005	31.005	31.005
43	SANACIJA POSLOVNIH PROSTORIJA U ul.. P.O. ZVIJEZDA br. 40 (I FAZA)	OPĆINA VOGOŠĆA	FADŽ-COMPANY	14.000	14.000	14.000
<b>OPĆINA VOGOŠĆA UKUPNO:</b>				4.472.812	4.059.147	<b>2.796.417</b>

## PROJEKTI NA PODRUČJU VIŠE OPĆINA

REDNI BROJ	UGOVOR				REALIZACIJA	
	NAZIV	INVESTITOR	IZVOĐAČ	VRIJEDNOST	UKUPNO	u 2023. g.
1	2. POJEDINAČNI UGOVOR ZA ODRŽAVANJE SEMAFORA U KANTONU SARAJEVO	MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA KS	STEP	480.455	269.427	50.678
2	REVITALIZACIJA KAMENIH OBALNIH ZIDOVA KORITA RIJEKE MILJACKE PJESKARENJEM	GRAD SARAJEVO	KLICO TRANS GRADNJA	129.988	129.988	72.696
3	REVITALIZACIJA KAMENIH OBALNIH ZIDOVA KORITA RIJEKE MILJACKE PJESKARENJEM	GRAD SARAJEVO	KLICO TRANS GRADNJA	99.988	99.988	99.988
4	ELIMINACIJA ARHITEKTONSKIH BARIJERA NA 2 JAVNA OBJEKTA U KS_KJKP "POKOP", LOKACIJA VLAKOVO I OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA", LOKACIJA STARI GRAD	UNDP	KOLINVEST	359.599	346.112	346.112
<b>PROJEKTI NA PODRUČJU VIŠE OPĆINA UKUPNO:</b>				1.070.029	845.515	<b>569.473</b>


## MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA - POTOČARI

REDNI BROJ	UGOVOR				REALIZACIJA	
	NAZIV	INVESTITOR	IZVOĐAČ	VRIJEDNOST	UKUPNO	u 2023. g.
1	OBNOVA DIJELA FASADE (PRIZEMLJE I SPRAT) I RAVNOG KROVA UPRAVNE ZGRADE U MEMORIJALNOM CENTRU SREBRENICA-POTOČARI	FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA	HUNES	647.496	647.496	647.496
2	REKONSTRUKCIJA I SANACIJA PASARELE	MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA - POTOČARI	METAL Z	91.502	91.502	91.502
<b>MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA - POTOČARI UKUPNO:</b>				738.997	738.997	<b>738.997</b>



<b>REKAPITULACIJA</b>				
<b>ZAVRŠENI UGOVORI U 2023.g.</b>				
<b>PODRUČJE REALIZACIJE</b>	<b>BROJ UGOVORA</b>	<b>VRIJEDNOSTI UGOVORA (KM)</b>	<b>REALIZACIJA (KM)</b>	
			<b>UKUPNO</b>	<b>u 2023. g.</b>
<b>OPĆINA CENTAR</b>	18	2.731.379	2.580.710	2.241.680
<b>OPĆINA HADŽIĆI</b>	16	4.308.663	3.936.107	1.194.780
<b>OPĆINA ILIJAŠ</b>	13	5.674.908	5.059.238	4.087.719
<b>OPĆINA ILIDŽA</b>	33	6.604.280	6.088.029	3.980.057
<b>OPĆINA NOVI GRAD</b>	5	1.823.124	1.750.352	846.407
<b>OPĆINA NOVO SARAJEVO</b>	16	2.748.351	2.535.890	1.261.754
<b>OPĆINA STARI GRAD</b>	3	1.051.386	713.229	319.449
<b>OPĆINA TRNOVO</b>	8	6.566.877	6.537.491	2.779.094
<b>OPĆINA VOGOŠĆA</b>	43	4.472.812	4.059.147	2.796.417
<b>PROJEKTI NA PODRUČJU VIŠE OPĆINA</b>	4	1.070.029	845.515	569.473
<b>MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA - POTOČARI</b>	2	738.997	738.997	738.997
<b>UKUPNO</b>	<b>161</b>	<b>37.790.807</b>	<b>34.844.704</b>	<b>20.815.827</b>


### UGOVORI ZAVRŠENI U 2023.godini

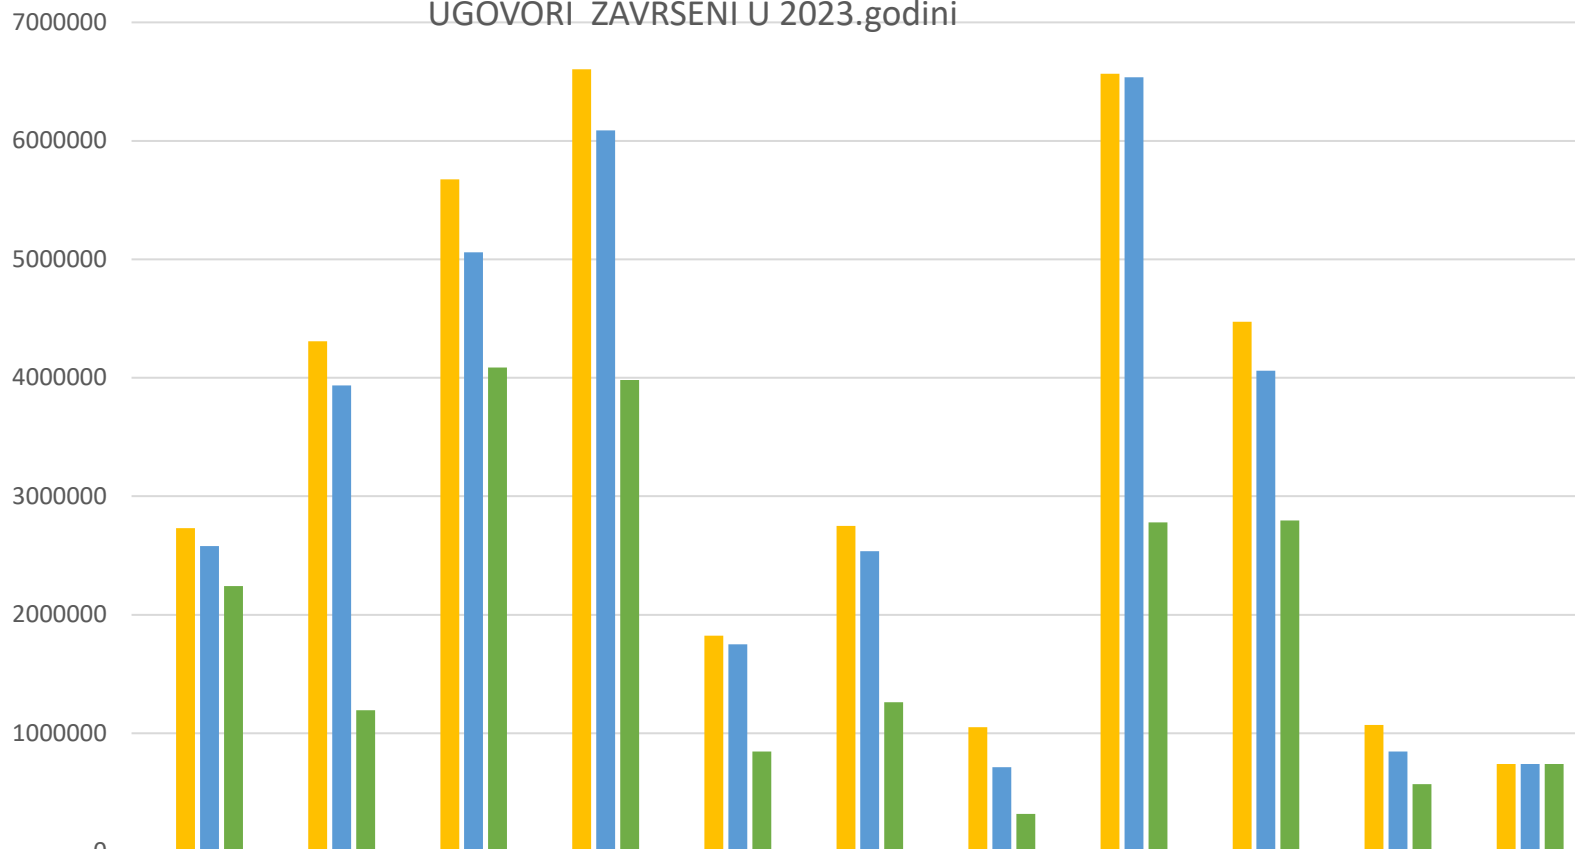


	OPĆINA CENTAR	OPĆINA HADŽIĆI	OPĆINA ILIJAŠ	OPĆINA ILIDŽA	OPĆINA NOVI GRAD	OPĆINA NOVO SARAJEVO	OPĆINA STARI GRAD	OPĆINA TRNOVO	OPĆINA VOGOŠĆA	PROJEKTI NA PODRUČJU VIŠE OPĆINA	MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA - POTOČARI
■ BROJ UGOVORA	18	16	13	33	5	16	3	8	43	4	2
■ UGOVORENO KM	2.731.379	4.308.663	5.674.908	6.604.280	1.823.124	2.748.351	1.051.386	6.566.877	4.472.812	1.070.029	738.997
■ UKUPNO REALIZOVANO KM	2.580.710	3.936.107	5.059.238	6.088.029	1.750.352	2.535.890	713.229	6.537.491	4.059.147	845.515	738.997
■ REALIZOVANO U 2023. KM	2.241.680	1.194.780	4.087.719	3.980.057	846.407	1.261.754	319.449	2.779.094	2.796.417	569.473	738.997

## SVEUKUPNA REKAPITULACIJA


PODRUČJE REALIZACIJE	BROJ UGOVORA	VRIJEDNOSTI UGOVORA	REALIZACIJA (KM)	
			UKUPNO	u 2023. g.
OPĆINA CENTAR	40	12.179.694	8.405.735	3.087.522
OPĆINA HADŽIĆI	30	9.593.355	6.422.118	2.664.921
OPĆINA ILIJAŠ	20	8.341.355	6.324.263	4.660.997
OPĆINA ILIDŽA	57	26.118.818	10.467.151	5.761.206
OPĆINA NOVI GRAD	35	19.680.373	7.088.341	5.456.691
OPĆINA NOVO SARAJEVO	23	6.446.322	4.321.356	2.852.672
OPĆINA STARI GRAD	17	4.997.628	2.636.594	767.978
OPĆINA TRNOVO	35	34.337.831	26.134.498	14.215.507
OPĆINA VOGOŠĆA	69	16.706.011	7.945.850	6.369.523
PROJEKTI NA PODRUČJU VIŠE OPĆINA	10	9.898.610	7.903.269	1.737.383
PRAČA	1	2.105.957	49.959	49.959
MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA - POTOČARI	3	1.954.246	738.997	738.997
<b>UKUPNO</b>	<b>340</b>	<b>152.360.199</b>	<b>88.438.130</b>	<b>48.363.357</b>

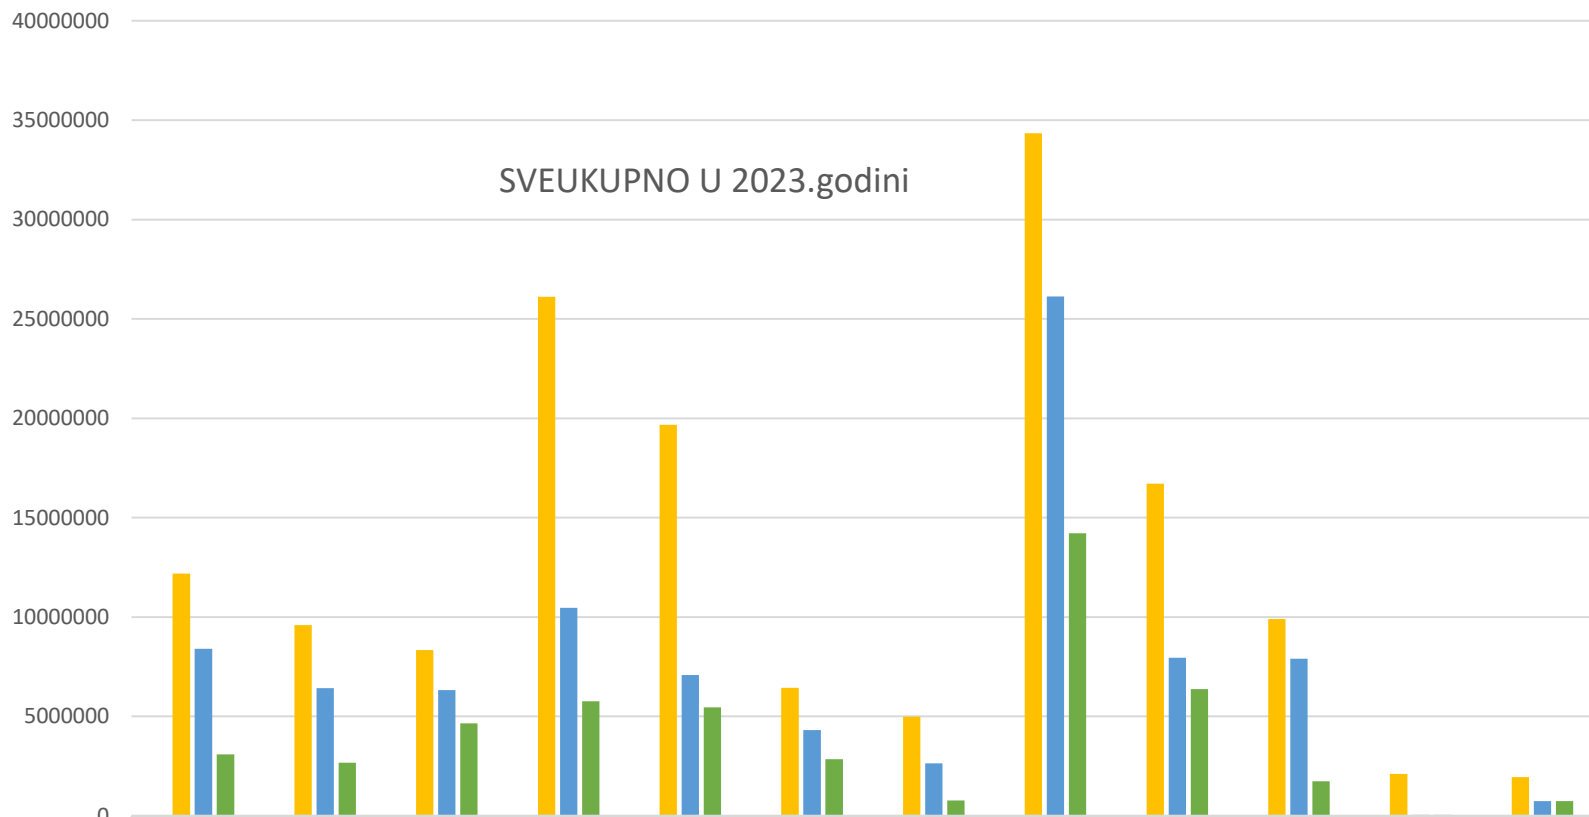

	OPĆINA CENTAR	OPĆINA HADŽIĆI	OPĆINA ILIJAŠ	OPĆINA ILIDŽA	OPĆINA NOVI GRAD	OPĆINA NOVO SARAJEVO	OPĆINA STARI GRAD	OPĆINA TRNOVO	OPĆINA VOGOŠĆA	PROJEKTI NA PODRUČJU VIŠE OPĆINA	PRAČA	MEMORIJA LNI CENTAR SREBRENIC A - POTOČARI
■ CROJ UGOVURA	40	30	20	57	35	23	17	35	69	10	1	3
■ UGOVORENO KM	12.179.694	9.593.355	8.341.355	26.118.818	19.680.373	6.446.322	4.997.628	34.337.831	16.706.011	9.898.610	2.105.957	1.954.246
■ UKUPNO REALIZOVANO KM	8.405.735	6.422.118	6.324.263	10.467.151	7.088.341	4.321.356	2.636.594	26.134.498	7.945.850	7.903.269	49.959	738.997
■ REALIZOVANO U 2023. KM	3.087.522	2.664.921	4.660.997	5.761.206	5.456.691	2.852.672	767.978	14.215.507	6.369.523	1.737.383	49.959	738.997

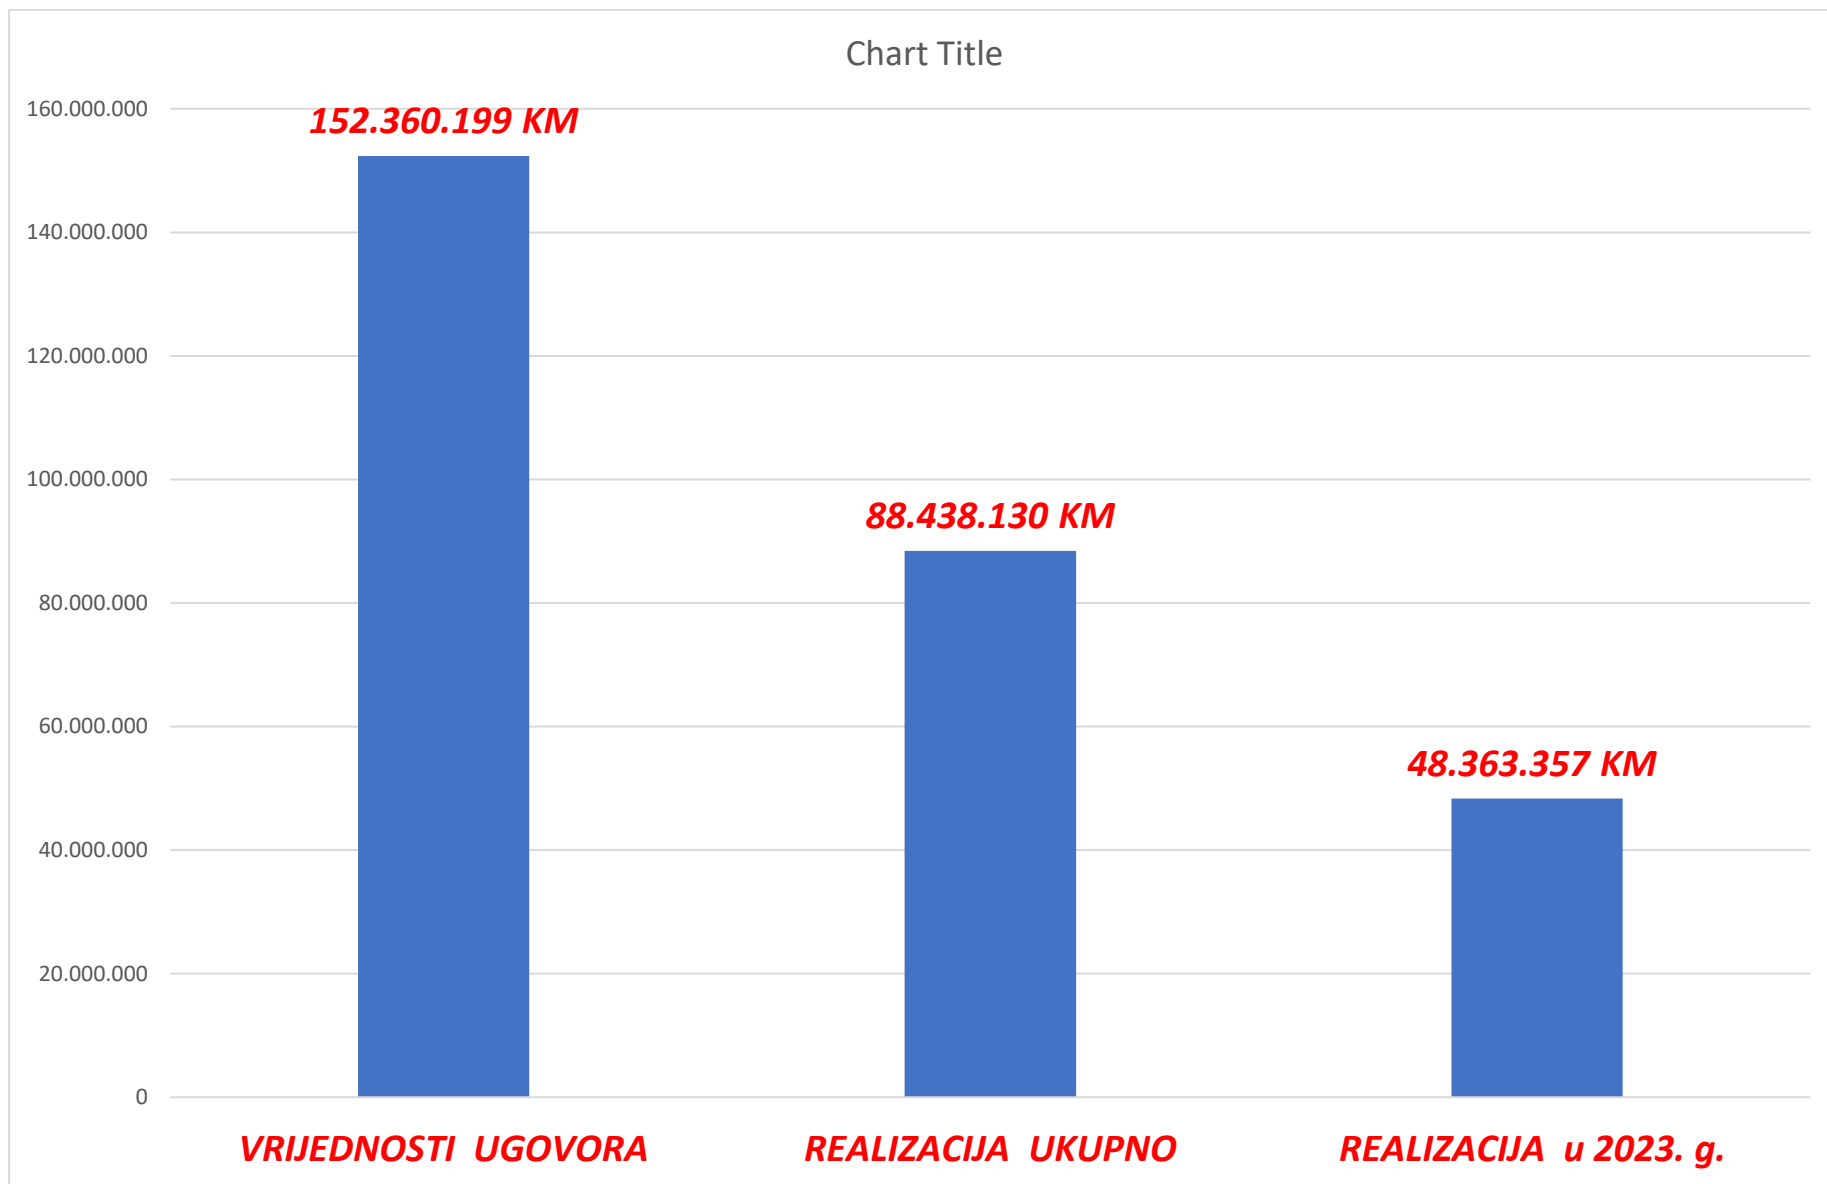

### REALIZACIJA (KM)

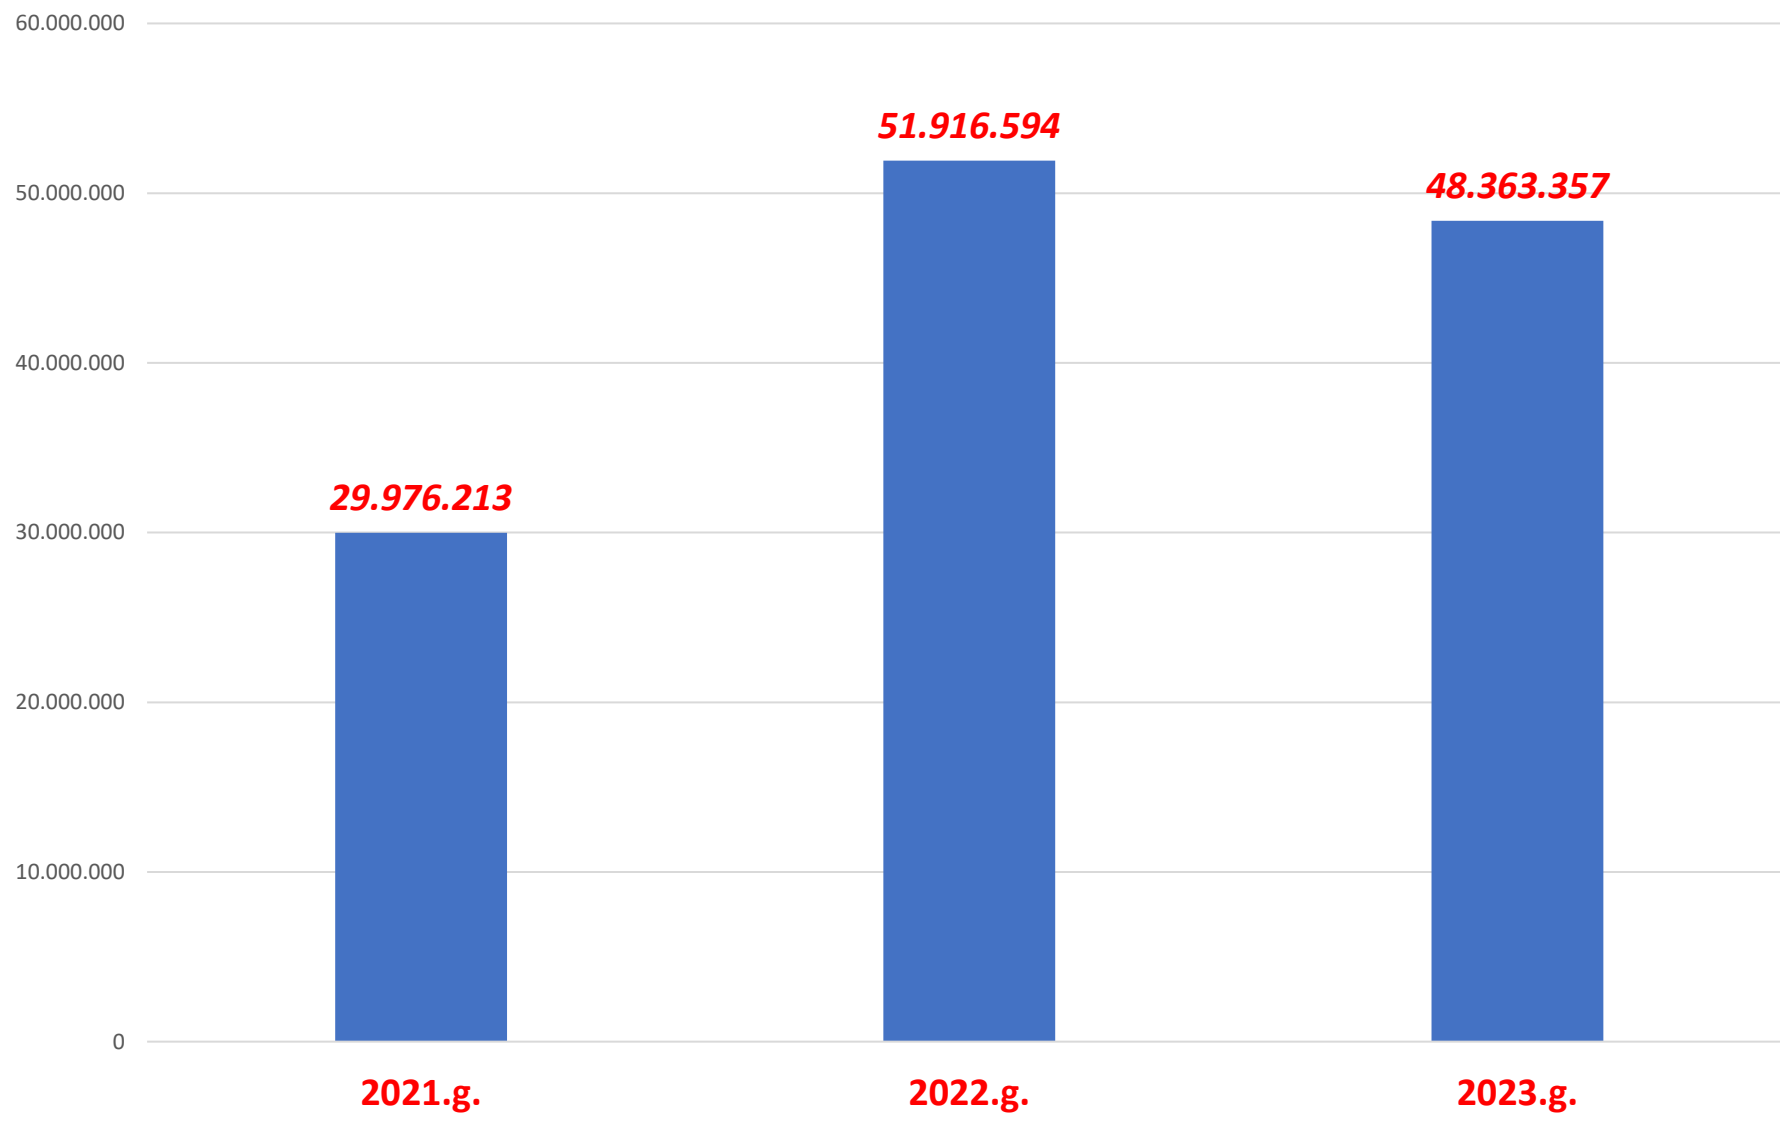

## V. VOĐENJE ANALOGNOG I DIGITALNOG KATASTRA KOMUNALNIH UREĐAJA

1. U 2023.godini u Sektoru za katastar komunalnih uređaja primljeno je 1 652 skice snimanja komunalnih instalacija: vodovodne, kanalizacione, elektroenergetske, telekomunikacione, toplovodne i gasovodne mreže u dužini od 135 656 metara prema tabelarnom prikazu.

KOMUNALNI UREĐAJ	SSKU Kom.	Razmjera 1:500	Razmjera 1:1000	Razmjera 1:2500	Razmjera 1:5000	UKUPNO
------------------	-----------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------

### UKUPNO PO INSTALACIJAMA

Vodovodna mreža	178	9 884	11 100	4 154	259	25 397
Kanalizaciona mreža	145	7 081	12 523	5 041	2 159	26 804
Elektroenergetska mreža	572	10 660	20 255	15 336	5 033	51 284
Telekomunikaciona mreža	173	5 856	3 499	3 797	293	13 445
Toplovodna mreža	2	180	24			204
Gasovodna mreža	582	4 229	11 915	2 353	25	18 522
<b>Ukupno po svim instalacijama</b>	<b>1652</b>	<b>37 890</b>	<b>59 316</b>	<b>30 681</b>	<b>7 769</b>	<b>135 656</b>

Za sve navedene komunalne uređaje izvršen je pregled skica snimanja komunalnih uređaja i izdata odgovarajuća saglasnost.

2. U digitalnoj bazi Sektora kao i kroz druge evidencije provedeno je ukupno 136 kilometara iz elaborata koji su pristigli u 2023. godini ili su preneseni iz 2022. godine.
3. Za projekte, procjenu lokacija, klizišta, urbanizam, energetska saglasnost, priključne instalacije za postojeće i novoizgrađene objekte, podneseno je i riješeno 1994 zahtjeva, odnosno 2322 lokaliteta. Izdato je 9023 kopija planova komunalnih uređaja koji su prethodno ažurirani za ovu svrhu pri čemu je izdato:
  - 6894 kopije plana formata A4,
  - 1136 kopije plana formata A3
  - 993 kopije plana formata A0

Na području Kantona Sarajevo na kojem ima 13 306 km podzemnih instalacija Sektor za katastar komunalnih uređaja u 2023. godini na održavanju katastra postigao je dnevnu ažurnost.

P R E G L E D									
stanja instalacija po SPP									
na dan 31.12.2023. godine									
(Kanton Sarajevo)									
KOMUNALNI UREDAJ	SSKU	L.D.	1 : 250	1 : 500	1 : 1 000	1 : 2 500	1 : 5 000	UKUPNO	
<b>1. ELEKTRIKA</b>									
Ostalo iz 2022 god.									
Primljeno u 2023 god.	580	691		11 200	20 377	15 336	6 074	52 987	m
Za provođenje	580	691		11 200	20 377	15 336	6 074	52 987	m
Provedeno u 2023 god.	572	675		10 660	20 255	15 336	5 033	51 284	m
Ostalo za 2024 god.	8	16		540	122		1 041	1 703	m
<b>2. GASOVOD</b>									
Ostalo iz 2022 god.	16	28		382		239		621	m
Primljeno u 2023 god.	574	633		3 847	12 309	2 114	25	18 295	m
Za provođenje	590	661		4 229	12 309	2 353	25	18 916	m
Provedeno u 2023 god.	582	652		4 229	11 915	2 353	25	18 522	m
Ostalo za 2024 god.	8	9				394		394	m
<b>3. KANALIZACIJA</b>									
Ostalo iz 2022 god.	1	1				89		89	m
Primljeno u 2023 god.	161	205		8 202	13 198	5 041	2 159	28 600	m
Za provođenje	162	206		8 202	13 287	5 041	2 159	28 689	m
Provedeno u 2023 god.	145	185		7 081	12 523	5 041	2 159	26 804	m
Ostalo za 2024 god.	17	21		1 121	764			1 885	m
<b>4. TELEFON</b>									
Ostalo iz 2022 god.	12	15		2 275	171			2 446	m
Primljeno u 2023 god.	161	197		3 581	3 328	3 797	293	10 999	m
Za provođenje	173	212		5 856	3 499	3 797	293	13 445	m
Provedeno u 2023 god.	173	212		5 856	3 499	3 797	293	13 445	m
Ostalo za 2024 god.									
<b>5. TOPLOVOD</b>									
Ostalo iz 2022 god.									
Primljeno u 2023 god.	2	2		180	24			204	m
Za provođenje	2	2		180	24			204	m
Provedeno u 2023 god.	2	2		180	24			204	m
Ostalo za 2024 god.									
<b>6. VODOVOD</b>									
Ostalo iz 2022 god.	4	5				583		583	m
Primljeno u 2023 god.	193	251		10 111	15 367	4 154	259	29 891	m
Za provođenje	197	256		10 111	15 950	4 154	259	30 474	m
Provedeno u 2023 god.	178	230		9 884	11 100	4 154	259	25 397	m
Ostalo za 2024 god.	19	26		227	4 850			5 077	m



UKUPNO									
Ostalo iz 2022 god.	33	49		2 657	843	239		3 739	m
Primljeno u 2023 god.	1 671	1 979		37 121	64 603	30 442	8 810	140 976	m
<b>Za provođenje</b>	<b>1 704</b>	<b>2 028</b>		<b>39 778</b>	<b>65 446</b>	<b>30 681</b>	<b>8 810</b>	<b>144 715</b>	<b>m</b>
<b>Provedeno u 2023 god.</b>	<b>1 652</b>	<b>1 956</b>		<b>37 890</b>	<b>59 316</b>	<b>30 681</b>	<b>7 769</b>	<b>135 656</b>	<b>m</b>
<b>Ostalo za 2024 god.</b>	<b>52</b>	<b>72</b>		<b>1 888</b>	<b>6 130</b>		<b>1 041</b>	<b>9 059</b>	<b>m</b>

KOMUNALNI UREĐAJ	SSKU	L.D.	1:250	1:500	1:1 000	1:2 500	1:5 000	UKUPNO	
<b>Ukupno po instalacijama</b>									
Elektrika	572	675		10 660	20 255	15 336	5 033	51 284	
Gasovod	582	652		4 229	11 915	2 353	25	18 522	
Kanalizacija	145	185		7 081	12 523	5 041	2 159	26 804	
Telefon	173	212		5 856	3 499	3 797	293	13 445	
Toplovod	2	2		180	24			204	
Vodovod	178	230		9 884	11 100	4 154	259	25 397	
Ukupno po svim izvođačima	1 652	1 956		37 890	59 316	30 681	7 769	<b>135 656</b>	m

U 2023.godinu pokrenuta je i planirana provedba postupka Javnih nabavki GIS revizija informacionog sistema Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo:

Pregled postojećeg GIS sistema Zavoda, uključujući: pregled uputa za korištenje i održavanje sistema, pregled podatkovnog modela sistema, pregled arhitekture sistema te korištenih tehnologija, pregled postojećih analiza sistema, ukoliko su takve analize dostupne, dopuna te po potrebi proširenje postojećih analiza, uključujući preglede i analizu dodatnih aplikacija s funkcionalnog, arhitektonskog i komercijalnog aspekta, uključujući pouzdanost i raspoloživost aplikacija, identifikaciju ključnih manjkavosti sistema, u segmentu funkcionalnosti, mogućnosti prikupljanja i obrade podataka/informacija, itd. analizu povezivanja i razmjene podataka s drugim relevantnim aplikacijama u segmentu procesne i poslovne informatike, analizu načina i troškova održavanja aplikacija, te mogućnost osiguranja dugoročnog održavanja postojećeg sistema, te razumijevanje dugoročne održivosti, otvorenosti, fleksibilnosti i upotrebljivosti Sistema.

## VI. IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo poslovanje obavlja putem trezorskog poslovanja i podračuna kod poslovnih banaka i to:

- Račun za uređenje građevinskog zemljišta
- Račun kapitalni projekti
- Račun naknade za dodjeljeno građevinsko zemljište-renta
- Račun legalizacije građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje

Zakonski budžet za 2023. godinu je iznosio 35.960.527,00 KM.

### RASHODI I IZDACI

Za period od 01.01. do 31.12.2023. godine rashodi i izdaci su iznosili 5.331.130,37 KM, što čini 14,82% od zakonskog budžeta 2023. godine.

U prilogu dajemo tabelarni pregled izvršenja rashoda i izdataka za period 01.01. do 31.12.2023. godine uporedo sa Budžetom Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2023. godinu, i izvršenjem budžeta Zavoda za period 01.01. do 31.12.2022. godine.

ZAVOD ZA IZGRADNJU KS	ZAKONSKI BUDŽET 2023. GODINU	IZVRŠENJE ZA 2023. GODINU	IZVRŠENJE ZA 2022. GODINU	% IZVRŠEN JA
	1	2	3	(2/1)
<b>I UKUPNO TEKUĆI IZDACI</b>	<b>4.306.684,00</b>	<b>3.272.600,32</b>	<b>2.668.341,28</b>	75,99%
<b>611000 Plaće i naknade zaposlenih</b>	<b>2.379.646,00</b>	<b>2.372.276,16</b>	<b>1.931.606,62</b>	99,69%
<i>611100 Bruto plaće i naknade</i>	2.060.635,00	2.060.634,22	1.686.181,14	100,00%
<i>611200 Naknade troškova zaposlenih</i>	319.011,00	311.641,94	245.425,48	97,69%
RAA001 Naknada troškova prevoza	40.500,00	39.519,86	35.200,63	97,58%
RAA002 Naknada za topli obrok	168.796,00	168.795,51	136.314,71	100,00%
RAA003 Naknada za regres za godišnji odmor	45.715,00	44.177,50	35.577,00	96,64%
RAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju	28.000,00	27.808,07	7.491,14	99,31%
RAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti	36.000,00	31.341,00	30.842,00	87,06%
<b>612000 Doprinosi poslodavca</b>	<b>220.045,00</b>	<b>220.044,46</b>	<b>182.118,95</b>	100,00%
<b>613000 Izdaci za materijal i usluge</b>	<b>1.706.993,00</b>	<b>680.279,70</b>	<b>554.615,71</b>	39,85%
<i>613100 Putni troškovi</i>	3.000,00	1.475,00	17.527,00	49,17%
<i>613200 Izdaci za energiju</i>	98.782,00	58.081,86	62.578,27	58,80%
<i>613300 Izdaci za komunalne usluge</i>	83.375,00	29.909,22	29.250,27	35,87%
<i>613400 Nabavka materijala</i>	36.500,00	26.585,22	26.204,35	72,84%
<i>613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva</i>	29.000,00	22.292,77	24.285,64	76,87%
<i>613600 Unajmljivanje imovine i opreme</i>	14.000,00	13.512,72	5.366,40	96,52%
<i>613700 Izdaci za tekuće održavanje</i>	<b>347.420,00</b>	<b>284.102,61</b>	<b>111.716,68</b>	81,77%
<i>000000 Izdaci za tekuće održavanje</i>	57.500,00	40.496,27	89.836,24	70,43%

<i>RAI001 Izdaci za tekuće održavanje- Uređenje grad. građ. zemljišta</i>	289.920,00	243.606,34	21.880,44	84,03%
<i>613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa</i>	22.195,00	6.330,18	11.205,89	28,52%
<i>613900 Ugovorene i druge posebne usluge</i>	<b>1.072.721,00</b>	<b>237.990,12</b>	<b>266.481,21</b>	22,19%
<i>613900 Ugovorene i druge posebne usluge</i>	238.986,00	195.401,01	125.164,85	81,76%
<i>RAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr. nepogoda</i>	6.695,00	6.694,37	5.561,31	99,99%
<i>RAK002 Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapoš. osoba sa invalid.</i>	100	0.00	0.00	0,00%
<i>RAK003 Ugovorene i dr. poseb. usluge- Uređenje grad. građ. zemljišta</i>	541.047,00	29.949,82	128.020,88	5,54%
<i>RAK004 Ugovorene i dr. poseb. Usluge- Projekti Kantona i općina</i>	285.893,00	5.944,92	7.734,17	2,08%
<b>II UKUPNO DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>4.659.383,00</b>	<b>35.109,66</b>	<b>128.360,19</b>	0,75%
<b>614000 Tekući transferi</b>	<b>4.659.383,00</b>	<b>35.109,66</b>	<b>128.360,19</b>	0,75%
<i>614800 Ostali transferi- povrat i drugo</i>	<b>4.659.383,00</b>	<b>35.109,66</b>	<b>128.360,19</b>	0,75%
<i>614800 Ostali transferi- povrat i drugo</i>	21.801,00	21.700,66	34.582,74	99,54%
<i>RAS001 Drugi tekući rashodi- Uređenje grad. građ. zemljišta</i>	4.465.531,00	12.560,40	84.569,05	0,28%
<i>RAS002 Drugi tekući rashodi- Naknada za pogodnost grad. građ. zemljišta</i>	19.947,00	183,00	0,00	0,92%
<i>RAS003 Drugi tekući rashodi- Posebna naknada za leg. građ.bez dozvole</i>	87.315,00	384,80	9.208,40	0,44%
<i>RAS004 Drugi tekući rashodi- Povrat pogrešno uplaćenih sredstava</i>	64.789,00	280,80	0,00	0,43%
<b>III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI</b>	<b>2.851.203,00</b>	<b>737.872,20</b>	<b>653.394,89</b>	25,88%
<b>615000 Kapitalni transferi</b>	<b>2.851.203,00</b>	<b>737.872,20</b>	<b>653.394,89</b>	25,88%
<i>615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlade</i>	2.851.203,00	737.872,20	653.394,89	25,88%
<i>RAI002 Kapitalni transferi- Uređenje grad. građ. zemljišta</i>	1.100.200,00	600.000,00	0	54,54%
<i>RAI003 Kapitalni transferi- Kapitalni projekti Kantona i općina</i>	560.320,00	137.872,20	427.394,89	24,61%
<i>RAI005 Kapitalni transferi- Posebna naknada za legalizaciju građevina privremenog karaktera</i>	1.190.683,00	0,00	226.000,00	0,00%
<i>615700 Kapitalni transferi međunarodnim organizacijama</i>	0	0,00	0	0,00%
<i>RAU001 Kapitalni transferi- Posebna naknada za legalizaciju građevina privremenog karaktera</i>	0	0,00	0	0,00%

<b>IV UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA</b>	<b>24.143.257,00</b>	<b>1.285.548,19</b>	<b>1.512.441,31</b>	5,32%
<b>821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>	<b>13.489.558,00</b>	<b>1.092.973,13</b>	<b>523.375,98</b>	8,10%
<b>821100 Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada</b>	<b>13.489.558,00</b>	<b>1.092.973,13</b>	<b>523.375,98</b>	8,10%
<i>RAX001 Nabavka zemljišta- Uređenje grad. građ. zemljišta</i>	8.891.358,00	8.612,03	421.375,98	0,10%
<i>RAX002 Nabavka zemljišta- Projekti Kantona i općina</i>	1.100.200,00	1.084.361,10	0,00	98,56%
<i>RAX003 Nabavka zemljišta- Rješavanje imov. pravnih poslova - Vodozaštitna zona</i>	3.498.000,00	0,00	102.000,00	0,00%
<b>821200 Nabavka građevina</b>	<b>300.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<i>RAX004 Nabavka građevina- Uređenje grad. građ. zemljišta</i>	200.000,00	0,00	0,00	0,00%
<i>RAX015 Nabavka građevina- Kapitalni projekti Kantona I općina</i>	100.100,00	0,00	0,00	0,00%
<b>821300 Nabavka opreme</b>	<b>551.758,00</b>	<b>141.055,20</b>	<b>144.330,11</b>	25,56%
<i>000000 Generalni</i>	140.600,00	134.058,60	144.330,11	95,35%
<i>RAX005 Nabavka opreme- Uređenje grad. građ. zemljišta</i>	311.058,00	6.996,60	0,00	2,25%
<i>RAX013 Nabavka opreme- Kapitalni projekti Kantona i općina</i>	100.100,00	0	0	0,00%
<b>821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava</b>	<b>2.098.040,00</b>	<b>51.519,86</b>	<b>79.211,26</b>	2,46%
<i>000000 Generalni</i>	17.600,00	16.520,48	15.118,54	93,87%
<i>RAX006 Nabavka stalnih sred. u obliku prava- Uređenje grad. građ. zemljišta</i>	1.108.712,00	6.961,50	44.448,30	0,63%
<i>RAX007 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava- Projekti Kantona i općina</i>	771.428,00	28.037,88	19.644,42	3,63%
<i>RAX008 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava- Posebna naknada za legalizaciju</i>	200.100,00	0,00	0,00	0,00%
<i>RAX009 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava- Dodijeljeno grad. građ. zemlj.</i>	200,00	0	0	0,00%
<b>821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje</b>	<b>7.703.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765.523,96</b>	0,00%
<i>RAX010 Investiciono održavanje- Naknada za uređenje grad. građ. zemljišta</i>	3.797.207,00	0,00	306.874,34	0,00%
<i>RAX011 Investiciono održavanje- Projekti Kantona i općina</i>	1.655.600,00	0,00	228.558,52	0,00%
<i>RAX012 Rekonstrukcija i invest. Održavanje- Posebna naknada za leg.</i>	1.800.894,00	0,00	230.091,10	0,00%
<i>RAX017 Rekonstrukcija i invest. Održavanje</i>	450.100,00	0,00	0,00	0,00%

<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>35.960.527,00</b>	<b>5.331.130,37</b>	<b>4.962.537,67</b>	<b>14,82%</b>
-----------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------

Iz prezentovane tabele uočljivo je da su tekući rashodi izvršeni u iznosu od 2.663.653,68 KM, odnosno 79,30% od planiranih tekućih rashoda. Tekući transferi su izvršeni u iznosu od 126.519,27 KM, odnosno 2,20 % od planiranih tekućih transfera. Kapitalni transferi su izvršeni u iznosu od 635.394,89 KM, odnosno 42,81% od planiranih. Izdaci za nabavku stalnih sredstava su iznosili 1.499.770,62 KM odnosno 6,61% od planiranog iznosa za 2023. godinu.

## **I TEKUĆI IZDACI**

### **➤ Plaće i naknade troškova zaposlenih**

Plaće i naknade troškova zaposlenih u periodu 01.01.do 31.12.2023. godine su iznosile 2.372.276,16 KM, odnosno, 99,69% od planiranih sredstava za 73 uposlenih.

Bruto plaće zaposlenih i naknade plaća iznosile su 2.060.634,22 KM, odnosno 100% planiranih sredstava u 2023. godini.

Naknade troškova zaposlenih iznosile su 311.641,94 KM, odnosno 97,69% planiranih sredstava za 2023. godinu.

Sa pozicije naknada zaposlenima u izvještajnom periodu izvršene su isplate:

- Naknade za prevoz s posla i na posao u iznosu 39.519,86 KM
- Naknade za topli obrok u iznosu 168.795,51 KM
- Regres za godišnji odmor 44.177,50 KM
- Otpremnina za odlazak u penziju 27.808,07 KM
- Pomoći u slučaju smrti i teže bolesti 31.341,00 KM.

### **➤ Doprinosi poslodavca**

Doprinosi poslodavca iznose 220.044,46 KM, što predstavlja 100% izvršenje planiranog za 2023. godinu.

### **➤ Izdaci za materijal i usluge**

Izdaci za materijal i usluge su u periodu od 01.01 do 31.12.2023. godine izvršeni su u iznosu od 680.279,70 KM, što predstavlja 39,85% planiranih.

Struktura izvršenih izdataka za materijal i usluge budžeta Zavoda za 2023. godinu je sljedeća:

- Putni troškovi 1.475,00 KM
- Izdaci za energiju 58.081,86 KM
- Izdaci za komunalne usluge 29.909,22 KM
- Nabavka materijala 26.585,22 KM
- Izdaci za usluge prevoza i goriva 22.292,77 KM
- Unajmljivanje imovine i opreme 13.512,72 KM
- Izdaci za tekuće održavanje 284.102,61 KM
- Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 6.330,18 KM
- Ugovorene i druge posebne usluge 237.990,12 KM

Najveća izdvajanja na teret izdataka za tekuće održavanje, osim redovnih troškova za obavljanje dnevnih aktivnosti, odnose se i na adaptaciju poslovnog prostora u ulici Hasana Sušića broj 27 – Breka, za potrebe arhive, sanacija ulice Branilaca Šipa u dužini 375 metara - I privremena situacija, kao i održavanje zamjenskih stanova. Što se tiče Ugovorenih i drugih posebnih usluga u 2023. godini angažovani su sudski vještaci za procjenu vrijednosti imovine u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih poslova (eksproprijacija), elaborati za zemljište i troškovi notara, advokata, te zatezne kamate po tužbama „Štampa P.T.T. d.o.o. Sarajevo (S-List d.o.o. Sarajevo) i troškovi advokata po tužbi od strane osobe Zijad Tiro, te analiza i rad IT stručnjaka sistema KKKU i Oracle baze, usluge čišćenja prostorija Zavoda kao i angažovanja fizičkih lica po osnovu ugovora o djelu.

## **II DRUGI TEKUĆI RASHODI**

Budžetom Zavoda za 2023. godinu za finansiranje tekućih transfera planirano je 4.659.383,00 KM, a u periodu 01.01. do 31.12.2023. godine, po ovom osnovu, izvršeno je 35.109,66 KM, odnosno 0,75 % planiranih sredstava. Drugi tekući rashodi su uključivali tužbe radnika za ostvarivanje prava iz radnih odnosa u iznosu od 19.700,69 KM, povrat sredstava po rješenjima za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata i objekata bez odobrenja za građenje, rente i izvršenje pravosnažnih sudskih presuda, glavnicu, troškovi postupka i zatezne kamate se odnose na presudu u korist „Štampa P.T.T. d.o.o Sarajevo (S-List d.o.o. Sarajevo), zatim vansudska nagodba Zijad Tiro (šteta koja je nastala isticanjem vode u stanu Trg ZAVNOBIH-a broj 8, troškovi postupka na ime Avdagić Ermin (Ugovor o naknadi za gradsko građevinsko zemljište u ulici Čobanija broj 2\_rekonstrukcija krova) i povrat sredstava – raskid ugovora JP Željeznice FBiH u ulici Avde Jabučice – potkrovlje, novčane kazne za prekršaje i žalbe – JN.

## **III KAPITALNI TRANSFERI**

Budžetom Zavoda za 2023. godinu kapitalni transferi su planirani u iznosu od 2.851.203,00 KM, a izvršeni su u periodu 01.01. do 31.12.2023. godine, u iznosu od 737.872,20 KM. Doznačena su sredstva Općinama na osnovu Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama pri realizaciji projekata sanacije i monitoringa klizišta, te za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa radi regulacije rijeke Željeznice (Ilidža) i Bosna (Novi Grad). Rekonstrukcija i investiciono održavanje su sanacija klizišta na području Općini po preuzetim obavezama iz ranijeg perioda.

## **IV IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA**

Budžetom Zavoda za 2023. godinu, izdaci za nabavku stalnih sredstava planirani su u iznosu od 24.143.257,00 KM, a u izvještajnom periodu izvršeni su u iznosu 1.285.548,19 KM, odnosno 5,32%.

### **➤ Izdaci za nabavku zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada**

Za nabavku zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada budžetom za 2023. godinu planirano je 13.489.558,00,00 KM, a izvršeno je 1.092.973,13 KM, odnosno 8,10%.

Pozicija nabavke zemljišta je terećena za rješavanje eksproprijacije zemljišta na lokalitetu A-transferzala i Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa - Otkup zemljišta na deponiji Smiljevići.

### **➤ Izdaci za nabavku opreme**

Planirana sredstva za nabavku opreme su iznosila 551.758,00 KM, dok je u 2023. godini izvršeno 141.055,20 KM, odnosno 25,56%.

Pomenuta sredstva se odnose na nabavku:

- Kancelarijskog i kuhinjskog namještaja,
- Motornih vozila,
- Računarske opreme,
- Klima uređaja.

➤ **Izdaci za nabavku stalnih sredstava u obliku prava**

Za nabavku sredstava u obliku prava u 2023. godini planirano je 2.098.040 KM, dok je izvršeno 51.519,86 KM, odnosno 2,46%.

Sredstva su utrošena za sljedeće programe:

- Izradu projekta za sanaciju grijanja sportske dvorane O.Š. Anex i izradu elaborata glavnog projekta za klizište Rafaela Gaona, Općina Novi Grad,
- Nadogradnja ESRI licenci Desktop Basic,
- Licence za servere (Synology),
- Licence za programski paket Pantheon.

## VII.KAPITALNI PROJEKTI

### 1.1 Realizacija kapitalnih investicija

Realizacija kapitalnih investicija je u pravilu neodvojiva od uređenja gradskog građevinskog zemljišta. U ovom Izvještaju daje se zajednički pregled rješavanja imovinsko pravnih poslova i realizacije kapitalnih investicija za 2023. godinu. Radi sagledavanja obima izvršenih poslova, potrebno je imati u vidu da su u realizaciji tih poslova angažirani državni službenici i namještenici na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, zatim na izradi projektnih zadataka, javnoj nabavci projekata, usluga, roba i radova za njihovu realizaciju, kao i pribavljanju urbanističke saglasnosti, građevinske i upotrebne dozvole, vođenje nadzora nad izgradnjom građevina i vršenjem drugih zahvata u prostoru. Pored navedenog, izvještaj o realizaciji kapitalnih investicija Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo prati se kroz finansije i računovodstvo, čime se osigurava ostvarivanje transparentnosti, zakonitosti i realno finansijsko izvještavanje od strane ovog Zavoda

**Tabela kapitalnih projekata**

<b>KAPITALNI PROJEKTI 2023.G.</b>	
<b>PRIBAVLJANJE INVESTICIONO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE</b>	
<b>SAOBRAĆAJNICE</b>	
1	IZGRADNJA KOLSKE SAOBRAĆAJNICE I OTVORENOG PARKING PROSTORA SA KOMPLETNOM INFRASTRUKTUROM U NASELJU ŠIP PREMA IT PARKU U SARAJEVU
<b>OBJEKTI VISOKOGRADNJE</b>	
1	OSNOVNA ŠKOLA "POFALIĆI" "PROJEKAT IZGRADNJE NOVOG OBJEKTA SA VANJSKIM UREĐENJEM
2	IZRADA IDEJNOG PROJEKTA ARHITEKTURE I IZVEDBENIH PROJEKATA SVIH FAZA OBJEKTA JU OŠ "ROSULJE" U VOGOŠĆI
3	JU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO REKONSTRUKCIJA I SANACIJA CENTRALNOG OBJEKTA JU "ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO"
4	PRIBAVLJANJE KORIGOVANOG I DOPUNJENOG GLAVNOG PROJEKTA SVIH FAZA VRTIĆA „LUŽANI“
5	IZRADA IZVEDBENIH PROJEKATA ZAMJENSKOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA U ULICI GRBAVIČKA PREMA UP "GRBAVIČKA", VANJSKOG UREĐENJA I PRIKLJUČAKA SVIH FAZA
6	PRIHVATILIŠTE ZA PROSJAKE I SKITNICE PRI KJP "GERONTOLOŠKI CENTAR" U NEDŽARIĆIMA, SARAJEVO



## KAPITALNI PROJEKTI

### NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

#### OBJEKTI VISOKOGRADNJE

R.br.	UGOVOR				REALIZOVAN O u 2023.g.	STATUS
	Naziv	Vrijednost	Investitor	Izvođač		
1	REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA PROSTORA ODJELJENJA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO	221,715	JU OPĆA BOLNICA	EKO- GRADNJA	91,364	NASTAVAK REALIZACIJE U 2024.g.
2	REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA PRIZEMNOG DIJELA OBJEKTA ZA POTREBE DNEVNE BOLNICE	321,142		GENERAL CONSTRUCTION	149,300	
3	ZAMJENA POSTOJEĆEG SISTEMA VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE JU OB "PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ"	349,919		CLIMA - TRADE	338,642	
4	GRAĐEVINSKI, GRAĐEVINSKO ZANATSKI I INSTALATERSKI RADOVI ZA REKONSTRUKCIJU OBJEKTA KOGENERACIJSKO POSTROJENJE U CENTAR ZA UPRAVLJANJE MEDICINSKIM OTPADOM	548,051	KCUS	KOLINVEST	109,923	
5	ADAPTACIJA I RENOVIRANJE ŠKOLSKE SALE JU I GIMNAZIJA SARAJEVO	117,585	JU PRVA GIMNAZIJA	GALBOS	77,714	
6	IZGRADNJA CENTRA ZA KOMUNALNE USLUGE REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE POSTOJEĆIH PROSTORA U OVJEKTU JU KSIRC ILIDZA MALA ALEJA 67	244,767	OPĆINA ILIDŽA	UNIGRADNJA	5,130	
7	ADAPTACIJA KUĆE SLOBODE U SKLOPU SK TUNEL D-B ( DOBRINJSKA STRANA)	1,040,344	JU FOND MEMORIJALA KS	CENTAR- HAN	838,966	
8	GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI NA DOGRADNJI POLICIJSKOG OBJEKTA PS NOVI GRAD ( PRVA FAZA)	526,870	MUP KS	ITC ZENICA	122,747	
9	TREĆA GIMNAZIJA RADOVI NA ELIMINACIJI ARHITEKTONSKIH BARIJERA	279,700	UNDP	SELA	10,237	
10	CENTAR ZA SOCIJALNI RAD RADOVI NA ELIMINACIJI ARHITEKTONSKIH BARIJERA	169,543	UNDP	SELA	64,535	

11	REKONSTRUKCIJA ZGRADE PIO U SVRHU FORMIRANJA CENTRA ZA ZDRAVO STARENJE	70,196	OPĆINA VOGOŠĆA	SELA	8,879
12	DOGRADNJA JU OŠ "ZAHID BARUČIJA" VOGOŠĆA	2,923,578	OPĆINA VOGOŠĆA	ITC ZENICA	209,162
13	IZGRADNJA ZIMOVNIKA U RZC PIONIRSKA DOLINA I ZOO VRT	807,795	KJKP "PARK"	DŽEKOS	740,496
14	REKONSTRUKCIJA TOPLOVODNIH INSTALACIJA GRIJANJA I KOTLOVNICE JU OŠ SREDNJE	94,987	OPĆINA ILIJAŠ	BRAĆA KARIĆ	94,957
15	REKONSTRUKCIJA I VANJSKO UREĐENJE O.Š. "6 MART" HADŽIĆI	175,041	OPĆINA HADŽIĆI	ZZ GROS- COMP	141,224
16	NABAVKA I UGRADNJA KOTLA ZA GRIJANJE NA OBJEKTU JU OŠ POFALIĆI	98,562	MINISTARSTVO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KS OPĆINA NOVO SARAJEVO	E+E+E-ENERGY	98,190
17	DJELIMIČNA REKONSTRUKCIJA PLAFONA U JU OŠ POFALIĆI	70,484		GALBOS	69,270
18	SANACIJA TERASE I DIJELA DVORIŠTA CENTRALNOG DIJELA OBJEKTA ZAVODA	28,794	JU ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVA KS	DINALSA	22,148
19	ZAMJENA LIFTOVA JU OB "PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ"	113,256	JU OPĆA BOLNICA	KA BEST	113,256
20	ZAMJENA POSTOJEĆEG SISTEMA VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE - OPĆA BOLNICA	349,919		KLIMA TRADE	338,642
21	UGRADNJA PUTNIČKOG LIFTA NA HIDRAULIČKI POGON U JU OSNOVNA ŠKOLA HADŽIĆI	70,142	OPĆINA HADŽIĆI	EURO PROST	70,142
22	ZAMJENA VANJSKE FASADNE STOLARIJE U ZGRADI TARČIN-UL. 27.JULA br 11	18,720	OPĆINA HADŽIĆI	MEGA-ROLL	18,720
23	SANACIJA TRAFOSTANICE "797 ORTOPEDIJA - DRUGA FAZA" U KRUGU UKC SARAJEVO	19,890	KCUS	DELING	19,890
24	SANACIJA TRAFOSTANICE925 - STARA HIRURGIJA	100,035			99,943

PROJEKTI (UGOVORI) ZAVRŠENI u 2023.g.

25	SANACIJA ILUMINACIJE FASADE NA OBJEKTU AKADEMIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI U SARAJEVU	77,322	OPĆINA CENTAR	SES	77,140
26	UGRADNJA RASVJETE U OBJEKTU EVROPSKA KUĆA KULTURE I NACIONALNIH MANJINA	158,045	OPĆINA CENTAR	SES	158,045
27	REKONSTRUKCIJA MOKRIH ČVORAOVA U OBJEKTU JU "PRVA OSNOVNA ŠKOLA"	168,554	OPĆINA ILIDŽA	ZZ GROS- COMP	161,637
28	ADAPTACIJA JAVNOG TOALETA NA PODRUČJU SPOMENIKA PRIRODE "VRELO BOSNE"	168,554	KJU ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA	ZZ GROS COMP	173,606
29	PRVA FAZA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA - VRTIČA CICIBAN	667,001	UDRUŽENJE DAJTE NAM ŠANSU	DŽEKOS	667,001
30	ADAPTACIJA PROSTORIJA MZ SEMIZOVAC	55,975	OPĆINA VOGOŠĆA	RMK ENGINEERING	55,968
31	SANACIJA POSLOVNIH PROSTORIJA U ul.. P.O. ZVIJEZDA br. 40 (I FAZA)	14,000	OPĆINA VOGOŠĆA	FADŽ-COMPANY	14,000
32	ELIMINACIJA ARHITEKTONSKIH BARIJERA NA 2 JAVNA OBJEKTA U KS_KJKP "POKOP", LOKACIJA VLAKOVO I OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA", LOKACIJA STARI GRAD	359,599	UNDP	KOLINVEST	346,112
33	REKONSTRUKCIJA I SANACIJA KABINETA BIOLOGIJE, HEMIJE I FIZIKE U JU PETA OSNOVNA ŠKOLA SOKOLOVIĆI	92,788	JU PETA OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA	INTERMING	74,475
<b>UKUPNO OBJEKTI VISOKOGRADNJE</b>		<b>10,522,872</b>			<b>5,581,463</b>

## SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

R.br.	UGOVOR				REALIZOVAN O u 2023.g.	STATUS
	Naziv	Vrijednost	Investitor	Izvođač		
1	SANACIJA ULICE BRANILACA ŠIPA U DUŽINI 375 M, OPĆINA CENTAR	99,441	ZAVOD ZA IZGRADNJU KS	OXA	93,822	NASTAVAK REALIZACIJE
2	NASTAVAK IZVOĐENJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI R445: IZRADA a.b. ZIDOVA; DIONICA: OD MOSTA NA RIJECI BOSNI U MALEŠIĆIMA DO SKRETANJA ZA BIOČU U STAROM ILIJAŠU; RASKRSNICA ZA BIOČU U STAROM ILIJAŠU	909,767	DIREKCIJA ZA PUTEVE KS	MGBH	710,929	

3	REKONSTRUKCIJA CESTE U NASELJU VRATUŠA	725,400	OPĆINA ILIJAŠ	OXA	197,959
4	REKONSTRUKCIJA IGMANSKE CESTE OD GLAVOGODINA DO OSMICA NA IGMANU	2,310,859	DIREKCIJA ZA PUTEVE KS	DEMUS	468,045
5	IZGRADNJA DIJELA XIII TRANSVERZALE - RASKRSNICE; ODNOSNO ISKLJUČNIH TRAKA ULICE DŽEMAL BIJEDIĆA (U OBA PRAVCA) SA PRELAZOM PREKO TRAMVAJSKE PRUGE	2,048,939	DIREKCIJA ZA PUTEVE KS	BOSMAN	125,082
6	REKONSTRUKCIJA PUTA U ULICI AHATOVIĆKA; DIONICA OD SPOJA AHATOVIĆKE ULICE SA DOBROŠEVIĆKOM ULICOM U DU	741,853	DIREKCIJA ZA PUTEVE KS	MGBH	566,430
7	IZGRADNJA KRUŽNE RASKRSNICE NA SPOJU ULICA DŽEMALA BIJEDIĆA, SRĐANA ALEKSIĆA I VELIKIH DRVETA	1,369,881	DIREKCIJA ZA PUTEVE KS, OPĆINA NOVI GRAD	MEVLUDIN COMMERC	537,231
8	REKONSTRUKCIJA A TRANSVERZALE (PRIKLJUČAK ULICA BRANISLAVA NUŠIĆA I HAJRUDINA ŠABANIJE NA A TRANSVERZALU)	582,603	OPĆINA NOVI GRAD MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA - DIREKCIJA ZA PUTEVE KS	ORMAN	429,284
9	REHABILITACIJA (SANACIJA) DIJELA ULICE LOŽIONIČKA U OPĆINI NOVO SARAJEVO, OD POVEZIVANJE NA KRAK NOVOPROJEKTOVANE KRUŽNE RASKRSNICE 8OSOVINA 4-LOŽIONIČKA) DO ULICE ZMAJA OD BOSNE U DUŽINI cca 400 m	1,160,626	DIREKCIJA ZA PUTEVE KS	STRABAG	452,235
10	REHABILITACIJA REGIONALNOG PUTA R442a HADŽIĆI - GORNJA GRKARICA - GRANICA ENTITETA, DIONICA : OD PRIKLJUČKA ZA TRNOVO, PENDIČIĆI, DEJČIĆI, LEDIĆI DO GRANICE ENTITETA, km 18+500 DO km 27+965, L=9.465km, - KNJIGA 1 I OSTATAK KNJIGA 2 - km 19+960 DO km 24+800, FAZA I: OD km 21+060 DO km 22+460	990,000	DIREKCIJA ZA PUTEVE KS	ORMAN	268,685
11	REKONSTRUKCIJA SAOBRAĆAJNICE U UL.SVRAKE IV-NASTAVAK U DUŽINI OD cca 110 m	303,522	OPĆINA VOGOŠĆA	AME	148,835
12	SANACIJA PUTEVA U ULICAMA: DONJA JOŠANICA I, BRANILACA HOTONJA I RAŠIDA BEŠLIJE, NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA	454,182	OPĆINA VOGOŠĆA	MGBH	362,172
13	SANACIJA PUTEVA U ULICAMA: DRESKOVAČA, BARICA, GORA (LJETOVIK) I PJEŠAČKE STAZE U UL.DONJA VOGOŠĆA, NA PODRUČJU OPĆINE DONJA VOGOŠĆA	389,550	OPĆINA VOGOŠĆA	AME	332,248

14	IZGRADNJA DIJELA SAOBRAĆAJNICE U NASELJU ROSULJE U DUŽINI OD cca 260 m	399,729	DIREKCIJA ZA PUTEVE KS OPĆINA VOGOŠĆA	AME	25,527
15	OBNAVLJANJE, ZAMJENA I OJAČANJE KOLOVOZA NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA - UGOVOR I	87,555	OPĆINA VOGOŠĆA	AME	59,464
16	ISKOP TVRDE STIJENE, KATEGORIJA 5, U ŠIROKOM OTKOPU, MAŠINSKI ISKOP, SA UTOVAROM I PREVOZOM NA STD 10 km, OD P26 DO P789 (0+402,84 do 1+507,67)	134,013	OPĆINA HADŽIĆI DIREKCIJA ZA PUTEVE KS	GRAKOP	133,744
17	REHABILITACIJI PUTA U NASELJU GRIVIĆI	542,302	OPĆINA HADŽIĆI DIREKCIJA ZA PUTEVE KS	MUŠINBEGOVIĆ GRADNJA	181,658
18	IZVOĐENJE PRVE FAZE RADOVA NA IZGRADNJI PUTA U MIŠEVIĆIMA OD P1 DO P22, L=574m UGOVOR I	693,655	OPĆINA HADŽIĆI DIREKCIJA ZA PUTEVE KS	GRAKOP	63,596
19	IZVOĐENJE DRUGE FAZE RADOVA NA IZGRADNJI PUTA U MIŠEVIĆIMA OD P22 DO P40, L=450m UGOVOR II	670,264			409,159
20	IZVOĐENJE PRVE FAZE RADOVA NA IZGRADNJI PUTA U MIŠEVIĆIMA OD P1 DO P22, L=574m UGOVOR I	693,655	OPĆINA HADŽIĆI DIREKCIJA ZA PUTEVE KS	GRAKOP	63,596
21	IZVOĐENJE DRUGE FAZE RADOVA NA IZGRADNJI PUTA U MIŠEVIĆIMA OD P22 DO P40, L=450m UGOVOR II	670,264			409,159
22	IZGRADNJA DIJELOVA SAOBRAĆAJNICA „1 i 4“ U PRIVREDNOJ ZONI HADŽIĆI	596,700	OPĆINA HADŽIĆI	ADO - TRANS	27,668
23	IZGRADNJA PUTNE KOMUNIKACIJE TRZANJ - ODŽAK, OPĆINA HADŽIĆI	285,821	DIREKCIJA ZA PUTEVE KS OPĆINA HADŽIĆI	BUCOMERC	37,561
24	REHABILITACIJA REGIONALNOG PUTA R444 POSTOJEĆIH TROTOARA I IZGRADNJA NOVIH TROTOARA, DIONICA: SPOJ SA R445 DO GRADNICE KANTONA (PREMA BREZI), FAZA I - OD P1 DO P23, L=700 m	666,666	DIREKCIJA ZA PUTEVE KS	CITAR PRODUKT	80,967
25	REHABILITACIJA REGIONALNOG PUTA R444 POSTOJEĆIH TROTOARA I IZGRADNJA NOVIH TROTOARA, DIONICA: SPOJ SA R445 DO GRANICE KANTONA (PREMA BREZI), FAZA II - OD P32 DO P65, L=700 m	637,515	OPĆINA ILIJAŠ		523,519
26	IZGRADNJA PUTNIH KOMUNIKACIJA U OBUHVATU IZ "LUKE"	304,785	OPĆINA ILIJAŠ	CITAR PRODUKT	268,878
27	RADOVI NA REHABILITACIJI PUTA U INDUSTRIJSKOJ ZONI "LUKA" SA FEKALNOM I OBORINSKOM ODVODNOM I REKONSTRUKCIJOM VODOVODNE MREŽE OD	342,810	OPĆINA ILIJAŠ	NISKOGRADNJA DURMIĆ	297,091

PROJEKTI (UGOVORI) ZAVRŠENI u 2023.g.

	<b>RASKRSNICE KOD FIRME "ILMEX" DO RASKRSNICE MLIN CCA 330m</b>				
28	<b>REKONSTRUKCIJA PUTA U IZ "ŽELJEZERA" SA OBORINSKOM ODVODNJOM</b>	230,490	OPĆINA ILIJAŠ	HALILOVIĆ	167,736
29	<b>IZGRADNJA KRUŽNE RASKRSNICE NA RASKRSNICI ULICA BUTMIRSKA CESTA - POLIGONSKA-AERODROMSKA</b>	406,566	DIREKCIJA ZA PUTEVE KS OPĆINA ILIDŽA	BETON FRESH	106,566
30	<b>IZGRADNJA KRUŽNE RASKRSNICE U OTEŠU</b>	211,139	OPĆINA ILIDŽA	MEVLUDIN COMMERC	210,701
31	<b>SANACIJA, REKONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE SAOBRAĆAJNICA DRUGOG REDA NA PODRUČJU OPĆINA ILIDŽA LOT 2</b>	131,253	OPĆINA ILIDŽA	DEMUS	113,776
32	<b>REHABILITACIJA ULICE ZENIK</b>	362,700	OPĆINA ILIDŽA	GP ING	351,740
33	<b>REKONSTRUKCIJA DIJELA SAOBRAĆAJNICE U ULICI DONJI HOTONJ U UKUPNOJ DUŽINI OD cca 380 m, NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA</b>	502,757	OPĆINA VOGOŠĆA	AME	173,012
34	<b>SANACIJA LOKALNIH PUTEVA U ULICAMA: 31. JULA, EJUBA DELALIĆA, MITRA ŠUĆURA I BARICA, NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA</b>	340,516	OPĆINA VOGOŠĆA	AME	163,950
35	<b>SANACIJA LOKALNIH PUTEVA U ULICAMA: STARA CESTA- KAMENICA, VRANJAK, NOVA CESTA-SEMIZOVAC I KRIVOGlavci I i II, TE SANACIJA OŠTEĆENJA NA KOLOVOZU U ULICAMA GORA I KRIVOGlavci I, NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA</b>	441,889	OPĆINA VOGOŠĆA	AME	178,196
36	<b>SANACIJA LOKALNIH PUTEVA U ULICAMA: IGMANSKA, BLAGOVAC III, SKENDERA KULENOVIĆA, GRAB I DONJA JOŠANICA I, TE SANACIJA ROVA I OBORINSKE ODVODNJE U DIJELU ULICE GORNJA JOŠANICA II, NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA</b>	438,750	OPĆINA VOGOŠĆA	AME	88,192
37	<b>SANACIJA LOKALNIH PUTEVA U ULICAMA BLAGOVAC IV I GRAB (nastavak)</b>	204,677	OPĆINA VOGOŠĆA	AME	203,192
38	<b>REHABILITACIJA DIJELA ULICE DŽEMALA BIJEDIĆA L= 410 M (DIONICA OD OBJEKTA „FIS“ DO SPOJA SA X TRANSFERZALOM)</b>	626,185	OPĆINA NOVI GRAD	ORMAN	461,279
39	<b>PRODUŽENJE ISKLJUČNIH TRAKA NA RASKRSNICI ULICA ZMAJA OD BOSNE I HAMDJE ČEMERLIĆA</b>	67,061	DIREKCIJA ZA PUTEVE KS	KJKP "RAD"	45,741

40	REHABILITACIJA REGIONALNOG PUTA DARIVA - HREŠA - GRANICA ENTITETA (L=CCA 5km), DIONICA III: REZERVOAR NA BRUSULJAMA - DO KRAJA SANIRANOG DIJELA, L= CCA 225m	311,365	DIREKCIJA ZA PUTEVE KS	KJKP "RAD"	163,443
41	REHABILITACIJA REGIONALNOG PUTA R442a HADŽIĆI - GORNJA GRKARICA - GRANICA ENTITETA, DIONICA : OD PRIKLJUČKA ZA TRNOVO, PENDIČIĆI, DEJČIĆI, LEDIĆI DO GRANICE ENTITETA, km 18+500 DO km 27+965, L=9.465km, - KNJIGA 1 I OSTATAK KNJIGA 2 - km 19+960 DO km 24+800, FAZA I: OD km 18+500 DO km 21+060	1,000,021	DIREKCIJA ZA PUTEVE KS	ORMAN	1,000,011
<b>UKUPNO SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA</b>		24,087,727			<b>10,702,078</b>

## VODOVOD I KANALIZACIJA

R.br.	UGOVOR				REALIZOVANO u 2023.g.	STATUS
	Naziv	Vrijednost	Investitor	Izvođač		
1	IZGRADNJA VODOVODNOG SISTEMA ZA GORNJI DIO NASELJA BARE, OPĆINA HADŽIĆI	766,386	OPĆINA HADŽIĆI	TED INVEST TELEFONGRADNJA	270,901	NASTAVAK REALIZACIJE U 2024.g.
2	IZGRADNJA VODOVA FEKALNOG KOLEKTORA NA PODRUČJU OPĆINE HADŽIĆI TE SPAJANJE NA GLAVNI KOLEKTOR	507,917	OPĆINA HADŽIĆI	JKP KOMUNALAC	202,270	
3	IZVOĐENJE RADOVA NA POVEĆANJU KAPACITETA PITKE VODE U VODOSNABDIJEVANJU SISTEMA IZVORIŠTA "JAZIĆ"	176,436	OPĆINA ILIJAŠ	MIBRAL	157,929	
4	IZGRADNJA PUMPNE STANICE BLAŽUJ DOVODNOG I DIJELA POTISNOG CJEVOVODA I MULJNOG ISPUSTA	431,730	OPĆINA ILIDŽA	TED INVEST	165,975	
5	IZGRADNJA SEPARATNE KANALIZACIONE MREŽE U NASELJU BUTMIR, I FAZA	2,037,474	OPĆINA ILIDŽA	BUJICE	1,041,044	
6	REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE PROFILA DN100 I DN150 U AHATOVIĆIMA UGOVOR 1	462,150	OPĆINA NOVI GRAD	HARYSKO INSTEL	194,091	
7	IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U ULICI FERIDA SRNJE	499,133	OPĆINA NOVI GRAD	TED INVEST ORMAN	236,515	
8	IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U ULICI 14.JUNI	534,321	OPĆINA NOVI GRAD	HIDROM	181,385	

9	IZGRADNJA VODOVODNE DISTRIBUTIVNE MREŽE U ULICI BUTILSKA	831,198	OPĆINA NOVI GRAD	MANJO	416,201
10	ISKOP ROVA RADI POLAGANJA CJEVOVODA DN 700 mm	93,358	OPĆINA NOVI GRAD DIREKCIJA ZA PUTEVE KS	MEVLUDIN COMMERC	74,203
11	IZGRADNJA KANALIZACIONE I VODOVODNE MREŽE U ULICI PETRA SINANA ŠAINA	922,428	OPĆINA NOVO SARAJEVO	MIBRAL	539,000
12	IZGRADNJA MREŽE ZA ODVODNJU FEKALNIH VODA OBJEKATA LOCIRANOG UZ DOLAZNU STANICU TREBEVIČKE ŽIČARE	1,474,160	GRAD SARAJEVO	MIBRAL	183,391
13	IZGRADNJA CENTRALNOG VODOVODA MZ TRNOVO	619,924	OPĆINA TRNOVO	BUJICE	305,225
14	IZGRADNJA VODOVODA PANDURICA - PROSKOK	989,318	OPĆINA TRNOVO	HYDRA	403,750
15	IZVOĐENJE KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA VODOVODNOJ MREŽI I POLAGANJU DN100 mm U ULICI KRIVOGLAVCI	118,533	OPĆINA VOGOŠĆA	KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA"	50,145
16	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE U NASELJU DONJI HOTONJ, POTEZ DŽAMIJA -SRC SPORTA HOTONJ - FAZA II	459,524	OPĆINA VOGOŠĆA	HIDROM	114,034
17	IZGRADNJA KIŠNE I FEKALNE KANALIZACIJE U NASELJU HOTONJ IV SA OBNOVOM ASFALJNIH POVRŠINA NAKON IZVEDENIH RADOVA	637,618	OPĆINA VOGOŠĆA	BUJICE	424,835
18	VODOSNABDIJEVANJE NASELJA POTUROVIĆI I LJUBINA NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA - I FAZA	919,177	OPĆINA VOGOŠĆA I KJKP VIK	UNIONINVEST	265,878
19	VODOSNABDIJEVANJE GORNJIH ZONA NASELJA KRIVOGLAVCI I SVRAKE-I FAZA	983,970	OPĆINA VOGOŠĆA	MIBRAL	506,702
20	VODOSNABDIJEVANJE GORNJIH ZONA NASELJA KRIVOGLAVCI I SVRAKE U OPĆINI VOGOŠĆA - III FAZA	972,373	OPĆINA VOGOŠĆA	HARYSKO INSTEL	299,073
21	VODOSNABDIJEVANJE NASELJA POTUROVIĆI I LJUBINA NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA - II FAZA CJEVOVOD	687,107	OPĆINA VOGOŠĆA	TED INVEST	164,794
22	NABAVKA I UGRADNJA PREPUMPNE STANICE ZA FEKALNE VODE U OBUHVATU TURISTIČKOG KOMPLEKSA RAWASI	40,850	OPĆINA HADŽIĆI	TOP TIM TRI	4,085
23	REKONSTRUKCIJA VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE U ULICI KRANJČEVIĆEVA II	908,600	KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA"	MIBRAL	456,958

PROJEKT



24	IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI PRIMARNOG GRADSKOG VODOVODA U NASELJU BIOČA	324,675	OPĆINA ILIJAŠ	FAZUM GRADNJA	310,700
25	IZGRADNJA DIJELA FEKALNE I OBORINSKE KANALIZACIONE MREŽE U DIJELU OBUHVATA RP BANOVAČ	712,004	OPĆINA ILIJAŠ	TED INVEST	678,543
26	IZGRADNJA SEPARATNE KANALIZACIONE MREŽE U OBUHVATU ULICA HENDEKUŠA I OSIK	817,004	OPĆINA ILIDŽA	MANJO	458,949
27	ODVODNJA I ZATRPAVANJE KANALA KOJI VODI DO RIJEKE DOBRINJE	90,581	PD BUTMIR	MEVLUDIN COMMERC	86,860
28	IZGRADNJA PRIMARNE KANALIZACIONE MREŽE U PODRUČJU ULICE SAFETA ZAJKE I KURTA SCHORKA KROZ POSLOVNE ZONE BAČIĆI I DONJE TELALOVO POLJE	801,943	OPĆINA NOVI GRAD	MANJO	14,220
29	IZGRADNJA SEPARATNE KANALIZACIONE MREŽE U DIJELOVIMA ULICA BARUTHANA OD BROJA 71 DO ULICE HLADIVODE BROJ 70, OPĆINA STARI GRAD	600,104	OPĆINA STARI GRAD	MIBRAL	16,094
30	IZVOĐENJE PRIKLJUČAKA NA KANALIZACIONU MREŽU NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA	118,649	OPĆINA VOGOŠĆA	KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA"	109,056
31	DODATNI RADOVI NA IZGRADNJI VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE U DIJELU ULICE ROSULJE	60,299	OPĆINA VOGOŠĆA	TED INVEST	60,299
32	IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U DIJELU ULICE BARICA	81,876	OPĆINA VOGOŠĆA	TED INVEST	30,970
<b>UKUPNO VODOVOD I KANALIZACIJA</b>		<b>19,680,820</b>			<b>8,424,076</b>

## REGULACIJA VODOTOKA

R.br.	UGOVOR				REALIZOVAN O u 2023.g.	STATUS
	Naziv	Vrijednost	Investitor	Izvođač		
1	REGULACIJA RIJEKE ZUJEVINE - NASTAVAK	467,756	OPĆINA HADŽIĆI	MUSIĆ COMPANY BOSMAN	227,412	NASTAVAK
2	REGULACIJA RIJEKE ZUJEVINE U INDUSTRIJSKOJ ZONI- BOCE BINJEŽEVO	342,556	OPĆINA HADŽIĆI	MUSIĆ COMPANY BOSMAN	104,329	

3	HITNE INTERVENCIJE NA ČIŠĆENJU I UREĐENJU RIJEČNIH KORITA	173,541	OPĆINA HADŽIĆI	OD "POGLED"	20,604
4	HITNE INTERVENCIJE NA VODOTOCIMA II KATEGORIJE	68,477	OPĆINA ILIJAŠ	NISKOGRADNJA DURMIĆ	56,295
5	UREĐENJE KORITA RIJEKE, Lot 3. UREĐENJE KORITA KRSINJE U GRAČANICI, DUŽINE L=35m	99,968	OPĆINA TRNOVO	MGBH	54,785
6	TRAJNA REGULACIJA RIJEKE VOGOŠĆE NA DIONICI OD PROFILA P17 DO IZVEDENE REGULACIJE - II FAZA	328,758	OPĆINA VOGOŠĆA	TERMO-BETON	277,015
7	IZMJESTANJE REGULACIJE RIJEKE ZUJEVINE OD UŠĆA ŽUNOVAČKOG POTOKA DO PROFILA P5 U HADŽIĆIMA	347,490	OPĆINA HADŽIĆI	KONZORCIJ MUSIĆ COMPANY BOSMAN	45,857
8	IZVOĐENJE RADOVA NA REGULACIJI VODOTOKA POTOKA GNIONICA OD P0 DO P6	497,583	OPĆINA ILIJAŠ	ŠPIC BETON	157,787
9	ČIŠĆENJE KORITA RIJEKE MILJACKE OD BJEKTA FIS U HALILOVIĆIMA DO RTV DOMA	299,996	MINISTARSTVO PRIVREDE KS, OPĆINA NOVI GRAD, ZAVOD ZA IZGRADNJU KS	HARYSCO HL GRADNJA	299,987
10	ČIŠĆENJE KORITA RIJEKA	99,929	OPĆINA TRNOVO	MILIŠIĆ - TRANS	99,835
11	ČIŠĆENJE KORITA RIJEKE LJUBINE -KRITIČNE TAČKE-I FAZA	98,631	OPĆINA VOGOŠĆA	MEVLUDIN COMMERC	98,443
12	UCJEVLJENJE SUHOG POTOKA	11,698	OPĆINA VOGOŠĆA	TELEFONGRADNJA A	11,698
13	REGULACIJA RIJEKE LJUBINE NA DIONICI OD MOSTA GAREŽ DO MOSTA M18 SA SANACIJOM KLIZIŠTA -II FAZA	314,145	OPĆINA VOGOŠĆA	MEVLUDIN COMMERC	281,137
14	REVITALIZACIJA KAMENIH OBALNIH ZIDOVA KORITA RIJEKE MILJACKE PJSKARENJEM	229,975	GRAD SARAJEVO	KLICO TRANS GRADNJA	155,155
<b>UKUPNO REGULACIJA VODOTOKA</b>		<b>3,380,504</b>			<b>1,890,339</b>

PROJEKTI (UGOVORI) ZAVRŠENI U 2023.g.

## SANACIJA KLIZIŠTA

R.br.	UGOVOR				REALIZOVAN O u 2023.g.	STATUS
	Naziv	Vrijednost	Investitor	Izvođač		
1	IZRADA DOPUNE ELABORATA O INŽENJERSKOGEOLOŠKIM KARAKTERISTIKAMA TERENA ZA POTREBE RP SOUKBUNAR,	55,961	ZAVOD ZA IZGRADNJU KS	WINNER PROJECT	35,673	NASTAVAK REALIZACIJE U 2024.g.
2	IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI PADINE NA LOKALITETU HAKIJE KULENOVIĆA (FAZA I I II)	1,431,471	OPĆINA CENTAR ZAVOD ZA IZGRADNJU KS	MIBRAL	2,539	
3	SANACIJA KLIZIŠTA NA LOKALITETU HUM - KLIZIŠTE K4	884,848	OPĆINA NOVO SARAJEVO	MIBRAL	524,911	
4	SANACIJA KLIZIŠTA NA LOKALITETU SVRAKE IV-UGOVOR I	351,736	ZAVOD ZA IZGRADNJU KS, KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE KS, OPĆINA VOGOŠĆA	TERMOBETON	34,974	
5	IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI KLIZIŠTA NA LOKALITETU GAJ-MOKRINE (LOT 1)	67,155	OPĆINA HADŽIĆI	OD "POGLED"	3,251	PROJEKTI (UGOVORI) ZAVRŠENI u 2023.g.
6	SANACIJA KLIZIŠTA U NASELJU ALIĆA GAJ, MZ ILIJAŠ GRAD LOT -2	266,350	OPĆINA ILIJAŠ	SARAJEVO PUTEVI MGBH BILAL	120,042	
7	SANACIJA KLIZIŠTA NA LOKALITETU KRKA BROJ 11	139,916	OPĆINA STARI GRAD	OXA	139,911	
<b>UKUPNO SANACIJA KLIZIŠTA</b>		<b>3,197,437</b>			<b>861,300</b>	
<b>JAVNA RASVJETA</b>						
R.br.	UGOVOR				REALIZOVAN O u 2023.g.	STAT

	<i>Naziv</i>	<i>Vrijednost</i>	<i>Investitor</i>	<i>Izvođač</i>		
1	IZGRADNJA RASVJETE U PRIVREDNOJ ZONI HADŽIĆI	213,371	OPĆINA HADŽIĆI	SES	88,016	NASTAVAK REALIZACIJE
2	REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE U VELIKOJ ALEJI	163,776	OPĆINA ILIDŽA	NEXEN	129,744	PROJEKTI (UGOVORI) ZAVRŠENI u 2023.g.
3	REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠČA	107,727	OPĆINA VOGOŠČA	SES	107,607	PROJEKTI (UGOVORI) ZAVRŠENI u 2023.g.
<b>UKUPNO JAVNA RASVJETA</b>		<b>484,874</b>			<b>325,367</b>	

## GROBLJE VLAKOVO

R.br.	UGOVOR				REALIZOVAN O u 2023.g.	STATUS
	<i>Naziv</i>	<i>Vrijednost</i>	<i>Investitor</i>	<i>Izvođač</i>		
1	PROŠIRENJE GROBLJA VLAKOVO IV FAZA	223,546	KJKP "POKOP"	ADO - TRANS	109,617	NASTAVAK REALIZACIJE
2	RADOVI NA PROŠIRENJU ALEJE VETERANA	988,617	KJKP „POKOP“	DEMUS	292,331	PROJEKTI (UGOVORI) ZAVRŠENI u 2023.g.
3	RADOVI NA PROŠIRENJU ALEJE VETERANA Ila FAZA	839,788	KJKP "POKOP"	EKO TEH	749,555	PROJEKTI (UGOVORI) ZAVRŠENI u 2023.g.
<b>UKUPNO GROBLJE VLAKOVO</b>		<b>2,051,951</b>			<b>1,151,504</b>	

## RCUO SMILJEVIĆI

R.br.	UGOVOR				REALIZOVAN O u 2023.g.	STATUS
	<i>Naziv</i>	<i>Vrijednost</i>	<i>Investitor</i>	<i>Izvođač</i>		

1	IZGRADNJA CJEVOVODA ZA PRIKUPLJANJE I PRIHVAT PROCJEDNIH VODA SA CENTRALNOG DIJELA ODLAGALIŠTA NA DEPONJI "SMILJEVIĆI" U SARAJEVU	138,668	MINISTARSTVO KOMUNALNE PRIVREDE, INFRASTRUKTURE, PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA, KJKP RAD	GRAKOP	16,682	NASTAVAK REALIZACIJE U
2	SANACIJA KLIZIŠTA UZ INTERNU SAOBRAĆAJNICU KOD PLATO A ZA INTERNI OTPAD NA DEPONJI "SMILJEVIĆI"	95,000		GRAKOP	70,920	PROJEKTI (UGOVORI) ZAVRŠENI U 2023.g.
<b>UKUPNO RCUO SMILJEVIĆI</b>		<b>233,668</b>			<b>87,602</b>	

## KJP ZO184" OCS

R.br.	UGOVOR				REALIZOVAN O u 2023.g.	STATUS
	Naziv	Vrijednost	Investitor	Izvođač		
1	IZGRADNJA STRELIŠTA ZA 53 EFNS	458,479	KJP ZO184" OCS	HALILOVIĆ	356,105	NASTAVAK REALIZACIJE U 2024.g.
2	IZGRADNJA AUTOMATSKE GARAŽE ZA ŠESTOSJEDNU ŽIČARU	2,379,777	KJP "ZOI 84" OCS	STRUCON	316,633	
3	IZMJESTANJE ČETVEROSJEDNE ŽIČARE PO SISTEMU "KLJUČ U RUKE"	4,212,000	KJP "ZOI 84" OCS	STRUCON	409,500	
4	NABAVKA I POSTAVLJANJE ZNAKOVA NA SKI STAZAMA : LOT2 AL ZNAKOVI I PRATEĆA OPREMA	46,800	KJP "ZOI 84" OCS	BULJAN CESTE	17,204	
5	LOT1. IZGRADNJA SISTEMA OSNJEŽAVANJA GRAVITACIONI SISTEM, PO SISTEMU PROJEKTUJ I IZGRADI "KLJUČ U RUKE"	5,312,509	KJP "ZOI 84" OCS	SUPERSNOW S.A. MGBH	3,644,315	
6	LOT 2. IZGRADNJA SISTEMA OSNJEŽAVANJA SISTEM VISOKOG PRITISKA, PO SISTEMU PROJEKTUJ I IZGRADI "KLJUČ U RUKE"	6,783,918	KJP "ZOI 84" OCS	TECHNOALPIN S.P.A BOLZANO ORMAN GRAKOP	3,532,989	
7	NADOGRADNJA SISTEMA RASVJETE SKI STAZA 5A-ŠTINJI DO DO BABINOG DOLA, LOT-1	772,392	KJP "ZOI 84" OCS	STEP	670,443	
8	IZGRADNJA SKI STAZE TERHNIČKI PUT - AKUMULACIJA 2 I IZGRADNJA STAZA NA OBJE STRANE OD IZLAZNE STAZE ČETVEROSJEDA - LOT 2	701,215	KJP "ZOI 84" OCS	B2	477,889	

9	REKONSTRUKCIJA GORNJEG DIJELA STAZE 5 I KOMPLETNE STAZE 5B I IZGRADNJA SPOJNE SKI STAZE IZMEĐU STAZE 4 I KOLIJEVKE	841,480	KJP "ZOI 84" OCS	B3	671,024	PROJEKTI (UGOVORI) ZAVRŠENI u 2023.g.	
10	LOT 2.-NADogradnja sistema rasvjete ski staza 5- po sistemu projektuj i izgradi "KLJUČ U RUKE" LOT-2	396,630	KJP "ZOI 84" OCS	SES	201,419		
11	HIDROSJETVA SKIJAŠKIH STAZA	70,200	KJP "ZOI 84" OCS	EURO-AGRAR	14,127		
12	HIDROSJETVA SKIJAŠKIH STAZA	46,800	KJP "ZOI 84" OCS	EURO-AGRAR	29,965		
13	ODVODNJA OBORINSKIH VODA SA PARKINGA BABIN DO	339,151	KJP "ZOI 84" OCS	ATLAS -D	270,005		
14	REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE I FEKALNE KANALIZACIJE BABIN DO BJELAŠNICA	151,952	KJP "ZOI 84" OCS	HHYDRA	124,902		
15	BENETON KROV	69,317	KJP "ZOI 84" OCS	ALBERA	23,552		
16	UREĐENJE SKIJAŠKIH STAZA	2,049,662	KJP "ZOI 84" OCS	MGBH	1,314,505		
17	NABAVKA I POSTAVLJANJE SIGURNOSNIH MREŽA NA STAZAMA I TO: LOT 1- A MREŽE NA LOKACIJI NA STAZI OLIMPIJSKI SPUST OD MILEROVOG DO ŠUMSKOG SKOKA	148,995	KJP "ZOI 84" OCS	BULJAN CESTE i MATIAS 2	9,375		
18	UGRADNJA KABLOVA ZA MJERENJE VREMENA I VIDEO NADZOR	280,519	KJP "ZOI 84" OCS	STEP	18,982		
19	IZGRADNJA SPORTSKOG POLIGONA- SNOW PARK BJELAŠNICA	378,269	KJP "ZOI 84" OCS	CITY TRANSPORT	88,933		
20	PROJEKTOVANJE SKI LIFTOVA K1 I K2, RADOVI NA IZGRADNJI PRVE FAZE SKI LIFTA K1	2,474,550	KJP "ZOI 84" OCS	PPG / DOPPELMAYR SEILBAHNEN MGBH	247,455		
<b>UKUPNO KJP ZOI84" OCS</b>		<b>27,914,614</b>			<b>12,439,322</b>		
<b>JAVNI PREVOZ</b>							
R.br.	<b>UGOVOR</b>				<b>REALIZOVAN O u 2023.g.</b>		<b>STAT</b>

	Naziv	Vrijednost	Investitor	Izvođač		
1	I FAZA RADOVA IZGRADNJE I OPREMANJA TRAMVAJSKIH STAJALIŠTA ZA KONTROLISANU NAPLATU KARATA I UVOĐENJE ELEKTRONSKOG SISTEMA NAPLATE	7,115,064	MINISTARTVO SAOBRAČAJA	BS TELECOM SOLUTION I EUROASFALT	37,582	NASTAVAK REALIZACIJE U
<b>UKUPNO JAVNI PREVOZ</b>		<b>7,115,064</b>			<b>37,582</b>	

### IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ODRŽAVANJE SEMAFORA I BROJAČI SAOBRAČAJA

R.br.	UGOVOR				REALIZOVAN O u 2023.g.	STATUS
	Naziv	Vrijednost	Investitor	Izvođač		
1	UGOVOR III - REDOVNO ODRŽAVANJE AUTOMATSKIH BROJAČA SAOBRAČAJA INDUKTIVNE TREHNOLOGIJE I PRIKUPLJANJE OBRADA I ANALIZA PODATAKA U SAOBRAČAJU	39,087	DIREKCIJE ZA PUTEVE KS	NTSI-INSTITUT	19,798	NASTAVAK REALIZACIJE U 2024.g.
2	ODRŽAVANJE SEMAFORA U KANTONU SARAJEVO	699,566	MINISTARTVO SAOBRAČAJA	STEP	265,255	
3	IMPLEMENTACIJA SVJETLOSNE I ZVUČNE SIGNALIZACIJE ZA SLIJEPA I SLABOVIDNA LICA NA SEMAFORIZIRANIM RASKRSNICAMA NA PODRUČJU OPĆINE NOVO SARAJEVO	80,373	OPĆINA NOVO SARAJEVO	STEP	3,990	PROJEKTI (UGOVORI) ZAVRŠENI u 2023.g.
4	IMPLEMENTACIJA UNAPREĐENJA SIGURNOSTI PRELASKA PJEŠAKA NA RASKRSNICI SAFETA HADŽIĆA - OLOVSKA	69,584	MINISTARSTVO SAOBRAČAJA	STEP	38,549	
5	2. POJEDINAČNI UGOVOR ZA ODRŽAVANJE SEMAFORA U KANTONU SARAJEVO	480,455	MINISTARSTVO SAOBRAČAJA	STEP	50,678	
<b>UKUPNO IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ODRŽAVANJE SEMAFORA</b>		<b>1,369,065</b>			<b>378,270</b>	

### OBJEKTI ZA SPORTSKE AKTIVNOSTI I DJEČIJA IGRALIŠTA

R.br.	UGOVOR				REALIZOVAN O u 2023.g.	STATUS
	Naziv	Vrijednost	Investitor	Izvođač		

1	REKONSTRUKCIJA BAZENA DIF	3,326,485	FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE	UNIGRADNJA	134,233	NASTAVAK REALIZACIJE U 2024.g.
2	IZGRADNJA SPORTSKO-REKREACIONOG CENTRA DOBRINJA	7,031,412	OPĆINA NOVI GRAD	UNIGRADNJA	996,550	
3	IZGRADNJA SPORTSKOG I DJEČIJEG IGRALIŠTA U NASELJU DROZGOMETVA	415,008	OPĆINA HADŽIĆI	FLEX INVEST	123,655	PROJEKTI (UGOVORI) ZAVRŠENI U 2023.g.
4	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKE SPORTSKE PLOHE KOD JU OŠ "HAŠIM SPAHIĆ" ILIJAŠ	353,872	OPĆINA ILIJAŠ	FAZUM	353,638	
5	IZGRADNJA PROSTORA ZA ODMOR I REKREACIJU U ul. VARAŽDINSKA	699,998	OPĆINA NOVO SARAJEVO	MIBRAL	217,542	
6	SANACIJA POMOĆNOG STADIONA PORED SPORTSKE DVORANE GORAN ČENGIĆ	775,224	Ministarstvo kulture i sporta KS Zavod za izgradnju KS Općina Novo Sarajevo	BUCOMERC PEJKOM	731,528	
7	IZGRADNJA IGRALIŠTA NA LOKACIJI TRGA ŽRTAVA GENOCIDA U SREBRENICI	35,100	OPĆINA VOGOŠĆA	BABEL	29,133	
8	SANACIJA VANJSKOG IGRALIŠTA PRI JU OŠ "ZAJKO DELIĆ", KOBILJA GLAVA	14,227	OPĆINA VOGOŠĆA	BABEL	13,174	
9	REKONSTRUKCIJA DJEČIJEG IGRALIŠTA - TRG ŽRTAVA GENOCIDA U SREBRENICI	64,513	OPĆINA VOGOŠĆA	GLOVIS	61,131	
10	REKONSTRUKCIJA DJEČIJEG IGRALIŠTA U UL. REMZIJE VEJE	31,005	OPĆINA VOGOŠĆA	GLOVIS	31,005	
<b>UKUPNO OBJEKTI ZA SPORTSKE AKTIVNOSTI</b>		<b>12,746,845</b>			<b>2,691,589</b>	
<b>UREĐENJE PJEŠAČKIH ZONA</b>						
R.br.	<b>UGOVOR</b>				REALIZOVAN O u 2023.g.	STATUS
	<i>Naziv</i>	<i>Vrijednost</i>	<i>Investitor</i>	<i>Izvođač</i>		



1	UREĐENJE I OPREMANJE POVRŠINE JAVNE NAMJENE, TRG SABITA HADŽIĆA I ŠKOLSKI TRG	1,824,373	OPĆINA ILIDŽA	MIBRAL	847,927	PROJEKTI (UGOVORI) ZAVRŠENI U 2023. G.
2	SANACIJA PLATOVA KOD BR.26 I PJEŠAČKIH STAZA KOD BR.41-49 U ULICI BRAĆE KRŠO NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA	207,090	OPĆINA VOGOŠĆA	AME	199,385	
<b>UKUPNO UREĐENJE PJEŠAČKIH ZONA</b>		<b>2,031,463</b>			<b>1,047,312</b>	

## GASNE INSTALACIJE

R.br.	UGOVOR				REALIZOVAN O u 2023.g.	STATUS
	Naziv	Vrijednost	Investitor	Izvođač		
1	NASTAVAK IZGRADNJE DISTRIBUTIVNE MREŽE I IZGRADNJI PRIKLJUČNIH GASOVODA U INDUSTRIJSKOJ ZONI "LUKE" ILIJAŠ	775,000	OPĆINA ILIJAŠ	DŽEKOS	52,085	NASTAVAK REALIZACIJE
<b>UKUPNO GASNE INSTALACIJE</b>		<b>775,000</b>			<b>52,085</b>	

## MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA - POTOČARI

R.br.	UGOVOR				REALIZOVAN O u 2023.g.	STATUS
	Naziv	Vrijednost	Investitor	Izvođač		
1	OBNOVA DIJELA FASADE I RAVNOG KROVA UPRAVNE ZGRADE U MEMORIJALNOM CENTRU SREBRENICA- POTOČARI	647,496	FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA	HUNES	647,496	NASTAVAK REALIZACIJE U 2024.g.
2	REKONSTRUKCIJA I SANACIJA PASARELE	91,502	MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA - POTOČARI	METAL Z	91,502	
<b>UKUPNO MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA - POTOČARI</b>		<b>738,997</b>			<b>738,997</b>	

## PRAČA


R.br.	UGOVOR				REALIZOVAN O u 2023.g.	STATUS
	Naziv	Vrijednost	Investitor	Izvođač		

1	IZGRADNJA PRIHVATILIŠTA ZA NAPUŠTENE PSE KANTONA SARAJEVO I FAZA PRAČA	2,105,957	KJP"VETERINARSK A STANICA"	RADIS	49,959	NASTAVAK REALIZACIJE
<b>UKUPNO PRAČA</b>		<b>2,105,957</b>			<b>49,959</b>	

# REKAPITULACIJA


<b>PROJEKTI</b>	<b>BROJ PROJEKATA</b>	<b>UGOVORENO</b>	<b>REALIZOVANO u 2023.g.</b>
OBJEKTI VISOKOGRADNJE	33	10,522,872 KM	<b>5,581,463 KM</b>
SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA	41	24,087,727 KM	<b>10,702,078 KM</b>
VODOVOD I KANALIZACIJA	32	19,680,820 KM	<b>8,424,076 KM</b>
REGULACIJA VODOTOKA	14	3,380,504 KM	<b>1,890,339 KM</b>
SANACIJA KLIZIŠTA	7	3,197,437 KM	<b>861,300 KM</b>
JAVNA RASVJETA	3	484,874 KM	<b>325,367 KM</b>
GROBLJE VLAKOVO	2	2,051,951 KM	<b>1,151,504 KM</b>
RCUO SMILJEVIĆI	3	233,668 KM	<b>87,602 KM</b>
KJP ZO184" OCS	20	27,914,614 KM	<b>12,439,322 KM</b>
JAVNI PREVOZ	1	7,115,064 KM	<b>37,582 KM</b>
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ODRŽAVANJE SEMAFORA	5	1,369,065 KM	<b>378,270 KM</b>
OBJEKTI ZA SPORTSKE AKTIVNOSTI	10	12,746,845 KM	<b>2,691,589 KM</b>
UREĐENJE PJEŠAČKIH ZONA	2	2,031,463 KM	<b>1,047,312 KM</b>
GASNE INSTALACIJE	1	775,000 KM	<b>52,085 KM</b>
MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA - POTOČARI	2	738,997 KM	<b>738,997 KM</b>
PRAČA	1	2,105,957 KM	<b>49,959 KM</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>177</b>	<b>118,436,858 KM</b>	<b>46,458,844 KM</b>

## KAPITALNI PROJEKTI

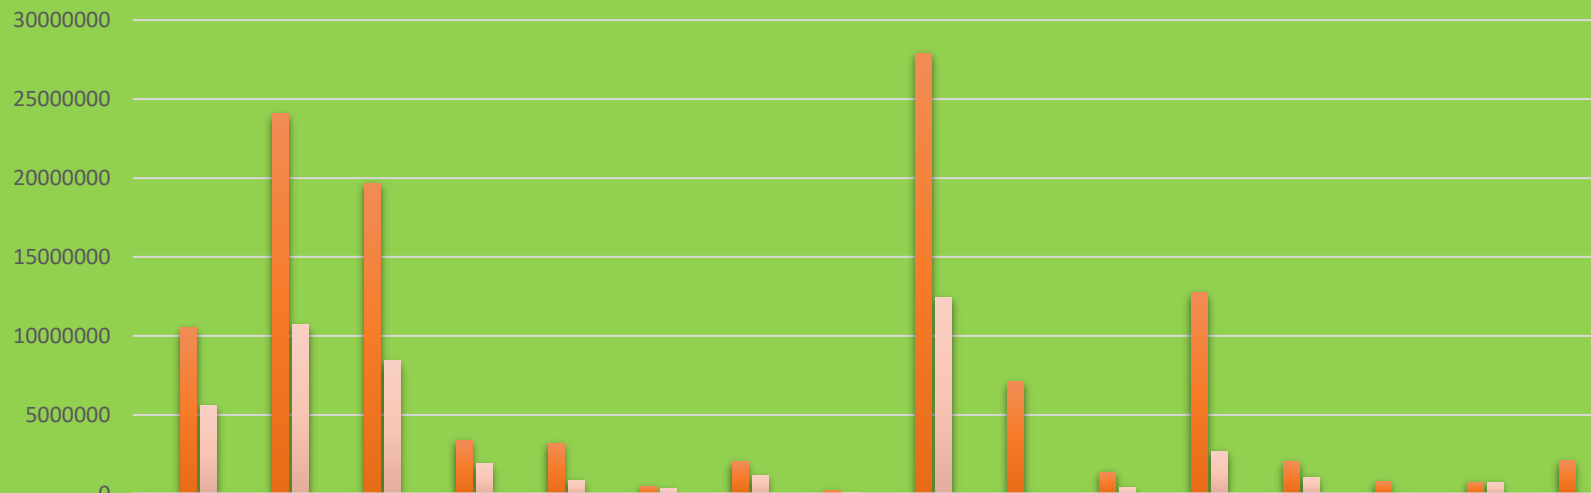

	OBJEKTI VISOKOG RADNJE	SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA	VODOVODI KANALIZACIJA	REGULACIJA VODOTOKA	SANACIJA KLIZIŠTA	JAVNA RASVJETA	GROBLJE VLAKOVO	RCUO SMILJEVIĆI	KJP ZO184' OCS	JAVNI PREVOZ	IZGRADNJA REKONSTRUKCIJA I ODRŽAVANJE SEMAFORA	OBJEKTI ZA SPORTSKE AKTIVNOSTI	UREĐENJE PJEŠAČKIH ZONA	GASNE INSTALACIJE	MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA - POTOČARI	PRAČA
Series1	1															
BROJ UGOVORA	33	41	32	14	7	3	2	3	20	1	5	10	2	1	2	1
UGOVORENO KM	10.522.87	24.087.72	19.680.82	3.380.504	3.197.437	484.874	2.051.951	233.668	27.914.61	7.115.064	1.369.065	12.746.84	2.031.463	775.000	738.997	2.105.957
REALIZACIJA KM	5.581.463	10.702.07	8.424.076	1.890.339	861.300	325.367	1.151.504	87.602	12.439.32	37.582	378.270	2.691.589	1.047.312	52.085	738.997	49.959

## KAPITALNI PROJEKTI u 2023.g.

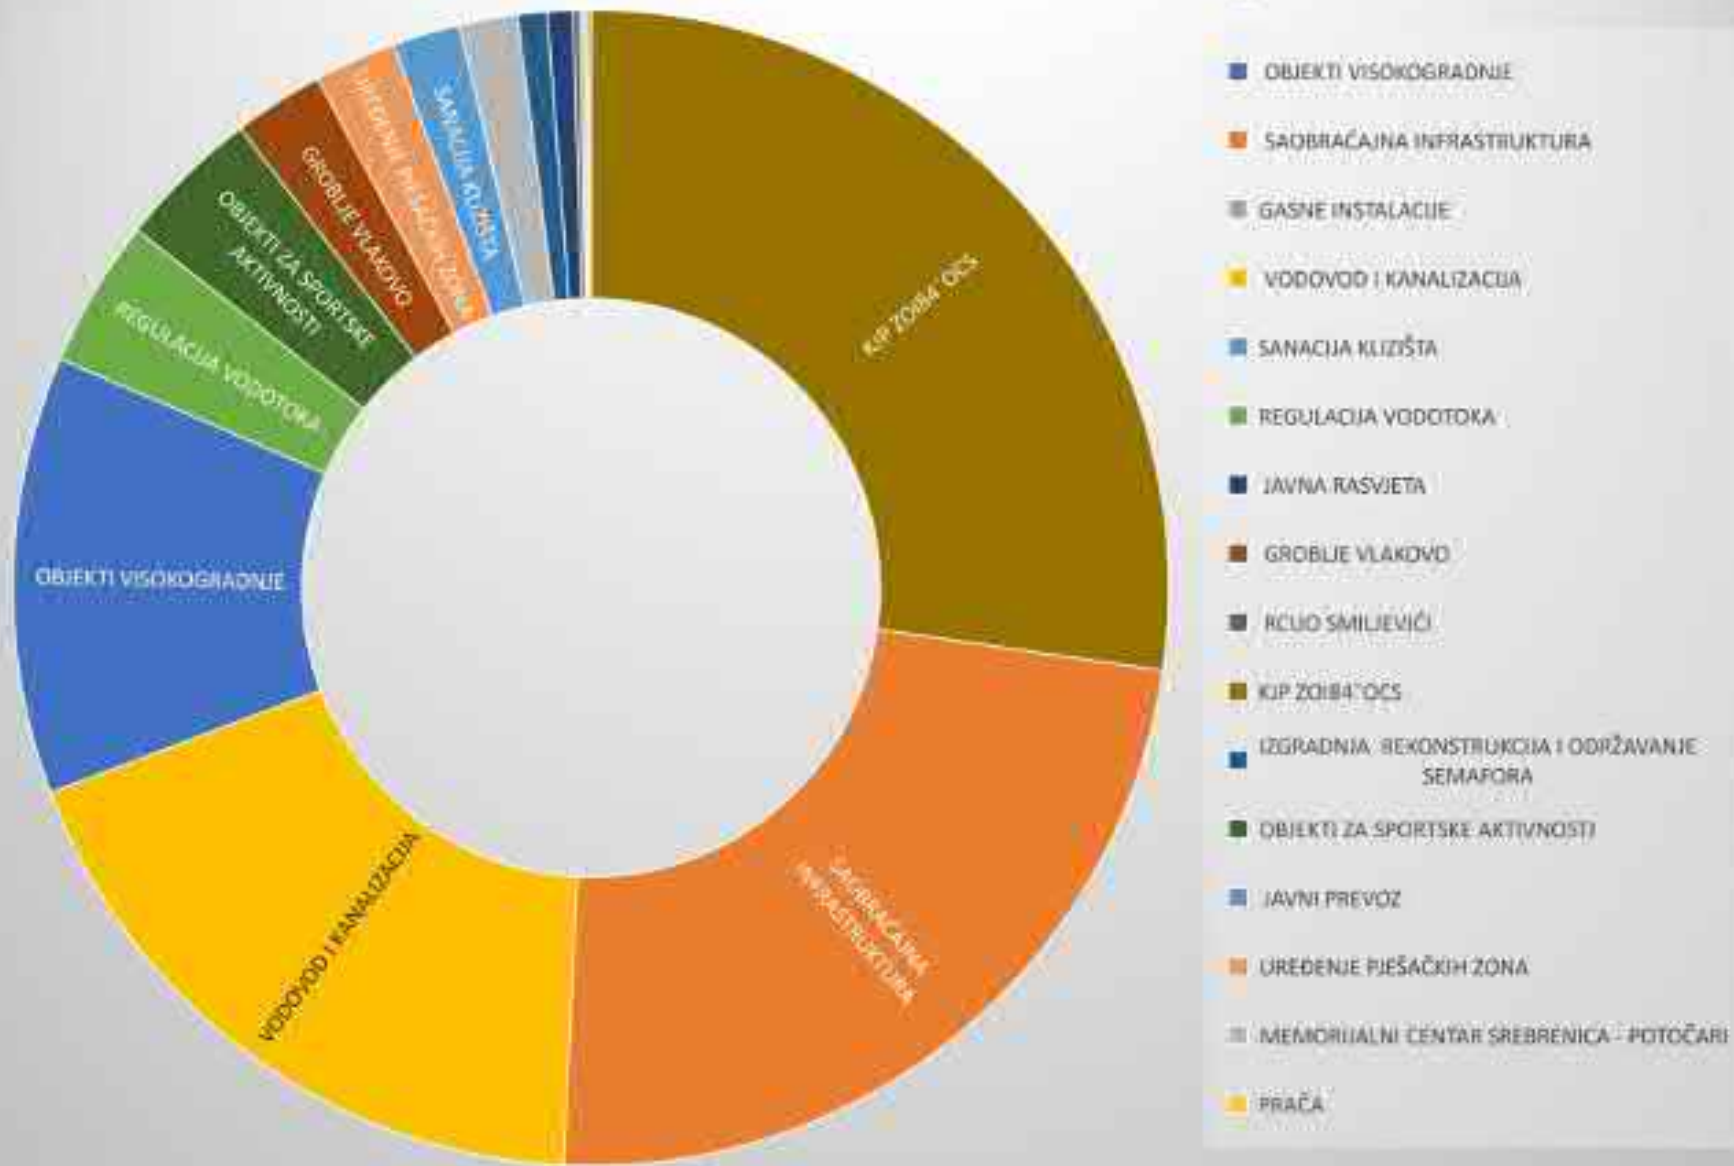

Pored klizišta čija je sanacija provedena ili je pokrenuta tokom 2023. godine, također su provedeni ili pokrenuti postupci izrade projektne dokumentacije za sanacije klizišta. Klizište za koje je izrađena projektna dokumentacija tokom 2023. godine je klizište na lokalitetu Gornja Raštelica br.5, Općina Hadžići, čija vrijednost iznosi 17.328,87 KM. Također su u 2023. godini pokrenuti postupci kao što je izrada projektne dokumentacije na sanaciji klizišta na lokalitetu Sagrađžije, Džamija Ulomljenica, Općina Stari Grad, čija vrijednost iznosi 32.362,20 KM, zatim izrada projektne dokumentacije na sanaciji klizišta na lokalitetu Bužimska 53 i na lokalitetu Nadira Kafedžića 5, Općina Novi Grad. U toku je postupak monitoringa i Izrade dopune projektne dokumentacije za potrebe izrade RP Soukbunar, Općina Centar Sarajevo, a čija vrijednost iznosi 55.961,10 KM.

U 2023. godini, na web stranici Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, objavljen je javni poziv općinama Kantona Sarajevo, da prijave prioritetne projekte za sanaciju klizišta za koja Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo i Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo imaju obezbijedena namjenska sredstva. Radi se o udruženim finansijskim sredstvima Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo za sufinansiranje prioritetnih klizišta Kantona Sarajevo.

Zbog komplikovanih procedura u pokretanju postupaka sanacije klizišta, velikog broja registrovanih klizišta, te nejasnih nadležnosti, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo je u proteklom periodu pokrenuo inicijativu za donošenje zakonske legislateve o klizištima, za što je Vlada Kantona Sarajevo donijela Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, da u koordinaciji i saradnji sa Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo, Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo pripremi materijal o formiranju interesorne radne grupe u cilju donošenja odgovarajućeg propisa ili izmjene i dopuna postojećih propisa koji se odnose na klizišta kao posebne slučajeve građenja na području Kantona Sarajevo.

## **VIII. OCJENA STANJA I POSTIGNUTI REZULTATI**

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo je u okviru djelokruga rada u ispunjavao ciljeve i zadatke koji su mu postavljeni zakonima, nalogima Skupštine Kantona Sarajevo putem Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta i realizacije kapitalnih investicija za 2023 godinu, zaključcima Vlade Kantona Sarajevo, ministarstvima koji su izrazili potrebe za aktivnostima Zavoda u okviru njegovog djelokruga rada, ta Grada Sarajeva i općina u Kantonu Sarajevo.

Zavod je u svom radu izvršavao programske poslove i zadatke u skladu sa planiranom dinamikom i osiguranim sredstvima od strane investitora.

Problemi s kojima se Zavod sreće u svom radu proizlaze, prije svega iz dugotrajnosti postupaka o eksproprijaciji nekretnina i postupaka prilikom provođenja javnih nabavki roba, radova i usluga.

Zavod je vezan dosljednom i striktnom primjenom federalnih i državnih Zakona što uzrokuje dugotrajnost postupaka eksproprijacije i javnih nabavki, koji usporavaju realizaciju projekata i Zavod na određen način čini “neefikasnim” u poređenju s pravnim licima koje takvi propisi

ne obavezuju. U vezi s javnim nabavkama smatramo značajnim istaći da su, bez obzira na svoju veliku vrijednost i mnogobrojnost usješeno provedene u mjeri i u skladu sa važećim propisima.

Zavod opterećuje nenaplativost potraživanja po osnovu ugovora o naknadi za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i naknadi za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište na korišćenje zaključenih prije donošenja Zakona o građevinskom zemljištu FBiH koji je 2003.godine nametnut od strane Visokog predstavnika BiH. Protiv investitora koji ne izmiruju ugovorne obaveze Zavod poduzima mjere prinudne naplate, ali su rezultati bez obzira na isposlovane izvršne naslove, po našoj ocjeni nezadovoljavajući jer su dosuđena potraživanja u pravilu teško naplativa zbog protoka vremena, stečaja ili likvidacije pojedinih firmi, kao i nerealizacije izgradnje objekata za koje su takvi ugovori zaključeni.

Za Zavod poseban problem predstavlja odnos Općina prema građevinskom zemljištu u postupku preuzimanja tog zemljišta od Zavoda. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo preuzeo je prava i obaveze Zavoda za izgradnju grada Sarajeva osnovanog 1975.godine, prije svega, radi uređenja građevinskog zemljišta za potrebe izgradnje Grada. Preuzimajući prava i obaveze, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo preuzeo je i nekretnine (zemljišta i zgrade) Zavoda za izgradnju grada Sarajeva koje je taj Zavod stekao u funkciji uređenja građevinskog zemljišta, te u istoj funkciji nastavio sticanje novih nekretnina. Osnivačkim aktom jednog i drugog Zavoda, Zavodi su ovlašćeni da upravljaju stečenim nekretninama i njima raspolažu samo u funkciji uređenja građevinskog zemljišta. Sticanje nekretnina financirano je do 1987.godine iz tzv. učešća investitora u troškovima uređenja građevinskog zemljišta, a poslije toga - iz naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, naknade za pogodnosti građevinskog zemljišta - rente, i naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta. Stečene nekretnine, zajedno s novčanim oblikom pomenutih naknada, čine sredstva uređenja građevinskog zemljišta koja se, po Zakonu o građevinskom zemljištu FBiH mogu koristiti isključivo za troškove naknade ranijim vlasnicima, uređenja zemljišta i troškove izrade prostorno-planske dokumentacije. Do donošenja Zakona o građevinskom zemljištu i istoimenih Odluka Općina u Kantonu Sarajevo, Zavod je prenosio pravo korištenja građevinskog zemljišta na investiture u svrhu izgradnje planiranih objekata uz naplatu naknade za preuzeto zemljište po cijenama koje su, u skladu s tada važećim zakonom o eksproprijaciji, propisivale Općine.

Na taj način bila je osigurana nesmanjena vrijednost uloženi sredstava u nekretnine, pogotovo radi toga što je i Zavod pod istim uslovima, tj. po propisanim cijenama, sticali nove nekretnine.

Nakon stupanja na snagu Zakona o građevinskom zemljištu FBiH, Općine su preuzimale građevinsko zemljište sa znanjem ili bez znanja Zavoda, plaćanjem ili bez plaćanja naknade za preuzeto zemljište i na taj način smanjivale vrijednost Zavodove imovine, tj. sredstava uređenja građevinskog zemljišta.

Od donošenja Zakona o eksproprijaciji, krajem 2007.godine, cijene preuzetog zemljišta ne mogu se propisivati Odlukama Općina, nego se određuju prema tržišnim uslovima.

Međutim, Općine, bez obzira na to, propisuju cijene svojim Odlukama, ali ih kao takve, primjenjuju samo na preuzimanje Zavodovog ili svog zemljišta, što Zavodu nameće potrebu dugotrajnog sporenja radi postizanja tržišne cijene.

S druge strane, Zavod, u funkciji uređenja građevinskog zemljišta plaća tržišnu cijenu nekretnina u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji i Zakonom o stvarnim pravima FBiH.

Ovoj pojavi Zavod se suprostavlja dozvoljenim pravnim sredstvima. Međutim zbog dugotrajnosti sudskih postupaka, rezultati u pogledu naplate sredstava koja su Općine preuzele, a zatim dodijelile trećim licima ili iskoristili za svoje potrebe su vremenski neizvjesne.

Ciljevi i zadaci su utvrđeni Programom rada u 2023.godini koji je sastavni dio Programa rada Vlade Kantona Sarajevo za 2023.godinu.

## IX. PROGRAMSKA ORJENTACIJA

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo je po prirodi svog posla i nadležnostima upućen na saradnju sa organima uprave i pravnim licima kao investitorima od kojih zavisi izvršavanje njegovih poslova.

Donošenjem Zakonom o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo (Sl.novine KS br.40/22), djelokrug Zavoda je usaglašen s mogućim djelokrugom koji je u odnosu na dosadašnji sužen Zakon o građevinskom zemljištu FBiH, Zakonom o eksproprijaciji, Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o pravobranilaštvu. U skladu sa njegovim djelokrugom modificirana je programska orijentacija Zavoda.

Opadanjem uloge Zavoda u oblasti uređenja građevinskog zemljišta, Zavod se sve više usmjerava na realizaciju kapitalnih investicija koje mu povjeravaju Kanton, Općine, Grad i Direkcija za ceste KS.

Stupanjem na snagu Zakona o građevinskom zemljištu FBiH i prenosom nadležnosti u oblasti uređebha gradskog građevinskog zemljišta sa Zavoda na Općine, kao i davanje mogućnosti investitorima da sami urede građevinsko zemljište (koje je već uređeno) uloga Zavoda za ugovaranje naknade za uređenje građevinskog zemljišta je svedena na investitore kojima urbanističku saglasnost izdaje nadležno kantonalno ministarstvo, ako uređenje zemljišta nije povjereno investitoru. Do sada nismo imali slučaj da se investitor koji gradi objekte preko 10.000 m<sup>2</sup> obratio Zavodu da zahtjevom za obračun troškova. Sa svim ostalim investitorima pitanje uređenja regulišu općine, od čije volje zavisi kome će povjeriti uređenje građevinskog zemljišta Zavodu ili investitoru!

U izvještajnom periodu općine su najčešće prepuštale investitorima da sami uređuju građevinsko zemljište, osim u slučajevima gdje su Općine donosile programe uređenja građevinskog zemljišta, odnosno kada posebnim odlukama Zavodu povjere uređenje zemljišta.

## X. IZVRŠENJE KONTINUIRANIH POSLOVA

**Poslovi iz oblasti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa** radi realizacije projekata od javnog interesa su kompleksni i stručni obzirom da od rješavanja istih ovisi dinamika realizacije projekata od javnog interesa za Kanton Sarajevo. Ovi postupci su u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH podrazumijevaju učešće Zavoda kao podnosioca zahtjeva u prvostepenom postupku pred Općinama kao stvarno nadležnim za provođenje postupka eksproprijacije i donošenje rješenja. Takođe Zavod se u ime i za račun Kantona Sarajevo pojavljuje kao opunomoćena strana prilikom izjavljivanja žalbi drugostepenom organu kao i prilikom podnošenja tužbi nadležnim sudskim instancama.

Predmetni poslovi zahtjevaju provođenje postupaka utvrđenih važećim Zakonom koji čine kontinuirane poslove i u ovisnosti od rješavanja zahtjeva Zavoda i vlasnika nekretnina, predmetni



postupci se obično vode duži vremenski period. Tako Zavod podnosi zahtjev za utvrđivanje javnog interesa nadležnom organu, objavljuje javni oglas radi sporazumnog rješavanja prenosa prava vlansištva, podnosi prijedloge za eksproprijaciju, zastupa Kanton u upravnim postupcima, zahtjeva od nadležnih organa provođenje inspeksijskog nadzora i provodi druge aktivnosti za koje je ovlašten. Obzirom na složenost postupka eksproprijacije i mogućnosti izjavljivanja žalbi i tužbi u postupcima predmetne radnje se provode kroz više kalendarskih godina ovisno o uspjehu stranaka u postupku, kao i ažurnosti drugih nadležnih organa sa federalnog nivoa-prvenstveno Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove i nadležnih sudova- Općinskog i Kantonalnog suda u Sarajevu.

Kao što je navedeno u ranijim dijelovima ovog izvještaja, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo u ime i za račun Kantona Sarajevo je tokom 2023. godine nastavio voditi postupke rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za projekte od javnog interesa, prvenstveno za saobraćajnice u okviru Projekta izgradnje gradskih saobraćajnica, a takođe i za druge projekte bliže opisane u tematskom dijelu ovog izvještaja.

Zavod je pokrenuo aktivnosti na ažuriranju podataka i uspostavljanju registra stanova i poslovnih prostora kako bi u saradnji sa nadležnim organima sistemski riješili način raspolaganja sa stanovima koji su vraćeni Zavodu na osnovu Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova FBiH.

Zavod za izgradnju pored stanova koji se vraćaju po osnovu Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova FBiH raspolaže stanovima stečenim iz uređenja gradskog građevinskog zemljišta u smislu odredbi Zakona o građevinskom zemljištu u FBiH i Zakona o eksproprijaciji FBiH koji su preuzeti od Zavoda za izgradnju grada Sarajeva, a koji se koriste prilikom realizacije projekata od javnog interesa za Kanton Sarajevo.

Zavod je u 2023 godini nastavio aktivnosti za ažuriranje evidencije stanova te je uputio zahtjeve za dostavu podataka prema Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša-Uprava za stambena pitanja sa zahtjevom za dostavu podataka o stanovima koji nisu vraćeni Zavodu u skladu sa članom 5. Zakona o vraćanja, dodjeli i prodaji stanova („Sl.novine FBiH broj 8/05 i 02 /09)

Stanovi sa kojima raspolaže Zavod a koji su slobodni od korisnika Zavod plaća režijske troškove od kojih je većina u veoma lošem stanju.

Ostali stanovi se koriste za alternativni smještaj određenih kategorija (šehidska i boračka populacija i socijalne kategorije i sl.) putem Uprave za stambena pitanja KS i još uvijek nisu vraćeni Zavodu.

Zavod putem Uprave za stambena pitanja provodi kontinuirane aktivnosti radu povrata stanova za koje nije podnesen zahtjev za povrat od ranijih nosioaca stanarskih prava, međutim kako su korisnici kojim su dodjeljeni stanovi kao alternativni smještaj većinom pripadnici boračke populacije I socijalnih kategorija, putem Ministarstva za boračka pitanja I Ministarstva za rad I socijalnu politiku neophodno je utvrditi stvarni status svih korisnika prije vraćanja stanova u posjed Zavoda ( sa ili bez korisnika).

**Poslovi na opremanju gradskog građevinskog zemljišta** koje provodi Sektor za opremanje gradsko građevinskog zemljišta se odnosi na obavljanje složenih poslova prilikom realizacije projekata Kantona Sarajevo koje se odnose na više segmenata kao što je obavljanje stručnog nadzora od strane službenika Zavoda, zatim pribavljanje potrebnih saglasnosti od nadležnih

organa, nadzor i kontrola projektantskih rješenja i koordinacija između projektanta i investitora, zatim podnošenje zahtjeva i pribavljanje urbanističko-tehničke dokumentacije, kao i obavljanje drugih stručno-tehničkih poslova.

Aktivnosti na realizaciji projekata ovog tipa se takođe provode u višegodišnjem periodu, te iziskuju rad i saradnju rada Zavoda sa ostalim relevantnim subjektima koja se ogleda u pripremi projekata, zajedničkom angažmanu na projektovanju, usaglašavanju planske dokumentacije, provođenju javnih nabavki i obavljanje drugih poslova od kojih ovisi realizacija zaduženja Zavoda kao zadužene institucije.

Kako je navedeno, službenici Zavoda zaduženi za opisane poslove su tokom 2023 godine vršili i obavljali poslove od provođenja postupka javnih nabavki do vršenja stručnog nadzora nad izgradnjom objekata niskogradnje i visokogradnje bliže opisane u tematskom dijelu ovog izvještaja.

**Vođenje i ažuriranju analognog i digitalnog katastra komunalnih uređaja** koji predstavljaju poslove koje ovaj Zavod kontinuirano provodi još od prijeratnog perioda uz napomenu da podaci o podzemnim instalacijama predstavljaju uslov za građenje na području Kantona Sarajevo.

Unaprijeđenje ovog sistema se vrši kontinuirano zadnjih godina u vidu digitalizacije i prilagođavanja današnjem dobu prilikom izdavanja kopija podzemnih instalacija, njihovom unošenju i drugim aspektima kojima se katastar podzemnih instalacija usavršava i čini dostupnim fizičkim i pravnim licima prilikom planiranja izgradnje, pribavljanja dozvola i same gradnje objekata.

## **XI. REALIZOVANI POSTUPCI JAVNIH NABAVKI**

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14, 59/22)) direktor Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, donio je:

- Odluku o usvajanju privremenog plana javnih nabavki Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2023. godinu ( broj 06-45-83/23 od 25.01.2023. godine);
- Odluku o prvoj izmjeni i dopuni privremenog plana javnih nabavki Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2023. godinu ( broj 06-45-1739/23 od 13.02.2023. godine);
- Odluku o usvajanju plana javnih nabavki Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2023. godinu ( broj 06-45-3876/23 od 14.04.2023. godine);
- Odluku o prvoj izmjeni i dopuni plana javnih nabavki Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2023. godinu ( broj 06-45-4830/23 od 28.04.2023. godine);
- Odluku o drugoj izmjeni i dopuni plana javnih nabavki Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2023. godinu ( broj 06-45-5728/23 od 07.06.2023. godine);
- Odluku o trećoj izmjeni i dopuni plana javnih nabavki Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2023. godinu ( broj 06-45-6163/23 od 16.06.2023. godine);
- Odluku o četvrtoj izmjeni i dopuni plana javnih nabavki Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2023. godinu (broj 03-45-8479/23 od 30.08.2023. godine);

- Odluka o petoj izmjeni i dopuni plana javnih nabavki Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2023. godinu (broj 06-45-9102/23 od 19.09.2023. godine)
- Odluka o šestoj izmjeni i dopuni plana javnih nabavki Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2023. godinu (broj 06-45-11797/23 od 24.11.2023. godine)
- Odluka o sedmoj izmjeni i dopuni plana javnih nabavki Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2023. godinu (broj 06-45-12505/23 od 12.12.2023. godine)

Postupci javnih nabavki realizovani u periodu od 01.01.2023. do 31.12.2023.godine od strane ugovornog organa Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo su:

### **I OTVORENI POSTUPCI JAVNIH NABAVKI – ZAKLJUČENI UGOVORI**

1. Sanacija ulice Branilaca Šipa u dužini L=375m, Općina Centar Sarajevo;
2. Isporuka motornog goriva (dizel i benzin) za službena vozila / okvirni sporazum 3 godine;
3. Izvođenje radova na adaptaciji poslovnog prostora -Breka;
4. Nabavka računarske opreme za potrebe Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo;

### **II PREGOVARAČKI POSTUPCI BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI – ZAKLJUČENI UGOVORI:**

1. Dodatni i nepredviđeni radovi na adaptaciji poslovnog prostora Breka;
2. Dodatni i nepredviđeni radovi na sanaciji ulice Branilaca Šipa, u dužini 375 m1, Općina Centar Sarajevo.

### **III KONKURENTSKI POSTUPCI JAVNIH NABAVKI – ZAKLJUČENI UGOVORI:**

1. Usluge redovnog servisiranja službenih vozila Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo;
2. Nabavka materijala za održavanje higijene/okvirni sporazum 3 godine;
3. Nabavka kancelarijskih stolica;
4. Mjesečna pretplata na licence i programske pakete;
5. Usluge izrade akta o procjeni rizika;
6. Usluge čišćenja službenih prostorija Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za dvije lokacije u ul. Kaptol br.3 i Branilaca Sarajeva br.3;
7. Usluge održavanja i iznajmljivanja internet konekcije;
8. Nabavka motornog vozila;
9. Nabavka VM Manager Pro 7 Nods licence za Synology servere;
10. Nabavka ormarića i klupa za presvlačenje za plivački bazen na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
11. Nabavka kancelarijskog materijala /okvirni sporazum 3 godine
12. Zaštita informacionog sistema, nabavka NGFW zaštite sa jednogodišnjom licencom i uslugom setovanja i intervencije u trajanju od jedne godine.

#### **IV DIREKTNI SPORAZUMI:**

1. Usluge pranja službenih vozila ZiK-a;
2. Nabavka seta obavezne opreme za 2 vozila;
3. Nabavka gumenih patosnica za dva vozila;
4. Usluge IT analize opreme;
5. Nabavka vode za piće za potrebe reprezentacije u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo;
6. Nabavka robe za tople napitke za potrebe reprezentacije u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo;
7. Usluge vještačenja Izrada nalaza-procjena nasada i zasada;
8. Usluge održavanja knjigovodstvenog programa JAPET;
9. Arhiviranje i čuvanje arhivske dokumentacije;
10. Usluge popravke fotokopir uređaja;
11. Pružanje usluga sudskih vještaka građevinske i arhitektonske struke u svrhu procjene tržišne vrijednosti nekretnine;
12. Nabavka 25 (dvadesetpet) mobilnih pretplata;
13. Usluge registracije službenih vozila ZIK-a;
14. Nabavka namještaja za kuhinju;
15. Usluge pretplate na pravnu bazu zakona, podzakonskih akata u BIH, entitetima i kantonima;
16. Usluge pretplate na stručne časopise i portale Paket Premium;
17. Usluge pretplate na stručne časopise i portale-portal za pitanja i odgovore iz javnih nabavki;
18. Usluge godišnjeg osiguranja imovine Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo;
19. Nabavka čajeva i hladnih napitaka za potrebe reprezentacije;
20. Usluge seminara i edukacija - Fidic trening;
21. Usluge pretplate na stručne časopise i portale - Nabavka Fidic knjiga;
22. U sluge sortiranja, prevoza, preseljenja i slaga arhivske građe;
23. Usluge održavanja klima uređaja;
24. Usluge održavanja kopir aparata i 2 (dva) plotera, sa nabavkom i ugradnjom rezervnih dijelova;
25. Usluge izrade izvedenog projekta rekonstrukcije mreže Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo u ulici Branilaca Sarajeva br 3;
26. Usluga implementacije računovodstvenog programa i podrška;
27. Nabavka računovodstvenog programa sa godišnjom licencom;
28. Identifikacija, Ažurna geodetska situacija i iskoličenje parcele u vlasništvu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa izradom Elaborata u analognom i digitalnom obliku, radi stavljanja u upotrebu zemljišta do privođenja istog krajnjoj namjeni, na lokalitetu Halilovići;
29. Nabavka materijala za održavanje prostorija, opreme i ostalih sredstava ZIK-a;
30. Usluge kasko osiguranja službenih vozila;
31. Usluge revizije IT sistema Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo;
32. Održavanje aplikacija i baza za unos elaborata nastalih u periodu od 2000 do 2008 godine u Sektoru za katastar komunalnih uređaja;
33. Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;
34. Usluge pretplate na stručne časopise I portale- Portal Recko;
35. Usluge nabavke elektronskih ulaznica/iskaznica za zaposlenike i privjesaka za iskaznice;
36. Usluge održavanja Tehničke zaštite u prostorijama Zavoda za izgradnju KS i održavanje GPS sistema za službena vozila;

37. Usluge seminara i edukacija - seminar iz oblasti Javnih nabavki;
38. Usluge godišnjeg osiguranja od nezgode I usluge zdravstvenog osiguranja službenika I namještenika Zavoda za izgradnju Kantona;
39. Nabavka usluga mobilne pretplate;
40. Usluge iznajmljivanja dva kopir aparata za potrebe Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za dvije lokacije u ul.Kaptol br.3 i Branilaca Sarajeva br.3;
41. Nabavka usluga smještajua i ostalih hotelskih uslugau cilju održavanja team building-a;
42. Izvođenje radova na čišćenju i snimanju kanalizacione mreže u ulici Nedima Filipovića;
43. Nabavka- dobijanje energetskog sertifikata za plivački bazen na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu;
44. Nabavka i ugradnja modula za pumpu u kotlovnici za potrebe podnog grijanja za plivački bazen na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta Sarajevo;
45. Nabavka materijala za održavanje prostorija i opreme i ostalih sredstava Zavoda za izgradnju Kantona;
46. Nabavka auto guma, akumulatora i materijala za održavanje vozila;
47. Nabavka usluga cestovnog putničkog prometa;
48. Usluge servisiranja i zamjene PP aparata;
49. Hitna sanacija na stanovima Zavoda za izgradnju Kantona;
50. Usluge servisiranja kotlova, mjerenje odlazećih polutanata i popravka kotlova;
51. Usluge vulkanizera za službena vozila Zavoda za izgradnju Kantona;
52. Nabavka materijala za održavanje prostorija i opreme i ostalih sredstava Zavoda za izgradnju Kantona sarajevo;
53. Usluge pretplate na kablovsku TV;
54. Izrada projekta uklanjanja nedovršenog objekta poslovno dispečerskog centra Vodovoda i kanalizacije Sarajevo u Kolodvorskoj ulici Općina Novo Sarajevo;
55. Usluge pregleda i čišćenja dimovodnog kanala;
56. Usluge održavanja telefonskih linija i instalacija;
57. Usluge kopiranja i uvezivanja i štampanja tehničke i knjigovodstvene dokumentacije Zavoda za izgradnju KS;
58. Usluge vještačenja vozila u vlasništvu Zavoda za izgradnju KS
59. Usluge servisiranja dimnjačnih bojlera;
60. Usluge seminara i edukacija (FIDIC obuka);
61. Usluge projektovanja enterijera ulaznog hola i elektro i mašinskih instalacija u zgradi Zavoda za izgradnju KS:
62. Nabavka materijala za održavanje prostorija i opreme i ostalih sredstava Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo;
63. Nabavka autoguma, akumulatora i materijala za održavanje vozila;
64. Usluge projektovanja hangara za potrebe skladištenja MUP-a;
65. Nabavka materijala za održavanje prostorija i opreme i ostalih sredstava Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo;
66. Nabavka materijala za održavanje prostorija i opreme i ostalih sredstava Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo
67. Usluge redovnog servisiranja dva službena vozila iz programa Suzuki S-CROSS;
68. Usluge održavanja zemljišta u vlasništvu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo;
69. Usluge godišnjeg održavanja softwera e-protokola;
70. Usluge seminara i edukacija - Završno savjetovanje za 2023.godinu javne nabavke;

71. Usluge seminara i edukacije“ i to: seminar Budžetske aktuelnosti; seminar novosti u Javnom sektoru; seminar dodatna primanja;
72. Nabavka usluge mobilne pretplate;
73. Nadogradnja ESRI ArcGIS Desktop Basic licence na Esri ArcGIS Desktop Standard;
74. Nabavka HTZ opreme (radne/zaštitne odjeće i obuće);
75. Usluge sortiranja, prevoza, preseljenja i slaganja arhivske građe;
76. Nabavka ugostiteljskih usluga;
77. Nabavka, isporuka i ugradnja klima uređaja za grijanje i hlađenje poslovnog prostora na Breči;
78. Nabavka autoguma, akumulatora i materijala za održavanje vozila;
79. Usluge registracije službenih vozila ZIK-a;
80. Usluge seminara i edukacija;
81. Nabavka tonera, print glava za plotere i kopir aparate;
82. Nabavka i isporuka prenosnih protupožarnih aparata za poslovni prostor Zavoda na Breči;
83. Usluge kasko osiguranja službenih vozila;
84. Revizija Projekta uklanjanja nedovršenog objekta poslovno-dispečerskog centra KJKP "Vodovod i kanalizacija" u Kolodvorskoj ulici.



## IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI POJEDINAČNIH UGOVORA ZA SVE DOBAVLJAČE

R. Br.	Vrsta postupka	Vrsta ugovora	Broj postupka	Broj lotova	Redni broj lota	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Naziv dobavljača	IDB/IB dobavljača	Datum zaključenja ugovora	Vrijednost ugovora
1	Direktni postupak	Usluge	285-8-2-5/23	0		Usluge IT analize opreme	72000003-5 Usluge informacione tehnologije: savjetovanje, razvoj programirane podrške, internet i podrška	CITY GROUP D.O.O.	4200134842008	30.1.2023.	800,00
2	Direktni postupak	Robe	285-8-1-3/23	0		Nabavka seta obavezne opreme za dva vozila Zavoda za izgradnju Kantona Sarajeva	34000003-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu	TR AUTOSHOP MAIA	4302548270006	6.2.2023.	62,31
3	Direktni postupak	Robe	285-8-1-4/23	0		Nabavka punjenih baterija za dva vozila Zavoda za izgradnju Kantona Sarajeva	34000003-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu	TR AUTOSHOP MAIA	4302548270006	6.2.2023.	123,98
4	Direktni postupak	Robe	285-8-1-4/23	0		Nabavka robe za toplu napitke za posebne reprezentacije u Zavodu za izgradnju KS	15860000-1 Beverna/pićna pića	DIENA PIG D.O.O. SARAJEVO	4302053042008	14.2.2023.	2384,02
5	Direktni postupak	Robe	285-8-1-9/23	0		Nabavka vode za piće za posebne reprezentacije u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajeva	15860000-1 Beverna/pićna pića	Brijevska d.o.o. Sarajevo	4302111402008	22.2.2023.	490,00
6	Direktni postupak	Usluge	285-8-2-7/23	0		Usluge upravljanja izradom nacrta-projekta nasada i zgrade na nekretnosti: 175/4, 177/3, 177/2 K.O. Kobilja Glava, v.l. 713/2, 706/3, 706/3, 701/3, 695/2, 697/2, 693/2, 692/2, 623/3, 613/3 (523/2 K.O. Hotoje)	75142119-8 Usluge sudskih izvršenja	VESTAR D.O.O.	4327792682009	22.2.2023.	2427,35
7	Direktni postupak	Usluge	285-8-2-4/23	0		Ugovor za održavanje i održavanje softvera JAFET	72260003-5 Usluge povezane s programskom podrškom	JAFET D.O.O. SARAJEVO	4300122720005	22.2.2023.	960,00
8	Direktni postupak	Usluge	285-8-2-11/23	0		Usluga pranja skrbene vozila Zavoda za izgradnju Kantona Sarajeva	50112303-6 Pranje automobila i slične usluge	TAMEK SON COMPANY D.O.O.	4300704120005	14.3.2023.	3500,00
9	Direktni postupak	Usluge	285-8-2-13/23	0		Nabavka 25 (dvadeset) mobilnih pretplata	64212003-5 Usluge mobilne telefonije	DOMCARSKO DRUŠTVO BI TELECOM SARAJEVO - DIREKCIJA SARAJEVO	4200211102021	18.3.2023.	5640,00



10	Direktni sporazum	Usluga	285-8-1-14/23	0		Usluge popravke fotokopir uređaja	5083300-3 Usluge popravke fotokopirnih uređaja	RACIONAL D.O.O.	4200012750009	30.3.2023.	413,60
11	Direktni sporazum	Usluga	285-8-1-13/23	0		Pružanje usluga suđenih vještaka građevinske i arhitektonske struke u vezi gradjevine tržišne vrijednosti nekretnosti	75742110-8 Usluge suđenih vještaka	LINE INŽINERING DOO	4201792280005	27.3.2023.	4000,00
12	Direktni sporazum	Usluga	285-8-1-12/23	0		Arhiviranje i funkcioniranje arhivne dokumentacije - iznajmljivanje prostora za arhiviranje i funkcioniranje arhivne dokumentacije	92212000-3 Usluge arhiva	CLOUDIT D.O.O.	4201880810006	28.3.2023.	4800,00
13	Direktni sporazum	Usluga	285-8-1-10/23	0		Usluge registracije službenih vozila Zavoda za izgradnju KS	71031200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	"ovagurba" d.o.o.	4201410580006	29.4.2023.	5376,80
14	Direktni sporazum	Usluga	285-8-1-18/23	0		Usluge prelozbe na stručne časopise i portale - Paket Premium	22211000-2 Stručni časopisi	REVCON DOO SARAJEVO	4200481380008	5.5.2023.	511,07
15	Direktni sporazum	Roba	285-8-1-17/23	0		Nabavka namještaja za kuhinju	88141000-2 Kuhinjski namještaj i oprema	ZAMBAKOVIC DOO	4201471480002	0.5.2023.	3106,00
16	Direktni sporazum	Usluga	285-8-1-22/23	0		Usluge podizanja osiguranja imovine Zavoda za izgradnju Kantona Sarajeva	66530000-8 Usluge osiguranja	SARAJEVO-OSIGURANJE D.O.	4200326830001	30.5.2023.	2008,16
17	Direktni sporazum	Usluga	285-8-1-20/23	0		Usluge prelozbe na stručne časopise i portale - Portal pitanja i odgovora u javnoj nabavi	22211000-2 Stručni časopisi	REFAM CREATIVE SOLUTIONS-REC.D.O.O.	4200543220001	11.5.2023.	256,43
18	Direktni sporazum	Usluga	285-8-1-19/23	0		Usluge prelozbe na pravnu bazu zakona, podzakonskih akata u BiH, entitetima i kantonima	79480000-7 Prepisivačke usluge	HRVACIJA LEX D.O.O. SARAJEVO	4302465210004	11.5.2023.	400,00
19	Direktni sporazum	Roba	285-8-1-25/23	0		Nabavka Espress i hladnih napitaka za potrebe reprezentacije	15060000-4 Kafa, čaj i srodni proizvodi	ROSE ROMER DOO	4200442930006	27.5.2023.	465,33
20	Direktni sporazum	Usluga	285-8-1-25/23	0		Usluge prelozbe na stručne časopise i portale - Nabavka Fidelijske knjige	22211000-2 Stručni časopisi	Udruženje konsultanata inženjera BiH	4200974850005	22.5.2023.	170,94
21	Direktni sporazum	Usluga	285-8-1-24/23	0		Usluge seminara i edukacije Fidelijske knjige	79051000-5 Usluge organizacije seminara	Udruženje konsultanata inženjera BiH	4200974850005	22.5.2023.	1838,82
22	Direktni sporazum	Usluga	285-8-1-17/23	0		Usluge sortiranja, prevoza, presvljenja i slaganja arhivske građe	98392000-7 Usluge presvljenja	CLOUDIT D.O.O.	4201880810006	24.5.2023.	2400,00
23	Direktni sporazum	Usluga	285-8-1-20/23	0		Usluge održavanja filma uređaja	50030000-5 Usluge popravaka i održavanja	ICI-NET D.O.O.	4200872180005	30.5.2023.	3430,00
24	Direktni sporazum	Usluga	285-8-1-23/23	0		Usluge održavanja kape aparata i dusa plotera sa rubnikom i izgradnjom rezervnih dijelova	50113200-4 Usluge održavanja fotokopirnih uređaja	RACIONAL D.O.O.	4200012750009	30.6.2023.	5652,00
25	Direktni sporazum	Roba	285-8-1-41/23	0		Nabavka materijala za održavanje prostora, opreme i ostalih sredstava Zavoda za izgradnju KS	44500000-5 Sjeme, klijens, seme, luk, vješt, luk i povrće	PENNY PLUS DOO SARAJEVO	4200562210002	3.7.2023.	623,36
26	Otvoreni postupak	Radovi	285-1-3-26/23	0		Saranje ulice Branilaca Špa u dužini 375 m L. Općina Centar Sarajeva	44113620-7 Asfalt	OMA D.O.O.	4200966240001	5.7.2023.	44992,25

27	Konkurentni li zahtjev	Usluge	285-7-2-26/23	0		Usluge izrade akta o procjeni rizika	79710000-4 Usluge na području sigurnosti	VATROOSTE MI D.O.O.	4200117260 007	4.7.2023.	785,530
28	Direktni spoznatum	Usluge	285-6-2-34/23	0		Usluge izrade Izvedbenog projekta rekonstrukcije mreže Zavoda za Izgradnju Kantona Sarajeva u ulici Branilaca Sarajeva br.3	71120000-7 Usluge tehničkog projektiranja	CITY GROUP D.O.O.	4200194840 008	5.7.2023.	1940,00
29	Direktni spoznatum	Usluge	285-6-2-36/23	0		Usluge implementacije računovodstvenog programa i podrška za potrebe Zavoda za Izgradnju Kantona Sarajeva	72212443-6 Usluge razvoja programike podrške za računovodstvo	AGENCIJA SOFTCON SARAJEVO	4202312440 009	7.7.2023.	6060,00
30	Direktni spoznatum	Usluge	285-6-2-39/23	0		Usluge kasko osiguranja službenih vozila	66500000-8 Usluge osiguranja	SARAJEVO OSIGURANJE D.O.O.	4200320030 001	7.7.2023.	4579,50
31	Direktni spoznatum	Usluge	285-6-2-37/23	0		Nabavka računovodstvenog programa sa godišnjom licencom	48444000-2 Računovodstveni sistemi	AGENCIJA SOFTCON SARAJEVO	4202312440 009	7.7.2023.	5642,02
32	Otvoreni postupak	Robe	285-1-3-21/23	0		Ispisnica motornog godva (dizel i benzini) za službena vozila	09130000-9 Nafta i destilati	HFA D.O.O. TESANI	4218110000 007	11.7.2023.	37746,24
33	Direktni spoznatum	Usluge	285-6-2-43/23	0		Identifikacija, stampa geodetska situacija i iskaljenje parcela u vlasništvu Zavoda za Izgradnju KS sa imacionim elaboratima u analognom i dijitalnom obliku rad i stavljanje u upotrebu zemljišta do privodjenja istog krajnjoj nameni, na lokalitetu Halilović	71354000-7 Usluge katstarske izmjere	GEODET D.O.O. SARAJEVO	4201396930 000	18.7.2023.	2300,00
34	Konkurentni li zahtjev	Usluge	285-7-2-31/23	0		Usluge izlčenja službenih prostora Zavoda za Izgradnju Kantona Sarajeva za dvije lokacije u ul. Kapital br.3 i Branilaca Sarajeva br.3	98300000-6 Razne usluge	A&M COMPANY DOO SARAJEVO	4202649690 002	18.7.2023.	39999,92
35	Direktni spoznatum	Usluge	285-6-2-44/23	0		Usluge razvoja IT sistema Zavoda za Izgradnju Kantona Sarajeva	72000000-5 Usluge informatičke tehnologije; savjetovanje, razvoj programike podrške, Internet i podrška	CITY GROUP D.O.O.	4200194840 008	24.7.2023.	5900,00
36	Otvoreni postupak	Nadvis	285-1-3-30/23	0		Izvođenje radova na adaptaciji poslovnog prostora -Brenka	45213300-4 Građevinski radovi na poslovnim zgradama	MOI OOO	4200530330 008	24.7.2023.	74929,17
37	Direktni spoznatum	Usluge	285-6-2-46/23	0		Održavanje epilike i baze za ovisno elaborata nastalih u periodu od 2000 do 2008.godine u Sektoru za katalist komunalnih uređaja	50124200-1 Usluge održavanja sistema.	TINGEA D.O.O.	4201848020 002	28.7.2023.	6000,00
38	Direktni spoznatum	Usluge	285-6-2-47/23	0		Usluge godišnjeg osiguranja od nekegde i usluge stručnog osiguranja civilizatska i ranježenika Zavoda za Izgradnju Kantona	66510000-2 Usluge osiguranja od nekega i usluge zdravstvenog osiguranja	ADRIATIK OSIGURANJE D.O.O. PODRUŽNICA SARAJEVO	4200213140 080	4.8.2023.	2377,00

Sarajevo										
39	Direktni isporukom	Usluge	285-8-2-31/23	0	Usluge pretplate na stručni časopis Časopisi i portali-Portal RECKO	22710000-2 Stručni časopis	REFAM CREATIVE SOLUTIONS-REC D.O.O.	4200545220001	21.8.2023.	222,22
40	Direktni isporukom	Usluge	285-8-2-49/23	0	Usluge deinstaliranja i demontaže	90020000-2 Usluge demontaže	DEKATIZER D.O.O. SARAJEVO	4200149200006	28.8.2023.	1815,00
41	Otvoreni postupak	Robe	285-1-1-32/23	0	Nabavka računarske opreme za potrebe Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo	30230000-0 Kompijuterska oprema	ZIYY GROUP D.O.O.	4200194940008	28.8.2023.	62727,50
42	Direktni isporukom	Usluge	285-8-2-50/23	0	Usluge nabavke elektronskih ulaznica/tokaznica za zaposlene i prijavnika za tokaznice	30160000-8 Magnetne kartice	ROMEL d.o.o. Vogošća	4200461880073	30.8.2023.	260,23
43	Konkurentni ili zahtjev	Usluge	285-7-2-36/23	0	Usluge redovnog održavanja službenih vozila Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo	50100000-0 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i pripradajuću opremu	UNITRADE DOO	4272005990007	1.9.2023.	3900,00
44	Konkurentni ili zahtjev	Robe	285-7-1-35/23	0	Nabavka materijala za održavanje naprave	33710000-5 Teletni papir, manjane, peljci i siveje	DEFTER DOO SARAJEVO	4200363990007	5.9.2023.	3876,86
45	Direktni isporukom	Usluge	285-8-2-52/23	0	Usluge održavanja tehničke zaštite u prostorjama Zavoda za izgradnju KS i održavanje sistema GPS sistema za službena vozila	70710000-4 Usluge na području sigurnosti	AGENCIJA ZA TEHNOLOGIJU I RIZIKU ZAŠTITU MIDDLE POINT ELECTRONICS D.O.O.	4201204440000	1.9.2023.	4260,00
46	Konkurentni ili zahtjev	Robe	285-7-1-42/23	0	Nabavka kancelarijskih stolica	39130000-2 Kancelarijski namještaj	KKS D.O.O. SARAJEVO	4200056290005	18.9.2023.	13050,00
47	Direktni isporukom	Usluge	285-8-2-57/23	0	Usluge iznajmljivanja dva kopir aparata za potrebe Zavoda za izgradnju KS na sljedećim lokacijama u ul. Brgat br 3 i Branilaca Sarajeva br. 1	30121100-4 Mašine za fotokopiranje	NACIONAL D.O.O.	4200012750009	18.9.2023.	3976,00
48	Direktni isporukom	Usluge	285-8-2-56/23	0	Usluge seminar i edukacija-Seminar iz oblasti javnih nabavki "Aktuelna pitanja i primjeri iz prakse"	79951000-5 Usluge organizacije seminara	REFAM CREATIVE SOLUTIONS-REC D.O.O.	4200545220001	27.9.2023.	230,77
49	Direktni isporukom	Usluge	285-8-3-47/23	0	Nabavka usluge mobilne pretplate	54212000-5 Usluge mobilne telefonije	DRONERSKI DRUSTVO BH TELECOM SARAJEVO	4200211100005	27.9.2023.	750,00
50	Direktni isporukom	Usluge	285-8-2-63/23	0	Nabavka usluga cestovnog putničkog prometa	60130000-0 Usluge cestovnog putničkog prometa za posebne namjene	VILDAN TOURS	4200243640001	3.10.2023.	1623,93
51	Konkurentni ili zahtjev	Usluge	285-7-2-40/23	0	Mjesecna pretplate na licence za programsko pakete	48000000-7 Razni programski paketi i kompijuterski sistemi	DIGITALIJA D.O.O. DRUSTVO ZA ZAVJETOVANJE I USLUGE U INFORMATICI	4201551330006	3.10.2023.	9400,00
52	Direktni isporukom	Robe	285-8-1-42/23	0	Nabavka automobila, akumulatora i materijala za održavanje vozila	34351100-3 Gume za automobile	BEO, DOO	4227825700007	6.10.2023.	140,00
53	Direktni isporukom	Robe	285-8-1-40/23	0	Nabavka materijala za održavanje prostorija i opreme i ostalih sredstava Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo	44000000-3Alij, brzo, ključevi, barki, vjci, lanac i opruge	AIDA COMMERCE	4200562400005	9.10.2023.	157,00

54	Direktni sporazum	Usluge	285-8-2-60/23	0		Usluge prethodne na kablovsku televiziju Zavoda za Ugradnju Kantona	9223000-7 Usluge kablovskog radnja i televizije	TELEMACHI DOD SARAJEVO	400020980007	13.10.2023.	241,08
55	Direktni sporazum	Radovi	285-8-3-66/23	0		Izvođenje radova na čišćenju i smanjenju kumulacione mrlje u ulici Nedima Filipovića	4500000-7 Građevinski radovi	KRP VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Sarajevo	400015139000	18.10.2023.	4088,34
56	Direktni sporazum	Robe	285-8-1-77/23	0		Nabavka i ugradnja modula za putnu u kotlovnici za potrebe podnog grijanja za plivaču bazen na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu	42122000-0 Pumpe	MOJINTAIN DOD	40001811750001	19.10.2023.	3.300,00
57	Direktni sporazum	Usluge	285-8-2-64/23	0		Usluge servisiranja i zamjene PP aparata	50413200-3 Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme	PROVING INŽINERING DOD SARAJEVO	4000280480004	19.10.2023.	656,00
58	Direktni sporazum	Usluge	285-8-2-65/23	0		Nabavka usluga snjeblaza i ostalih hotelskih usluga u cilju održavanja team building a	55110000-4 Usluge hotelskog smještaja	SIRIUS TRAVEL D.O.O. PUTNIČKA AGENCIJA	4000937370000	20.10.2023.	6000,00
59	Direktni sporazum	Usluge	285-8-2-71/23	0		Izrada projekta uklanjanja nedovršenog objekta poslovnog centra Vodevoda i Kanalizacije Sarajeva u Kolodvorskoj ulici, Općina Novo Sarajevo	71312000-6 Izrada projekta i nacrti, procjena troškova	BUSEC CO	4001372440000	25.10.2023.	5800,00
60	Direktni sporazum	Robe	285-8-1-74/23	0		Usluge nabavke materijala za održavanje prostora, opreme i ostalih sredstava Zavoda za Ugradnju Kantona	44500000-1 Materijal, oprema i usluge	por budny servis	4000613570001	27.10.2023.	53,56
61	Direktni sporazum	Usluge	285-8-2-84/23	0		Usluge vulkanizera za službena vozila Zavoda za Ugradnju Kantona	50116200-6 Usluge popravaka guma, uključujući montažu i centriranje	TAMER SON COMPANY D.O.O.	4000504120005	27.10.2023.	119,68
62	Direktni sporazum	Usluge	285-8-2-72/23	0		Nabavka dobijanje energetske certifikata za plivaču bazen na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu	71314300-5 Savjetodavne usluge u području energetske efikasnosti	EURONG D.O.O.	4003287210006	30.10.2023.	4000,00
63	Direktni sporazum	Radovi	285-8-3-70/23	0		Hitna sanacija na stambenima Zavoda za Ugradnju Kantona	45211341-1 Građevinski radovi na stambenima	ARH ING DOD SARAJEVO	4003159540009	30.10.2023.	5000,00
64	Direktni sporazum	Usluge	285-8-2-73/23	0		Usluge servisiranja kotlova, mjerenje odboje in polutanata i popravka kotlova	50531100-7 Usluge popravaka i održavanja kotlova	FLXOMONT DOD	4000123790007	31.10.2023.	650,00
65	Direktni sporazum	Usluge	285-8-2-78/23	0		Usluge pregleda i čišćenja dimnogodnog kanala u prostorijama Zavoda	90915000-4 Usluge čišćenja peći i dimnjaka	ZIKO OBMNAK	4000402100000	1.11.2023.	110,00
66	Direktni sporazum	Usluge	285-8-2-79/23	0		Usluge održavanja telefonskih linija i instalacija	50800000-3 Razne usluge popravaka i održavanja	U-MKS D.O.O.	4001961220000	2.11.2023.	1790,00
67	Direktni sporazum	Usluge	285-8-2-75/23	0		Usluge kopiranja, učitavanja i štampanja tehničke i knjigovodstvene dokumentacije	22000000-0 Štampanje materijal i vradni proizvodi	PRINTER S.O.D	4000537960009	6.11.2023.	995,00

					Zavoda za Igračnju Kantona					
68	Direktni opoziv	Usluge	285-8-2-80/23	0	Usluge vještovanja voza u vlasništvu Zavoda za Igračnju Kantona	71119000-7 Usluge tumačenja	INSTITUT ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACI JE D.O.O SARAJEVO	4200766310 005	8.11.2023.	200,00
69	Direktni opoziv	Usluge	285-8-2-81/23	0	Usluge seminarna dijelovača bojlera	50531200-8 Usluge popravljanja i održavanja gornih naprava	ENERGOGAS D.O.O.	4200050410 009	8.11.2023.	600,00
70	Konkurentni zahtjev	Robe	285-7-1-45/23	0	Nabavka kancelarijskog materijala	30199000-0 Papirne potpisilice i ostali artikli	JE RC EXCLUSIVE DOO	4200061030 000	9.11.2023.	8066,67
71	Pregradački i postupak bez objave (javni i obvezujući i o nabavi)	Radovi	285-4-2-82/23	0	Dostavljeni nepredviđeni radovi na adaptaciji poslovnog prostora Breka	45213100-4 Građevinski radovi na podizanju zgrade	MDI DOO	4200539350 008	16.11.2023.	1464,89
72	Direktni opoziv	Usluge	285-8-2-85/23	0	Usluge godišnjeg održavanja softverskih protokola	50324100-3 Usluge održavanja sistema	ORKA D.O.O.	4201891300 009	20.11.2023.	6000,00
73	Konkurentni zahtjev	Usluge	285-7-2-55/23	0	Usluge održavanja i iznajmljivanja internet konekcije	72400000-8 Usluge interneta	LOGOSOFI D.O.O.	4200236190 009	21.11.2023.	4388,00
74	Konkurentni zahtjev	Robe	285-7-1-66/23	0	Nabavka motornog voza	34100000-8 Motorna vozila	BERLETA D.O.O.	4218061370 005	28.11.2023.	39990,00
75	Direktni opoziv	Usluge	285-8-2-86/23	0	Nabavka usluga seminara i edukacije	79951000-5 Usluge organizacije seminara	Uputenje konsultanta inžinjera BiH	4200974850 005	1.12.2023.	1002,99
76	Direktni opoziv	Usluge	285-8-2-86/23	0	Usluge seminara i edukacije „Završni o. savjetovanja za 2023 godinu javne nabave“	79951000-5 Usluge organizacije seminara	AGENCIJA ZA PRAVO KONSALTING EDUKACIJU "APKE"	4202447020 000	4.12.2023.	340,30
77	Direktni opoziv	Usluge	285-8-2-92/23	0	Usluge projektiranja entelijera vlasnog hotela električne i mehaničke instalacije u zgradi Zavoda za Igračnju Kantona	71120000-7 Usluge tehničkog projektiranja	HMD ARCHITECTS D.O.O.	4201889870 001	5.12.2023.	5940,00
78	Direktni opoziv	Robe	285-8-1-91/23	0	Nabavka materijala za održavanje prostorija i opreme i ostali sredstva Zavoda za Igračnju Kantona Sarajevo	44500000-5 Apl. boje, kjukevi, lektre, vjoci, lanac i opruge	PENNY PLUS DOO SARAJEVO	4200182210 002	6.12.2023.	588,42
79	Konkurentni zahtjev	Robe	285-7-1-61/23	0	Nabavka VM Manager Pro 7 Node license za Synology servere	48000000-8 Programski paketi i informacijski sistemi	DIKATA D.O.O.	4200202610 009	7.12.2023.	8478,00
80	Direktni opoziv	Usluge	285-8-2-86/23	0	Usluge seminara i edukacije" i to: seminar Budžetsko aktuelnost seminar novosti u javnom sektoru; seminar dodatna primanja	79951000-5 Usluge organizacije seminara	REVCON DOO SARAJEVO	4200491380 008	8.12.2023.	205,14
81	Direktni opoziv	Robe	285-8-1-90/23	0	Nabavka gumica, akumulato ra i materijala za održavanje voza	34251100-3 Gume za automobile	UNITRADE DOO	4272085990 007	13.12.2023.	1064,92
82	Direktni opoziv	Usluge	285-8-2-93/23	0	Usluge projektiranja hangara za potrebe skladističenja MUP-a	71120000-7 Usluge tehničkog projektiranja	HADZABEK D.O.O.	4200797460 005	19.12.2023.	4500,00
83	Direktni opoziv	Usluge	285-8-2-94/23	0	Usluge održavanja zemljišta u vlasništvu Zavoda za Igračnju Kantona	77000000-0 Usluge na podizanju poljoprivrede, šumarstva, hortikulturne, akvakulture i gledanja	KJK "PARK" D.O.O. SARAJEVO	4200258370 003	20.12.2023.	5940,00
84	Direktni	Robe	285-8-1-97/24	0	Nabavka isporuka	71675000-3	VATROGASNE	4200117700	21.12.2023.	246,15

broj	vrsta	opis	broj	datum	iznos	opis	broj	datum	iznos		
85	Obratni sporazum	Usluge	285-B-2-2/24	0	prevozni protupoisani sporazum za godišnji protuo Zavrda na Brezi	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	M D O O, d.o.o.	007	4201410190006	21.12.2023.	530,88
86	Obratni sporazum	Robe	285-B-1-53/23	0	Nabavka ometača i klupa za prevlačenje za fizički biser na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu	35130000-8 Razni namještaji i oprema	ADOLF PLUS		4401765390006	22.12.2023.	35544,00
87	Obratni sporazum	Usluge	285-B-2-5/24	0	Usluge kasko osiguranja službenih vozila	66000000-0 Finansijske i osiguranjske usluge	SARAJEVO OSIGURANJE DO SARAJEVO		4200326990194	24.12.2023.	1130,00
88	Obratni sporazum	Usluge	285-B-2-7/24	0	Usluge seminara i edukacije	79921000-5 Usluge organizacije seminara	REFAM CREATIVE SOLUTIONS - LLC D.O.O.		4200540220001	25.12.2023.	141,00
89	Obratni sporazum	Usluge	285-B-2-1/24	0	Usluge redovnog servisanja dva službena vozila iz programa Suzuki S-CROSS	50100000-0 Usluge popravaka, održavanja i dodatne usluge za vozila i pripadajuću opremu	Auto-Centar Betanija d.o.o.		4201828400001	25.12.2023.	662,53
90	Obratni sporazum	Robe	285-B-1-9/23	0	Nabavka materijala za održavanje prostora i opreme i ostalih uređaja Zavrda za izgradnju Kantona Sarajevu	44100000-5Alat, brava, ključevi, lantke, vijci, lamac i spruge	A-ELECTRO d.o.o. Sarajevu		4201266090007	25.12.2023.	560,00
91	Obratni sporazum	Robe	285-B-1-3/24	0	Nabavka, isporuka i izgradnja klima uređaja za grijanje i hlađenje poslovnog prostora na Brezi	43112000-8 Klimatski uređaji	COMFORT SOLUTIONS DOO		4301008030004	25.12.2023.	5980,00
92	Obratni sporazum	Robe	285-B-1-11/24	0	Nadogradnja i SR ArcGIS Desktop Basic licence na tri ArcGIS Desktop Standard	72000000-5 Usluge informacione tehnologije: softverske, razvoj programne podrške, internet i mobilna	GD D.O.O. SARAJEVO		4201002220008	25.12.2023.	5950,00
93	Obratni sporazum	Robe	285-B-1-96/23	0	Nabavka materijala za održavanje prostora i opreme i ostalih uređaja Zavrda za izgradnju Kantona Sarajevu	44100000-5Alat, brava, ključevi, lantke, vijci, lamac i spruge	PENNY PLUS DOO SARAJEVO		4200162210002	26.12.2023.	539,95
94	Obratni sporazum	Robe	285-B-1-10/24	0	Nabavka ITZ opreme: radne/zastitne odjeve (obuvce)	18610000-6 Posebna odjeća	BM COMPANY D.O.O. ZENICA		4218507720005	27.12.2023.	1313,58
95	Obratni sporazum	Robe	285-B-1-8/24	0	Nabavka tonera, jetri glava za plotere i kopir aparate	30125100-2 Potrošni materijal i tonerom	DIPARTA D.O.O.		4200202610009	28.12.2023.	4980,00
96	Obratni sporazum	Usluge	285-B-1-14/24	0	Nabavka ugostiteljskih usluga	55300000-1 Usluge restorana i usluge posluživanja hranom	FINE FOOD FAMILY D.O.O.		4201503200000	28.12.2023.	1619,66
97	Prigovori i postupak bez otkazivanja u slučaju nastupa	Radovi	285-4-1-15/24	0	Dodatni nepredviđeni radovi na sanaciji ulice Bratstva 3.pu, u dužini 375 m i, Općina Centar Sarajevu	45233222-1 Radovi na popločavanju i asfaltiranju	OXA D.O.O.		4200960240001	28.12.2023.	11302,88
98	Obratni sporazum	Robe	285-B-1-15/24	0	Usluge vanjske popravke za službena vozila Zavrda za izgradnju Kantona	50100000-0 Usluge popravaka, održavanja i dodatne usluge za vozila i pripadajuću opremu	UNITRADE DOO		4272095090007	28.12.2023.	2070,04

**IZVJEŠTAJ O UKUPNOM BROJU POSTUPAKA I UKUPNOJ VRIJEDNOSTI DODJELJENIH  
UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA PO VRSTI POSTUPKA I PREDMETU NABAVKE**

K. Br.	Vrsta postupka	Vrsta ugovora						UKUPNO	
		Kata		Udugi		Radovi		Ukupni broj	Ukupna vrijednost bez PDV-a u KM
		Ukupni broj	Ukupna vrijednost bez PDV-a u KM	Ukupni broj	Ukupna vrijednost bez PDV-a u KM	Ukupni broj	Ukupna vrijednost bez PDV-a u KM		
1	Čisto iz postupak	1	11227,30	0	0	2	11227,30	4	21891,32
2	Pregovarski postupak bez okvirnog sporazuma i u okviru	0	0	0	0	2	2034,73	2	2524,78
3	Konkurentni postupak	0	18131,58	3	4041,12	0	0	3	22172,70
4	Direktni sporazumi	21	10210,76	38	24465,71	2	2380,14	61	37056,61
	<b>UKUPNO</b>	<b>22</b>	<b>29469,64</b>	<b>41</b>	<b>28506,83</b>	<b>4</b>	<b>2380,14</b>	<b>67</b>	<b>60286,90</b>

### **XIII. PREGLED UNUTRAŠNJE ORGANIZACIJE, KADROVSKE I MATERIJALNE OSPOSOBLJENOSTI ZAVODA ZA IZGRADNJU KS**

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo organizovan je na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo broj: 03-4-8560/21 od 14.09.2021. godine u 5 sektora:

- a) Sektor za imovinsko - pravne i kadrovske poslove,
- b) Sektor za izgradnju objekata i opremanje gradskog građevinskog zemljišta:
  - Služba za pripremu investiciono-tehničke dokumentacije,
  - Služba za stručni nadzor.
- c) Sektor za računovodstvo, finansije i zajedničke poslove:
  - Služba za računovodstvo i finansije,
  - Služba za zajedničke poslove.
- d) Sektor za katastar komunalnih uređaja,
- e) Sektor za javne nabavke.

Prema navedenom Pravilniku za izvršavanje poslova i zadataka iz djeokrugavog Zavoda utvrđuje se ukupno 91 izvršilac od čega 1 rukovodilac Zavoda, 1 sekretar Zavoda, 5 državnih službenika koji rukovode osnovnim organizacionim jedinicama, 3 državna službenika koji rukovode unutrašnjim organizacionim jedinicama, 1 namještenik koji rukovodi unutrašnjom organizacionom jedinicom, 48 državnih službenika i 32 namještenika.

Na osnovu podataka iz službenih evidencija, Zavod na dan 31.12.2023. godine broji ukupno 70 zaposlenih lica od kojih je:

- Lice koje nema status državnog službenika – direktor Zavoda
- Državnih službenika – 44
- Namještenika – 25

Kvalifikaciona struktura zaposlenika je sljedeća:

- VSS – 44
- VŠS – 1
- SSS – 17
- VKV radnici – 2
- KV radnik – 1
- NK radnici – 4

Stručna sprema zaposlena 44 državna službenika:



- dipl.ing.arh. – 7
- dipl.ing.građ. – 12
- dipl.ing. geologije – 1
- dipl. pravnik – 10
- dipl. ecc. – 4
- dipl.ing. mašinstva – 2
- dipl.ing. geodezije – 2
- dipl.ing. geodezije i geoinformatike – 1
- dipl.ing. elektotehnike – 3
- dipl.ing. poljoprivrede – 1
- inženjer informacijskih tehnologija – 1

Stručna sprema zaposlenih 25 namještenika:

- građ. inženjer – 1
- gimnazija – 7
- administrativni tehničar – 1
- ekonomski tehničar – 2
- geodetski tehničar – 5
- mašinsk tehničar – 1
- metalobrusač-specijalista – 1
- organizator željezničkog saobraćaja – 1
- vozač motornih vozila – 1
- bravar – 1
- završena osnovna škola – 4

U 2023. godini radi obavljanja pripravničkog staža u radni odnos na određeno vrijeme primljena su tri pripravnika:

- Magistar elektrotehnike-dipl.ing.el.
- Bachelor-ing. geodezije i geoinformatike
- MA mašinstva-dipl.ing.mašinstva



## **XII. NAČIN OSTVARIVANJA SARADNJE SA FEDERALNIM ORGANIMA, DRUGIM KANTONIMA, OPĆINAMA, GRADOM SARAJEVOM, OMBUDSMENIMA, NEVLADINIM SEKTOROM I DR.**

Kao samostalna kantonalna upravna organizacija, Zavod je ostvarivao saradnju sa Kantonom Sarajevo i organima uprave Kantona Sarajevo, Gradom Sarajevo, kao i sa općinama i javnim preduzećima u Kantonu Sarajevo.

Sektor za katastar komunalnih uređaja putem zajedničkih projekata sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove radi na unapređenju poslovnih procesa i novom softverskom rješenju za digitalni plan katastra komunalnih uređaja.

Kroz ovo projekto uspostavljen je novi model podataka BPK KU i urađen pilot projekat konverzije podataka za dvije katastarske općine u Sarajevu. U narednom periodu planirana je konverzija podataka za područja cijele teritorije Kantona Sarajevo, kao i uspostava rada na novoj aplikaciji katastra komunalnih uređaja.

Kroz navedene projekte nastoji se ostvariti saradnja sa ostalim institucijama vezanim za geodetsku struku, kako bi se zajedničkim iskustvima poslovni procesi na svim nivoima unaprijedili što je više moguće.

U slučajevima potreba, saradnja sa federalnim organima se ostvaruje putem nadležnih ministarstava Kantona Sarajevo.

Kada je u pitanju saradnja sa Ombudsmenima, saradnja se ostvaruje isključivo na upite institucije Ombudsmena u slučajevima kada oni obrađuju određene predmete u kojima se stranke žale na povredu osnovnih ljudskih prava. U svim tim slučajevima Zavod je involviran kao strana protiv koje se stranke žale ili strana koja daje pojašnjenje što služi Ombudsmenima kao pomoćni alat u analiziranju predmeta.

Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo br: 02-04-13850-39/20 od 28.05.2020 godine naloženo je svim organima uprave u Kantonu Sarajevo da intenziviraju aktivnosti na provođenju odluka ustavnih sudova i preporuka Institucija Ombudsmena BiH, kao i zaduženje da se o realizaciji preporuka kvartalno izvještava Ministarstvo pravde i uprave KS. Zavod je za postupanje po ovom zaključku i preporuci Ombudsmena br: P-96/17 uslovljen sudskim pristupima koji su u toku.

Dirktor

Berna Benoy djelina, arb.

Broj 01-45- 930/24

Sarajevo, 31.01.2024. godine

